



**ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ИЗВЪРШЕНАТА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА
ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ПАЗАРДЖИК 2021-2027 Г. ЗА ПЕРИОДА
01.01.2021 – 31.12.2024 Г.**

2025 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на таблиците	3
Списък на фигурите	4
Списък на използваните съкращения.....	5
1. Въведение	7
1.1. Нормативно основание за разработването на междинна оценка	7
1.2. Цели и задачи на междинната оценка	8
2. Обзор на промените в социално-икономическите условия на община Пазарджик	10
3. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО	17
3.1. Обща характеристика на изпълнените проекти и дейности	19
3.2. Обобщение на изпълнението на стратегическите цели в ПИРО.....	21
4. Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите	27
4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнение на стратегическите цели	27
4.2. Оценка на изпълнението на определени приоритети за развитие	31
5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси	43
5.1. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси.....	43
5.2. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация на ПИРО.....	49
6. Оценка на План за устойчива градска мобилност	52
7. Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО	65
7.1. Изводи	65
7.2. Препоръки.....	66
8. Приложения.....	68

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1. Ключови демографски показатели на община Пазарджик.....	11
Таблица 2. Сравнение на ключови демографски показатели на община Пазарджик, област Пазарджик и страната, 2024 г.	11
Таблица 3. Ключови показатели за пазара на труда в община Пазарджик	12
Таблица 4. Ключови показатели в сферата на здравеопазването в община Пазарджик.....	13
Таблица 5. Ключови показатели в сферата на предучилищното образование в община Пазарджик	13
Таблица 6. Ключови показатели в сферата на училищното образование в община Пазарджик ..	14
Таблица 7. Социални услуги в община Пазарджик и техният капацитет към 2024 г.	14
Таблица 8. Ключови икономически показатели на община Пазарджик за 2020 и 2023 г.	16
Таблица 9. Реално финансово и техническо изпълнение по стратегическите цели за периода 2021-2024 г.	21
Таблица 10. Разпределение на индикаторите за резултат според техния напредък спрямо общото	28
Таблица 11. Индикатори за резултат, заложи в ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. и тяхното изпълнение.....	29
Таблица 12. Разпределение на индикаторите за продукт според техния напредък спрямо общото	34
Таблица 13. Индикатори за продукт, заложи в ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. и тяхното изпълнение.....	35
Таблица 14. Индикатори за наблюдение и оценка, заложи в ПУГМ Пазарджик 2023-2030 г. и тяхното изпълнение към 31.12.2024 г.	54

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО	7
Фигура 2. Средна стойност (дясна скала) и брой (лява скала) на текущите и изпълнени в периода 2021-2024 г. проекти/дейности	20
Фигура 3. Принос на Стратегическа цел I към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.	22
Фигура 4. Дял на реалното изпълнение на Стратегическа цел I към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.	22
Фигура 5. Принос на Стратегическа цел II към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.	23
Фигура 6. Дял на реалното изпълнение на Стратегическа цел II към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.	23
Фигура 7. Принос на Стратегическа цел III към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.	24
Фигура 8. Дял на реалното изпълнение на Стратегическа цел III към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.	24
Фигура 9. Принос на Стратегическа цел IV към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.	25
Фигура 10. Дял на реалното изпълнение на Стратегическа цел IV към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.	25
Фигура 11. Принос на мерките за преодоляване на последствията от Covid-19 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.	26
Фигура 12. Дял на реалното изпълнение на мерките за преодоляване на последствията от Covid-19 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.	26
Фигура 13. Процент на изпълнение и изплатени средства по Стратегическа цел I за периода 2021-2024 г.	44
Фигура 14. Процент на изпълнение и изплатени средства по Стратегическа цел II за периода 2021-2024 г.	46
Фигура 15. Процент на изпълнение и изплатени средства по Стратегическа цел III за периода 2021-2024 г.	47
Фигура 16. Процент на изпълнение и изплатени средства по Стратегическа цел IV за периода 2021-2024 г.	48
Фигура 17. Общо финансово изпълнение на заложените приоритети за периода 2021-2024 г.	49
Фигура 18. Индикативно финансово разпределение по приоритети в ПИРО Пазарджик за периода 2021-2027 г. (в лева)	49
Фигура 19. Разпределение на реално изплатените средства по стратегически цели и Covid-19 в ПИРО Пазарджик за периода 2021-2024 г. (в лева)	50
Фигура 20. Реално разпределение по източници на финансиране за периода 2021-2024 г. (в лева)	51

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БМ	Бюджетно мероприятие
ВВМ	Вътрешна водопроводна мрежа
ВЕИ	Възобновяеми енергийни източници
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ВОМР	Водено от общностите местно развитие
ВОСКС	Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи
ДБТ	Дирекция „Бюро по труда“
ДГ	Детска градина
ДИ	Други източници
ДСХ	Дом за стари хора
ДЦПЛУ	Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
ЕГ	Езикова гимназия
ЕС	Европейски съюз
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ИПГРВ	Интегриран план за градско възстановяване и развитие
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
МИРГ	Местна инициативна рибарска група
МЗ	Министерство на здравеопазването
МК	Министерство на културата
МКБППМН	Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МСП	Малки и средни предприятия
МТСП	Министерство на труда и социалната политика
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НПО	Неправителствена организация
НСИ	Национален статистически институт
НУ	Начално училище
НЧ	Народно читалище
ОА	Областна администрация
ОБ	Общински бюджет
ОБС	Общински съвет
ОДК	Общински детски комплекс
ОИЦ	Областен информационен център
ОПИК	Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
ОПМДР	Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ 2014-2020 г.
ОПНОИР	Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
ОПРР	Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ОПРЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
ОПХ	Оперативна програма „Храни“ 2014-2020 г.
ОУ	Основно училище
ПГ	Професионална гимназия
ПГСС	Професионална гимназия по селско стопанство
ПИ	Поземлен имот
ПИРО	Плана за интегрирано развитие на община
ПМГ	Профилирана математическа гимназия
ППЗРР	Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
ПРСР	Програма за развитие на селските райони
ПРЧР	Програма „Развитие на човешки ресурси“ 2021-2027 г.
ПСОВ	Пречиствателна станция за отпадни води
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУП	Подробен устройствен план
ПХОМП	Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г.
РИМ	Регионален исторически музей
РИОСВ	Регионална инспекция по околната среда и водите
СЖП	Странични животински продукти
СК	Спортен клуб
СМР	Строително-монтажни работи
СОД	Симфонично-оперетно дружество
СУ	Средно училище
ТБО	Твърд битов отпадък
УПИ	Урегулиран поземлен имот
ФЕС	Фондове на Европейския съюз
ФЕЦ	Фотоволтаична електроцентрала
ФМ на ЕИП	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
ЦБ	Централен бюджет
ЦНСТ	Център за настаняване от семеен тип
ЦСРИ	Център за социална рехабилитация и интеграция
ЧИ	Частни инвестиции
STEM	Science, Technology, Engineering and Mathematics

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя резултатите от извършената междинна оценка за изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Пазарджик 2021-2027, която обхваща периода между 01.01.2021 г. и 31.12.2024 г. Междинната оценка е направена в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от ЗРР.

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Пазарджик 2021-2027 г. е фундаментален, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през програмен период 2021-2027 г. В средата на периода е планирано изготвяне на междинна оценка. Изводите от нея следва да бъдат част от цялостната оценка на политиките за управление на общината за периода на действие на ПИРО.

ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. е приет с Решение №43 от 24.03.2022 г. на Общински съвет Пазарджик. За осъществяване на избраната визия на общината в стратегическата част на документа са обособени 4 стратегически цели и 14 приоритета. Допълнително са подбрани конкретни мерки и дейности. Програмата за реализация съдържа предвидените проекти и дейности за изпълнение в периода 2021-2027 г.


Важни принципи в цялостния процес на наблюдение и оценка са принципът на сътрудничество между местните власти и гражданското общество, както и принципът на прозрачност, който се изразява с публикуването на доклада на интернет страницата на Общината и на портала за обществени консултации на Министерски съвет, за да бъде достъпен за широката общественост и всички заинтересовани лица. Освен това, междинната оценка е важен информационен ресурс при разработката на последващата оценка за изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027 г.

1.1. Нормативно основание за разработването на междинна оценка

Условията за изготвянето на междинна оценка се определят в ЗРР и ППЗР. Според регламентираното в чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗРР, целта на оценката е да се направи проверка по отношение на разумното разходване на средства към настоящия момент, чрез която да се определи степента на ефективността и ефикасността на постигнатите до момента резултати по отношение на предварително поставените цели, приоритети и мерки, като същевременно се оценява и устойчивостта на плана и се правят изводи и препоръки за изпълнението му.

Настоящият доклад е първият документ за наблюдение и оценка на ПИРО Пазарджик. До сега не е извършено годишно наблюдение за 2021, 2022, 2023 и 2024 г. С докладите за наблюдение на ПИРО се цели оптимизация на бъдещото изпълнение на плана.

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО

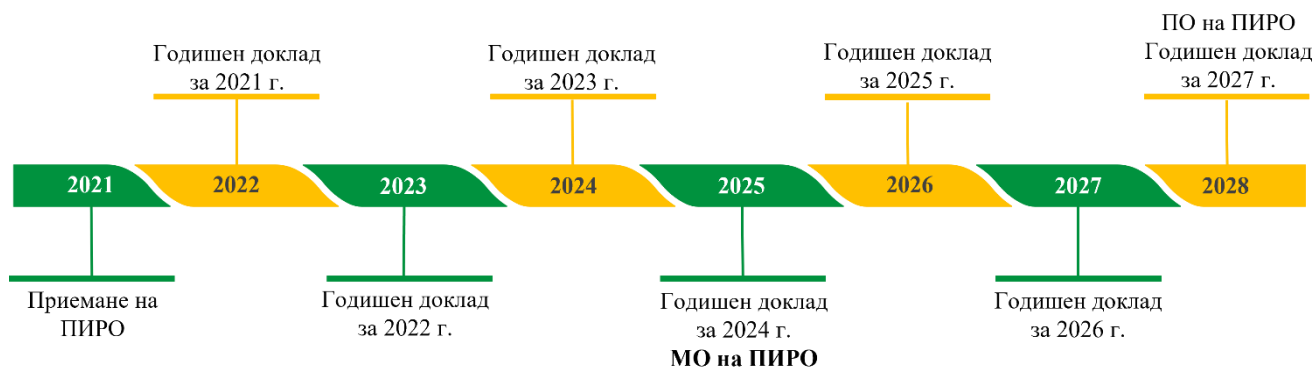

1.2. Цели и задачи на междинната оценка

Цел

Целта на настоящата междинна оценка е да се проследи изпълнението на ПИРО през първата половина на програмен период 2021-2027 г. и да се дадат насоки за бъдещото му изпълнение. Оценката е направена чрез анализиране на ключови социално-икономически показатели, предварително избрани в ПИРО индикатори и осъществени проекти/ дейности. За целите на оценката са включени само проекти, чието изпълнение е започнало и/или приключило в периода 2021-2024 г. При отчитане на сериозни разминавания между планирано и изпълнено се обособява нуждата от актуализация на стратегическия документ.

Обект

Обект на оценката е ПИРО, който действа за територията на община Пазарджик, която включва общинския център – гр. Пазарджик и 31 села.

Предмет

Предмет на междинната оценка е изпълнението на целите и приоритетите на плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите в периода 2021-2024 г., както и напредъкът на заложените в плана индикатори за резултат и за продукт. Вниманието се отделя и на организацията и методите за изпълнението на плана, прилагани от съответните органи и звена.

Задачи

За постигането на целите на междинната оценка, са изпълнени следните задачи:

- Обзор на социално-икономическите условия в общината и настъпилите промени в периода 2021-2024 г.;
- Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на плана, чрез общ преглед на изпълнените проекти/дейности;
- Представяне на списък с реализираните проекти и тези в процес на реализация по всяко от приоритетните направления за развитие;
- Оценка степента на постигане на съответните цели и приоритети;
- Определяне на ефективността и ефикасността на използвания финансов ресурс;
- Дефиниране на изводи и препоръки по отношение на възприетите критерии за оценка.

Структура на доклада

ЗРР и ППЗРР определят структурата, по която е изготвен настоящият доклад и чиято цел е осигуряване на последователност при оценката на ПИРО Пазарджик. Съдържанието е както следва:

Въведение

- Нормативно основание за разработването на междинна оценка;
- Цели и задачи на междинната оценка;

Обзор на промените в социално-икономическите условия на общината

Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ПИРО

- Обща характеристика на изпълнените проекти/дейности;
- Обобщение на изпълнението на приоритетите в ПИРО;

Оценка на степента на постигане на целите и приоритетите

- Оценка на общото въздействие при изпълнение на стратегическите цели;
- Оценка на изпълнението на определени приоритети за развитие;

Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси

- Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси;
- Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация на ПИРО;

Оценка на План за устойчива градска мобилност

Изводи и препоръки за изпълнението на ПИРО

- Изводи;
- Препоръки.

Източници на информация

В процеса на разработване на междинната оценка са използвани различни източници на информация:

- План за интегрирано развитие на община Пазарджик за периода 2021-2027 г.;
- Отчети за капиталовите разходи на Общината в периода 2021-2024 г.;
- Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г.;
- Други справки и отчети на Община Пазарджик;
- Попълнени въпросници от страната на общинските служители;
- Текуща статистика на НСИ;
- Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);
- Официалната интернет страница на Община Пазарджик;
- Друга информация и данни, предоставени от Община Пазарджик и експлоатационните дружества.

При изготвянето на настоящия документ следва да се отбележи, че съществуват обективни ограничения по отношение на част от данните, използвани в него. Някои от тях са налични до 2023 г. (все още липсват за 2024 г.), тъй като националната статистика не разполага с по-актуални данни към момента на изготвянето му. В доклада са използвани последните налични данни от различни институции, като това изрично е упоменато в съответния текст или графика.

Важно е да се уточни, че данните в системата на ИСУН са динамични и е възможно след изготвянето на доклада, те да бъдат променени на базата на актуализации на договорите за БФП. Данните от ИСУН, използвани в доклада, са актуални към 27.08.2025 г.

2. ОБЗОР НА ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Изменението на социално-икономическите показатели във времето е важен аспект при изготвянето на междинната оценка на ПИРО. С цел да се направи максимално обективно сравнение между стойностите на показателите, са използвани наличните данни за 2020 г. и за 2024 г. Важно уточнение е, че някои от показателите нямат актуална информация към 2024 г. и затова са използвани последните налични. Тази част на доклада е важен елемент, чрез който може да се предложи актуализация на ПИРО, която е правно уредена в чл. 22, ал. 1 от ППЗРР. Изменението на социално-икономическите показатели за определен период дава по-ясна представа за развитието на демографските и икономическите ресурси в общината и е предпоставка за по-прецизно формулиране на методите и средствата, които да бъдат използвани за вземане на по-точни управленски решения за бъдещото развитие на общината.

Външни фактори

Върху социално-икономическите промени влияние оказват множество външни фактори. Към тази група фактори може да бъдат съотнесени:

- Преходност на периода – в периода 2021-2024 г. са изпълнени проекти, които са започнали през изминалия програмен период (2014-2020 г.) и са се планирали дейности и проекти, които да бъдат изпълнени в периода до 2027 г.
- Политическа нестабилност – в рамките на четири години се проведеха поредица от избори за съставяне на редовен парламент, като това доведе до забавяне приемането на множество закони, отлагане в приемането на бюджети и изпълнението на програми и проекти.
- Финансова нестабилност в българските общини – забавянето в приемането и разпределянето на бюджета от централните към местните власти направи българските общини финансово уязвими и отложи изпълнението на приоритетни действия, които да подпомогнат развитието на общините.
- Пандемия от Covid-19, която предизвика сериозни социално-икономически последици и изправи местните власти, икономическите и здравните субекти пред редица трудности.
- Инфлационни процеси – в периода инфлацията в страната бележи ръст, като индексът на потребителските цени за месец декември 2024 г. спрямо месец януари 2021 г. е 134,5%, т.е. инфлацията е 34,5%.
- Тежка ситуация в Украйна и Близкия изток – военните действия в близки до България държави породиха сериозна бежанска вълна.

Демографска характеристика

Демографската характеристика ни дава информация за динамиката на населението в община Пазарджик. За да се открие мястото на общината сред област Пазарджик и в национален план, са сравнени стойностите на определени показатели на общинско, областно и национално ниво за 2024 г. Данните са обобщени в две таблици - **Таблица 1** представя стойностите на ключови демографски показатели за 2020 и 2024 г., а **таблица 2** – сравнение на ключови демографски показатели на общината с тези на областта и на страната за 2024 г.

Община Пазарджик следва както областната, така и националната тенденция на намаляване на населението. В разглеждания период населението в общината намалява с 15,7%. В по-голямата част от населението места в общината населението намалява, с изключение на селата Говедаре, Дебръщица, Добровница, Паталеница, Топли дол и Црънча. Към 2024 г. гъстотата на населението в община Пазарджик е 138,6 д/км². Населението на община Пазарджик

представлява близо 40% от населението на областта. Отчита се повишение на коефициента на раждаемост, който е нараснал с 10,7% в разглеждания период. Въпреки това, към 2024 г. той е по-нисък от коефициента на раждаемост за областта и за страната. В същия период коефициентът на смъртност намалява и към 2024 г. се доближава до този на областта, но надвишава този за страната. Положителната тенденция за повишаване на коефициента на раждаемост и намаляване коефициента на смъртност води до повишаване на коефициента на естествен прираст. Той обаче остава по-нисък от този за страната и за областта. Забелязва се положителна тенденция за повишаване на коефициента на механичен прираст, който към 2024 г. вече е положителен, но по-нисък от средния за област Пазарджик и за страната.

Таблица 1. Ключови демографски показатели на община Пазарджик

Показател	2020 г.	2024 г.	Изменение
Население (бр.)	105 161	88 700	-16 461
Коефициент на раждаемост (в ‰)	7,32	8,10	+0,78
Коефициент на смъртност (в ‰)	18,44	17,27	-1,17
Коефициент на естествен прираст (в ‰)	-11,12	-9,17	+1,95
Коефициент на механичен прираст (в ‰)	-1,78	0,11	+1,89

Източник: НСИ и собствени изчисления

Таблица 2. Сравнение на ключови демографски показатели на община Пазарджик, област Пазарджик и страната, 2024 г.

Показател	Община Пазарджик	Област Пазарджик	България
Население (бр.)	88 700	223 494	6 437 360
Коефициент на раждаемост (в ‰)	8,10	8,66	8,30
Коефициент на смъртност (в ‰)	17,27	17,14	15,60
Коефициент на естествен прираст (в ‰)	-9,17	-8,48	-7,3
Коефициент на механичен прираст (в ‰)	0,11	0,61	6,08

Източник: НСИ и собствени изчисления

Пазар на труда

Пазарът на труда предоставя информация за текущото състояние и степента на развитие на работната сила. Поддържането на добре функционираща система от човешки ресурси е съществен елемент на доброто управление. В **таблица 3** са представени ключови показатели, отразяващи развитието на пазара на труда в община Пазарджик в края на 2020 г. и 2024 г.

В периода 2020–2024 г. пазарът на труда в Община Пазарджик показва положителна динамика. Нивото на безработица намалява с 25%, а броят на зетите лица се увеличава с малко над 0,6%. Средната брутна годишна работна заплата нараства с над 46%, което отразява подобрене в икономическите условия. В демографски аспект се отчита намаляване на населението в под- и трудоспособна възраст и нарастване на дела на лицата над трудоспособна възраст. През 2024 г. близо 57% от населението на общината е в трудоспособна възраст.

Общината е обхваната от националните и регионалните програми за заетост, чрез които се подпомагат безработните лица, търсещи активно работа. Според официалните данни на ДБТ – гр. Пазарджик, за периода 2021-2024 г. се обобщава следното:

- Разкритите нови работни места са 6 760 броя.

- Броят на сключените договори с работодатели по мерки и програми по ЗНЗ, ОПРЧР и ПРЧР е 1 340.
- Броят безработни лица, включени в заетост по мерки и програми по ЗНЗ, ОПРЧР и ПРЧР е 1 021.
- Броят безработни лица, включени в квалификационни и преквалификационни курсове по ЗНЗ, ОПРЧР и ПРЧР е 848.
- В рамките на периода 2021–2024 г. в Община Пазарджик са реализирани редица национални програми, целящи повишаване на заетостта, професионалната квалификация и социалното включване на различни групи от населението. Сред тях са програмите „Старт на кариерата“, „Обучение и заетост на продължително безработни лица“, „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“, „Помощ за пенсиониране“, „Мелпомена“ и „Активиране на неактивните лица“.

Таблица 3. Ключови показатели за пазара на труда в община Пазарджик

Показател	Стойност		Изменение
	2020 г.	2024 г.	
Ниво на безработица (%)	4,7	3,5	-1,20
Заети лица (бр.)	26 660	26 808	+148
Средна брутна годишна работна заплата (лв.)	12 417	18 208	+5 791
Население в под трудоспособна възраст (бр.)	17 293	13 415	-3 878
Население в трудоспособна възраст (бр.)	63 146	50 496	-12 650
Население в над трудоспособна възраст (бр.)	24 772	24 789	+17

Източник: НСИ, ДБТ гр. Пазарджик, собствени изчисления

Социална характеристика

Чрез анализа на ключови показатели в секторите здравеопазване и образование може да се направи извод за социалната характеристика на общината и за нивото на обезпеченост на жителите ѝ със социални услуги. **Таблица 4** представя сравнителни данни за здравеопазването през 2020 и 2024 г., докато **таблицы 5 и 6** съдържат информация за развитието на образованието в същия период.

Броят на лечебните заведения за болнична помощ остава непроменен, както и този на лечебните заведения за извънболнична помощ. Наблюдава се леко увеличение на броя на болничните легла, което подсказва за запазен капацитет на здравната инфраструктура. Броят на лекарите и лекарите по дентална медицина се увеличава. В същото време броят на професионалистите по здравни грижи и други медицински специалисти отбелязва лек спад. Показателите за натовареност показват подобрение – населението, обслужвано от един лекар, намалява, както и населението на един дентален специалист, което на пръв поглед говори за по-добър достъп до медицински услуги. В същото време това частично се дължи на намаляването на населението в периода 2020 – 2024 г.

В областта на грижите за деца в ранна възраст се запазва броят на детските ясли, но се отчита увеличение на местата и на броя на децата, посещаващи ги, което показва лек ръст в търсенето на тази услуга.

Таблица 4. Ключови показатели в сферата на здравеопазването в община Пазарджик

Показател	Стойност (брой)	
	2020 г.	2024 г.
Лечебни заведения за болнична помощ	6	6
Лечебни заведения за извънболнична помощ	33	33
Легла в лечебни и здравни заведения	996	1 000
Лекари	483	502
Лекари по дентална медицина	101	102
Професионалисти по здравни грижи и други медицински специалисти	705	693
Население на един лекар	218	177
Население на един дентален специалист	1 041	870
Детски ясли	6	6
Места в детски ясли	230	240
Деца в детски ясли	213	235

Източник: НСИ

Броят на детските градини в общината остава непроменен, като по-голямата част от тях са разположени в общинския център. Въпреки запазен брой заведения, се наблюдава намаление в броя на децата, които ги посещават. За сметка на това нараства броят на групите, което допринася за по-гъвкава организация на учебно-възпитателния процес. През разглеждания период се отчита и намаляване на педагогическия персонал, включително и спад в броя на детските учители.

Таблица 5. Ключови показатели в сферата на предучилищното образование в община Пазарджик

Показател	Стойност (брой)	
	2020/2021 г.	2023/2024 г.
Детски градини	15	15
Места в детски градини	3 513	4 304*
Места на 100 деца в детски градини	105	133*
Деца в детски градини	3 336	3 204
Групи в детските градини	125	142
Педагогически персонал в детските градини	259	239
Детски учители в детските градини	244	233

*Данните са за учебната 2022/2023 година, тъй като това са последните налични данни към момента на разработването на доклада.

Източник: НСИ

През разглеждания период в общината се наблюдава увеличение в броя на училищата, което свидетелства за разширяване на образователната мрежа и за подобряване на достъпа до образование. Броят на учащите също отчита нарастване, което може да се дължи на демографски промени, подобрени условия в учебните заведения и по-висок интерес към образователния процес. Особено забележима е тенденцията към значителен ръст на учениците в професионални паралелки. Това показва засилен интерес към професионалното образование и стремеж на младите хора да се ориентират към специалности, които осигуряват по-добра реализация на пазара на труда.

Таблица 6. Ключови показатели в сферата на училищното образование в община Пазарджик

Показател	Стойност (брой)	
	2020/2021 г.	2023/2024 г.
Училища на територията на общината	40	46
Учащи на територията на общината	9 430	11 757
Ученици в професионални паралелки	829	3 507

Източник: НСИ и ПИРО Пазарджик 2021-2027

Към 2024 г. в община Пазарджик функционира разнообразна мрежа от социални услуги, насочени към подобряване качеството на живот и осигуряване на подкрепа за различни уязвими групи от населението. В допълнение към съществуващите услуги, в общината се реализират и множество проекти и дейности със социална насоченост, целящи повишаване на социалната интеграция, достъпността и ефективността на предлаганата подкрепа. Социалните услуги, предоставяни на територията на общината, както и техният капацитет, са представени в следващата таблица.

Таблица 7. Социални услуги в община Пазарджик и техният капацитет към 2024 г.

Социални услуги в общността	Седалище	Капацитет
Дом за стари хора, гр. Пазарджик - /ДСХ/ - Община	гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ №19	170
Дом за стари хора, с. Главиница - /ДСХ/ Община	с. Главиница, ул. „Първа“ №95А	48
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦДПЛУ/ /НПО/	с. Звъничево, ул. „12- та“ №10А гр. Пазарджик, ул. „Гурко“ №2	30
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания ДЦДПЛУ/НПО/	с. Величково ул. „22-ра“ №5 гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител“ №69	20
Дневен център за деца и младежи увреждания ДЦДМУ /НПО/	гр. Пазарджик, ул. „П. Волов“ №14, ул. „Болнична“ № 41	50
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания ДЦПЛУ /НПО/	гр. Пазарджик, бул. „М. Луиза“ №63 гр. Пазарджик, ул. „К. Величков“ №91	40
Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с психични разстройства ЦСРИ /НПО/	гр. Пазарджик, ул. „Д-р Лонг“ №12	32
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица с умствена изостаналост ЦСРИ /НПО/	гр. Пазарджик, ул. „М. Луиза“ №63	24
Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с увреждания ЦСРИ/НПО/	гр. Пазарджик, ул. „Марица“ №20	40
Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с онкологични заболявания ЦСРИ/НПО/	гр. Пазарджик, ул. „Иван Клинчаров“ №4 гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски“ №16	30
Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица – правонарушители - ЦСРИ/НПО/	гр. Пазарджик, бул. „Ал. Стамболийски“ №8	20
Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания ЦСРИ/НПО/	гр. Пазарджик, ул. „П. Яворов“ №2 ет.2	20
Приют/община/	гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов“ №3а	8
Център за обществена подкрепа ЦОП/НПО/	гр. Пазарджик, бул. „М. Луиза“ №63 гр. Пазарджик, бул. „Ал. Стамболийски“ №48	84

Социални услуги в общността	Седалище	Капацитет
Звено „Майка и бебе“ ЗМБ/НПО/	гр. Пазарджик, бул. „М. Луиза“ №63 гр. Пазарджик бул. „Ал. Стамболийски“ №48	6
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост ЗЖ /УИ//НПО/	гр. Пазарджик, ул. „Г. Райков“ №12	8
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост ЗЖ /УИ//НПО/	гр. Пазарджик, бул. „М. Луиза“ №63 гр. Пазарджик, ул. „К. Величков“ №91	8
Защитено жилище за лица с физически увреждания ЗЖ /ФУ//НПО/	гр. Пазарджик, бул. „М. Луиза“ 63 гр. Пазарджик ул. „К. Величков“ №91	8
Център за работа с деца на улицата ЦРДУ/НПО/	с. Алеко Константиново /извън регулация/ ОС на БЧК – ул. „Хан Крум“ № 11	30
Център за работа с деца на улицата ЦРДУ/НПО/	гр. Пазарджик, ул. „Преспа“ №75 ОС на БЧК – ул. „Хан Крум“ № 11	30
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания ЦНСТ/НПО/	гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ №11 гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ №46	15
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания ЦНСТ/община/	с. Звъничево, ул. „12-та“ №10	10
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания ЦНСТ/община/	гр. Пазарджик, ул. „Тинтява“ №3в	14
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания ЦНСТ/НПО/	гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов“ №117	14
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания ЦНСТ/НПО/	гр. Пазарджик, ул. „Яков Матакиев“ №19	14
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични проблеми ЦНСТ/НПО/	гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ №24	15
Център за настаняване от семеен тип пълнолетни лица с деменция ЦНСТ/НПО/	гр. Пазарджик, ул. „Марица“ №20	10
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни с умствена изостаналост ЦНСТ/НПО/	с. Хаджиево, ул. „Първа“ №50А	10
Наблюдавано жилище /НЖ/	Община Пазарджик	6
Домашен социален патронаж	гр. Пазарджик, ул. „Веслец“	600
Обществена трапезария за социално слаби и възрастни хора	гр. Пазарджик бул. „Георги Бенковски“/ Помещава се в сградата на училище – „Георги Брегов“/	50

Източник: Община Пазарджик

Икономическо развитие

Наблюдението върху местната икономика ни дава по-ясна представа за общинския икономически напредък и тенденциите в развитието на икономическите субекти. Данните за икономическото развитие са налични до 2023 г. и са представени заедно с данните за 2020 г., посочени в **таблица 8**.

През периода 2020–2024 г. в община Пазарджик се наблюдава растеж на броя на предприятията с 5,2%, което показва стабилно развитие на местната икономика. Стойността на произведената продукция от нефинансовите предприятия отбелязва значителен ръст с над 52%. Това увеличение се отразява и в производителността на предприятията – произведената

продукция на 1 000 души нараства с 80,7%, което на пръв поглед показва значително подобрене в ефективността на работната сила и производствения капацитет, но частично се обяснява и с намаляването на населението в периода. Освен това, разходите за придобиване на дълготрайни материални активи се увеличават значително, което е индикатор за инвестиционна активност и модернизация на предприятията в общината.

Таблица 8. Ключови икономически показатели на община Пазарджик за 2020 и 2023 г.

Показател	Стойност		Изменение
	2020 г.	2023 г.	
Предприятия (бр.)	5 510	5 794	+284
Стойност на произведената продукция от нефинансовите предприятия (в хил. лв.)	1 935 644	2 949 867	+1 014 223
Произведена продукция на 1 000 д. (в хил. лв.)	18 406,48	33 256,67	+14 850
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (в хил. лв.)	210 007	630 179	+420 172

Източник: НСИ

3. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

В тази част на доклада е отчетено изпълнението на проектите, които допринасят за осъществяването на заложените цели и приоритети на плана. Те са систематизирани в табличен вид в **Приложение №1** към настоящия доклад и включват:

- Проекти/дейности, които са завършени през отчетния период. Тук попадат тези, които са започнати преди приемането на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г., но продължават да се изпълняват след утвърждаването на стратегическия документ. При финансовото отчитане, там където е било възможно, с оглед наличната информация, е представена усвоената сума само за периода 2021-2024 г.;
- Проекти/дейности, които са изцяло реализирани през отчетния период 2021-2024 г.;
- Проекти/дейности, които са в процес на изпълнение. Тук се включват проекти/дейности, които са започнати в периода 2021-2024 г. и се очаква да продължат и през следващите години.

С цел постигане на максимално обективна оценка са взети предвид следните условия:

- Изпълнени проекти/дейности, заложи в ПИРО Пазарджик 2021-2027 г.;
- Реализирани проекти/дейности, които не са изрично посочени в ПИРО Пазарджик 2021-2027 г., но могат да се отнесат към някой от приоритетите;
- Финансови резултати;
- Потенциално влияние върху постигането на заложените индикатори;
- Експертна оценка.

Оценката е направена въз основа на данни, получени от официални източници на информация, допълнителни кабинетни проучвания и разговори с представители на Общинската администрация.

При приемането на ПИРО, община Пазарджик определя своята **визия** за развитие, която е израз на желаното и реално постижимо състояние на общината към 2027 г. и фиксира насоката за структуриране на стратегическата част на плана и рамката за неговото изпълнение.

Община Пазарджик – иновативен административен център, с оптимална среда за развитие на бизнес и пълноценна реализация на човешкия фактор, място за устойчив и интелигент растеж, привлекателен за младите хора, инвеститори и туристи, осигуряваща сигурност, чиста околна среда и висок жизнен стандарт за своите граждани.

За реализиране на визията на общината в ПИРО са формулирани **четири стратегически цели**, които имат ясно изразен фокус и отразяват специфичните особености и потребности на общината. Тези цели обхващат ключовите направления за развитие на община Пазарджик и са насочени към използването и укрепването на местните потенциали.

В рамките на стратегическите цели са определени **четиринадесет приоритета**, които обхващат различни области на действие на общинските политики. Те отразяват спецификата на територията и поставят акцент върху местните възможности за устойчиво развитие. Към всеки приоритет са разработени конкретни мерки, осигуряващи по-висока степен на детайлност и насоченост на планираните дейности.

Междинната оценка е изготвена на базата на стратегическите цели, тъй като приоритетите съдържат дублиращи се дейности, което налага обединен подход при анализа и оценяването.

Стратегическа цел I: Ускорено икономическо развитие на общината и диверсификация на икономическите дейности с прилагане на иновации и осигуряване на благоприятна бизнес среда	Приоритет 1: Растеж, надграждане и модернизация на икономиката при щадящо използване на природните ресурси, опазване и възстановяване на околната среда и адаптиране към измененията в климата Приоритет 2: Привличане на нови инвеститори, запазване и диверсификация на съществуващия бизнес за поетапно преминаване към кръгова икономика Приоритет 3: Поддържане на конкурентноспособна местна икономика, гарантираща стабилна заетост и съвременни публични услуги
Стратегическа цел II: Изграждане и рехабилитация на ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие на града и селата, съхраняваща природните дадености с иновативна индустриална култура	Приоритет 1: Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите, социалните и екологични процеси в населените места на общината Приоритет 2: Транспорт и транспортна достъпност Приоритет 3: Изграждане на нова и реконструкция на съществуващата В и К мрежа и ПСОВ за населените места Приоритет 4: Повишаване на енергийната ефективност. Приоритет 5: Благоустрояване на селищната среда при щадящо използване на природните ресурси
Стратегическа цел III: Осигуряване на благоприятна среда за развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез ефективни мерки за насърчаване на образованието	Приоритет 1: Развитие на социалната сфера чрез подкрепа за услуги за намаляване на безработицата, повишаване на заетостта и доходите Приоритет 2: Подобряване достъпа до образователните услуги и социална инфраструктура Приоритет 3: Интеграция на малцинствата и социално включване Приоритет 4: Създаване на условия за масов и професионален спорт чрез рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура
Стратегическа цел IV: Модерно и устойчиво самоуправление за ускоряване социално-икономическото развитие на общината чрез качествено обслужване на бизнеса, на неговите организации и населението, подобряване на институционалната среда и административния капацитет	Приоритет 1: Съответствие с плановите процеси на европейско, национално и регионално ниво Приоритет 2: Обучения на общинската администрация и служители, пряко свързани с правомощията на местната власт за повишаване и непрекъсната актуализация на техните усилия и преквалификация в сферата на местното самоуправление

В Приложение №1 на ПИРО са представени конкретните проекти, планирани за реализация през програмния период, както и зоните за въздействие, в които ще бъдат осъществявани, заедно с индикативните им бюджети. В следващата част са изложени стратегическите цели, чието изпълнение се осигурява чрез реализирането на различни проекти и дейности. Те са насочени към постигане на визията за развитие на община Пазарджик до края на 2027 г.

3.1. Обща характеристика на изпълнените проекти и дейности

Количественото обобщение на данните от реализацията на ПИРО в първата половина на програмен период 2021-2027 изглежда по следния начин:

Отчетени са 1 329 проекта и дейности на обща проектна стойност 340 532 205,56 лв.	Реално привлечените средства в периода (от общински и местни инвестиции, трансфери от държавния бюджет и от програмите на ЕС) са в размер на 135 373 413,82 лв.
За всеки похарчен лев от общинския ресурс, Община Пазарджик е успяла да привлече 16,85 лв. от европейските фондове, централния бюджет или други източници.	Реално привлечените средства на един човек са 1 448,53 лв.

Чрез реализирането на отделните проекти и дейности, допринасящи за изпълнението на стратегическите цели и приоритети на плана, се осъществява на практика Планът за интегрирано развитие на община Пазарджик. В рамките на разглеждания период е отчетен значителен брой проекти и дейности, като част от тях продължават своето изпълнение и след 2024 г. Това показва устойчива ангажираност към прилагането на мерките и последователност в реализирането на заложените цели на общината.

Най-голям брой проекти/дейности се изпълняват по Стратегическа цел II, а най-малко – по Стратегическа цел IV. Общата проектна стойност е в размер на 64,6% от общата индикативна стойност на ПИРО. Реално изплатени са 39,8% от проектните стойности на отчетените 1 329 проекта/дейности. Важно уточнение е, че част от проектите са започнали в периода преди 2021 г. и по тях има изплатени суми преди влизането в действие на ПИРО, т. е. съотношението проектно реално изпълнено е само на база изплатените средства между 01.01.2021 г. и 31.12.2024 г. Най-голям финансов ресурс е предвиден за реализацията на Стратегическа цел II и към средата на периода най-много средства са отделени именно за този стратегическа цел.

Стратегическа цел I: Ускорено икономическо развитие на общината и диверсификация на икономическите дейности с прилагане на иновации и осигуряване на благоприятна бизнес среда се характеризира с 335 изпълнени и изпълняващи се проекти/дейности. Проектната им стойност е в размер на **133 291 157,92 лв.**, а към средата на периода реално изплатени са 41,7% от тях. Част от проектите са стартирали в периода 2021-2024 г., но нямат изплатени средства към момента на изготвяне на междинната оценка. Проектите се финансират от различни финансови източници.

В периода 2021-2024 г. са изпълнени и продължават да се изпълняват 608 проекта/дейности, които допринасят за постигането на **Стратегическа цел II: Изграждане и рехабилитация на ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие на града и селата, съхраняваща природните дадености с иновативна индустриална култура**. Проектната им стойност възлиза на **148 742 651,82 лв.**, а реално изплатени са 32,4% от тази сума. Финансирането е от разнообразни източници. Очаква се да се

повиши изпълнението на стратегическата цел в бъдеще, тъй като част от проектите са недоизплатени и продължават и след периода на настоящето отчитане.


Проектите и дейностите, попадащи в обхвата на **Стратегическа цел III: Осигуряване на благоприятна среда за развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез ефективни мерки за насърчване на образованието, масовия спорт и социалното включване** имат проектна стойност в размер на **50 352 072,65 лв.** Изплатените средства за реализацията на 251 проекта/дейности до средата на периода са в размер на 47,3% от проектните стойности. Финансирането е от различни източници. Реализацията на част от проектите продължава и след изготвянето на междинната оценка.

Стратегическа цел IV: Модерно и устойчиво самоуправление за ускоряване социално-икономическото развитие на общината чрез качествено обслужване на бизнеса, на неговите организации и на населението, подобряване на институционалната среда и административния капацитет се характеризира с 27 проекти/дейности, чиято проектната стойност е **593 841,50 лв.** Реално изплатените средства са в размер на 55,4%. Разнообразни са източниците на финансиране. Част от проектите са недоизплатени към края на 2024 г.

Настъпването на пандемията от Covid-19 представлява непредвидено обстоятелство, поради което проектите, насочени към преодоляване на нейните последици, не могат да бъдат отнесени към нито един от приоритетите на плана. В разглеждания период са реализирани общо 108 проекта, свързани с мерки за подкрепа в условията на пандемия. За тях е изплатена цялата проектна стойност, възлизаща на **7 530 164,98 лв.**, като финансирането е осигурено от ОПИК.

От **фигура 2** може да се проследи общото изпълнение на ПИРО Пазарджик за отчетния период в 4-те стратегически цели и Covid-19. Тя показва броя на осъществените проекти (лява скала) и тяхната средна стойност (дясна скала).

Фигура 2. Средна стойност (дясна скала) и брой (лява скала) на текущите и изпълнени в периода 2021-2024 г. проекти/дейности

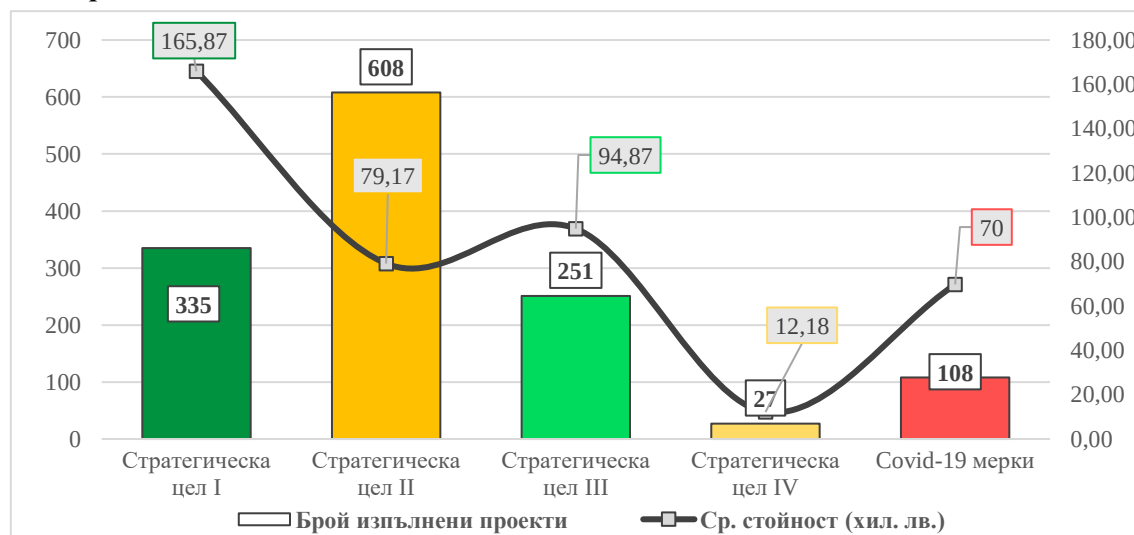

Източник: Община Пазарджик, ИСУН, собствени изчисления

В следващите части от доклада е направен по-подробен преглед на реализацията на ПИРО за периода 2021-2024 г. както по източниците на финансиране, така и по индикативното и реалното изпълнение на стратегическите цели.

3.2. Обобщение на изпълнението на стратегическите цели в ПИРО

В тази част от настоящия доклад е направено проучване на начините, по които се изпълняват стратегическите цели, приоритетите и мерките, заложи в ПИРО Пазарджик. Направени са сравнения между индикативните бюджети по стратегическите цели и реалното им финансово изпълнение към 31.12.2024 г.

Планираните средства за реализация на ПИРО са в размер на **527 088 000 лв.**, а през първите четири години от действието на ПИРО са разходвани **25,7%** от тях. При липса на бъдеща актуализация е възможно по-голямата част от индикативния финансов ресурс да бъде изпълнен. **Таблица 9** отразява процентно реалното изпълнение по стратегически цели и броя проекти, от които произлиза дялът на реалното изпълнение по стратегически цели. В таблицата не са включени проектите, свързани с Covid-19, които също допринасят за изпълнението на ПИРО, но не попадат към нито една стратегическа цел. **Приложение №1** описва в детайли всички проекти, разпределени по приоритети и реализирани на територията на община Пазарджик.

Таблица 9. Реално финансово и техническо изпълнение по стратегическите цели за периода 2021-2024 г.

Приоритет	Реално изпълнение		Изпълнени проекти (брой)
	хил. лв.	дял (%)	
Стратегическа цел I	55 567	41,05%	335
Стратегическа цел II	48 134	35,56%	608
Стратегическа цел III	23 813	17,59%	251
Стратегическа цел IV	329	0,24%	27
Общо (без 108 бр. Covid-19 проекти)	127 843	94,4%	1 221

Източник: Община Пазарджик, ИСУН, собствени изчисления

Стратегическа цел I: Ускорено икономическо развитие на общината и диверсификация на икономическите дейности с прилагане на иновации и осигуряване на благоприятна бизнес среда


В рамките на стратегическата цел се предвижда развитие на икономиката в общината и прилежащите територии в икономическите зони. Включени са дейности за изграждане и/или обновяване на транспортните комуникации, техническата и телекомуникационна инфраструктура и подобряване достъпността и технологичната осигуреност на съществуващата индустриална зона. В тази цел попадат и дейностите, свързани с насърчаване развитието на зелената индустрия и кръгова икономика, основани на използвани от собствени ВЕИ електрическа и топлинна енергия. Предвидени са дейности за развитие на туристическия отрасъл, както и за развитие на земеделието. Дейностите са групирани в три приоритета:

- **Приоритет 1. Растеж, надграждане и модернизация на икономиката при щадящо използване на природните ресурси, опазване и възстановяване на околната среда и адаптиране към измененията в климата**
- **Приоритет 2. Привличане на нови инвеститори, запазване и диверсификация на съществуващия бизнес за поетапно преминаване към кръгова икономика**
- **Приоритет 3. Поддържане на конкурентноспособна местна икономика, гарантираща стабилна заетост и съвременни публични услуги**

В периода 2021–2024 г. са реализирани и се изпълняват общо 335 проекта и дейности. Реално изплатените средства възлизат на почти половината от предвидените за Стратегическата цел в ПИРО Пазарджик. Поради липсата на разпределение на индикативния бюджет не е

възможно да се направи пряка съпоставка между планираните средства по източници на финансиране и реално изплатените суми. В значителна част от проектите е осигурено и собствено съфинансиране от страна на бенефициентите. В отчетния период са реализирани редица проекти, насочени към подобряване на земеделието, създаване на по-благоприятна бизнес среда и оказване на подкрепа на местните предприятия. Тези дейности допринасят за повишаване на икономическата активност и устойчивото развитие на общината. Очаква се в следващия период степента на изпълнение на приоритета да се повиши, тъй като част от проектите към момента на изготвяне на междинната оценка все още нямат извършени плащания и продължават след 2024 г. **Фигура 3** представя съотношението на реалното изпълнение на Стратегическа цел I спрямо останалите цели, а **фигура 4** илюстрира дела на реалното изпълнение на Стратегическа цел I спрямо индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021–2024 г.

Фигура 3. Принос на Стратегическа цел I към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г. **Фигура 4. Дял на реалното изпълнение на Стратегическа цел I към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.**

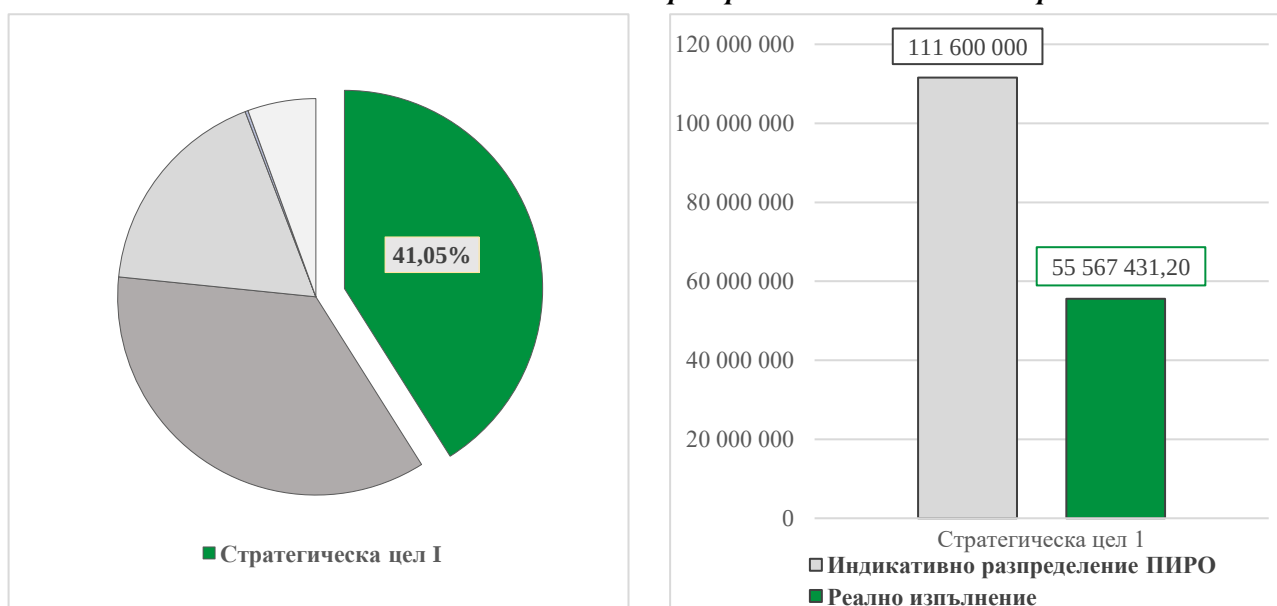

Източник: Община Пазарджик, ПИРО Пазарджик 2021-2027 г., ИСУН, собствени изчисления


Стратегическа цел II: Изграждане и рехабилитация на ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие на града и селата, съхраняваща природните дадености с иновативна индустриална култура

В рамките на стратегическата цел се предвиждат голям набор от дейности в различни тематични направления. Предвижда се обновяване на градската жизнена среда, реконструкция на уличната мрежа и модернизация на транспортната инфраструктура. В тази цел попадат и дейностите за изграждане, доизграждане и реконструкция на ВиК инфраструктурата и повишаване свързаността на населението с пречиствателни станции за отпадъчни води. Обръща се внимание и на повишаване на енергийната ефективност в различни публични сгради. Предвиждат се дейности и за строителство, реконструкция, ремонт и оборудване на образователните заведения, както и обновяване и модернизация на материално-техническата база в здравните заведения чрез ремонти и мерки за енергийна ефективност и осигуряване на високотехнологично съвременно оборудване. Благоустрояването на селищната среда чрез подобряване на сметосъбирането и сметообработването в общината също е предмет на настоящата цел. Тя се разгръща в пет приоритета, които са:


- **Приоритет 1. Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите, социалните и екологични процеси в населените места на общината**
- **Приоритет 2. Транспорт и транспортна достъпност**
- **Приоритет 3. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща В и К мрежи и ПСОВ за населените места**
- **Приоритет 4. Повишаване на енергийната ефективност**
- **Приоритет 5. Благоустрояване на селищната среда при щадящо използване на природните ресурси**

Този приоритет има най-високо техническо изпълнение – 608 проекта/дейности. Изплатените средства за реализацията им представляват 11,9% от индикативния бюджет за стратегическата цел. Не може да бъде направена съпоставка между планираните средства по източници на финансиране и реално изплатени такива, поради липса на разпределения на индикативния бюджет. Чрез реализираните проекти/дейности е подкрепен бизнесът в община Пазарджик и земеделските производители. Подпомогнато е развитието на туризма. На фигурите е представено съотношението на реалното изпълнение на Приоритет 2 спрямо останалите приоритети и делът на реалното изпълнение на Стратегическа цел II към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.

Фигура 5. Принос на Стратегическа цел II към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.

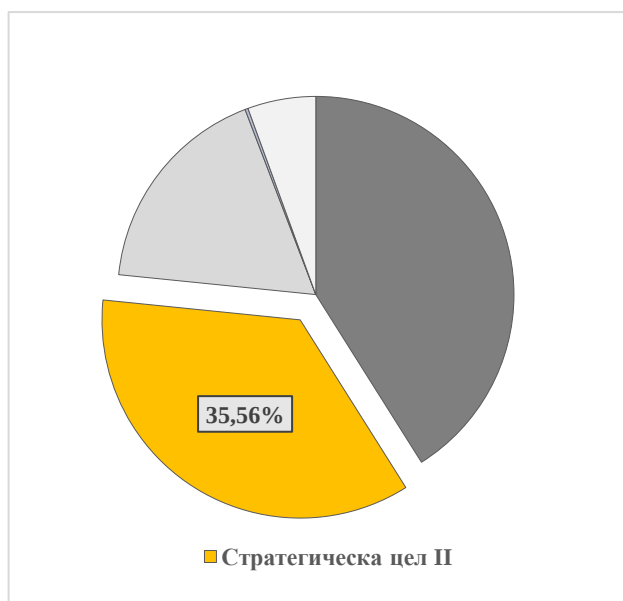

Фигура 6. Дял на реалното изпълнение на Стратегическа цел II към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.

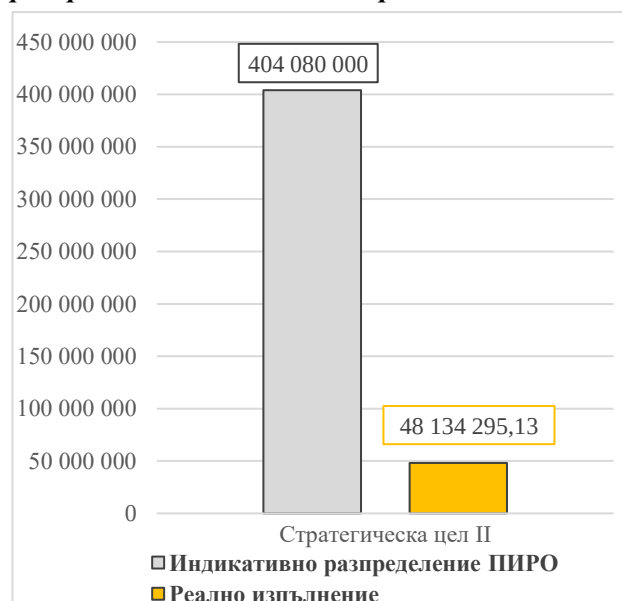

Източник: Община Пазарджик, ПИРО Пазарджик 2021-2027 г., ИСУН, собствени изчисления

Стратегическа цел III: Осигуряване на благоприятна среда за развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез ефективни мерки за насърчаване на образованието, масовия спорт и социалното включване


В изпълнение на Стратегическа цел III са планирани дейности за подобряване на образователното ниво на всички деца в общината чрез въвеждане на STEM, както и енергийна ефективност в образователните институции. В тази цел са заложили и дейности за интеграция на малцинствени групи и хора със специални потребности. Подкрепят се социалните институции и услугите, които предоставят. Освен това се подкрепя и изграждането на мрежа от спортни

съоръжения и създаването на подходяща среда за масов спорт. Формулирани са четири приоритета:


- **Приоритет 1. Развитие на социалната сфера чрез подкрепа за услуги за намаляване на безработицата, повишаване на заетостта и доходите.**
- **Приоритет 2. Подобряване достъпа до образователните услуги и социалната инфраструктура.**
- **Приоритет 3. Интеграция на малцинствата и социално включване.**
- **Приоритет 4. Създаване на условия за масов и професионален спорт чрез рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура.**

В периода 2021–2024 г. са реализирани и се изпълняват общо 251 проекта и дейности. Изплатените средства за тяхната реализация са малко над два пъти повече от първоначално планираните в ПИРО. Поради липсата на разпределение на индикативния бюджет не е възможно да се направи директна съпоставка между планираните средства по източници на финансиране и реално изплатените суми. Чрез реализираните проекти са благоустроени населените места в общината, подкрепени са образователните и здравните институции, изградена и рехабилитирана е пътната инфраструктура и ВиК мрежата. На фигурите по-долу графично са представени приносът на Стратегическа цел III към общото изпълнение, както и делът на реално изплатените средства спрямо индикативно предвидените в плана.

Фигура 7. Принос на Стратегическа цел III към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.

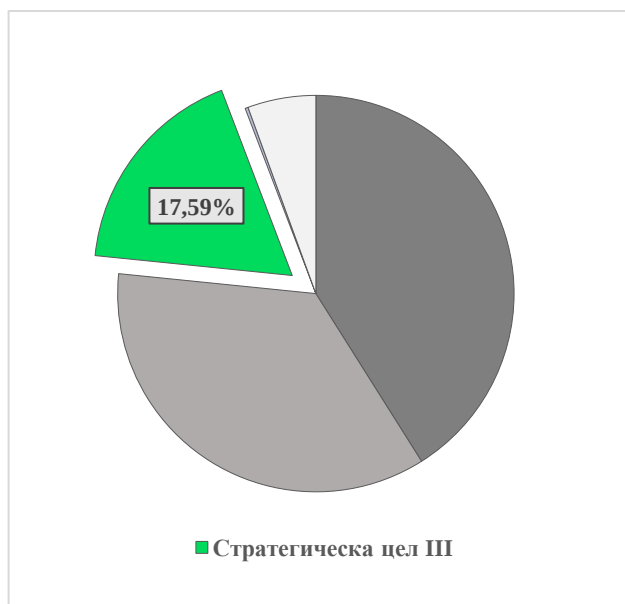

Фигура 8. Дял на реалното изпълнение на Стратегическа цел III към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.

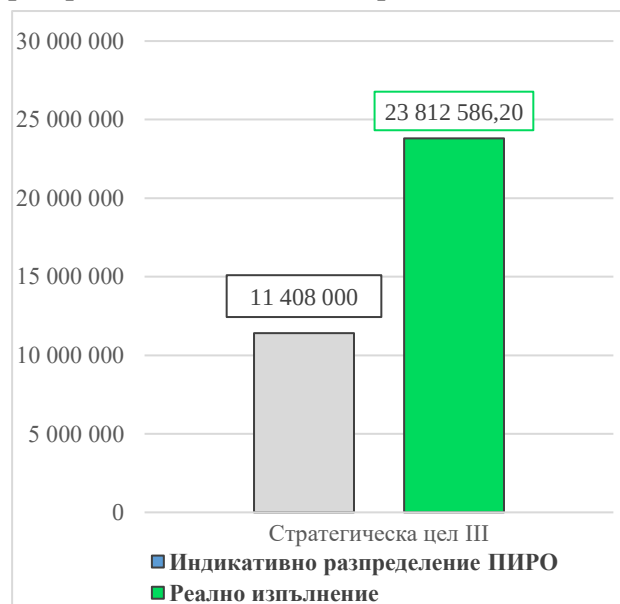

Източник: Община Пазарджик, ПИРО Пазарджик 2021-2027 г., ИСУН, собствени изчисления


Стратегическа цел IV: Модерно и устойчиво самоуправление за ускоряване социално-икономическото развитие на общината чрез качествено обслужване на бизнеса, на неговите организации и на населението, подобряване на институционалната среда и административния капацитет

Стратегическа цел IV се фокусира върху оптимизирането на процесите на административното обслужване и създаване на партньорства между различни заинтересувани страни. Акцент се поставя върху провеждането на специализирани обучения на общинската администрация и въвеждане на ГИС. Стратегическата цел се разгръща в два приоритета:

- **Приоритет 1. Съответствие с плановите процеси на европейско, национално и регионално ниво.**
- **Приоритет 2. Обучения на общинската администрация и служители, пряко свързани с правомощията на местната власт, за повишаване и непрекъсната актуализация на техните умения и професионална квалификация в сферата на местното самоуправление.**

Тази стратегическа цел се характеризира с 27 проекта/дейности. Не може да бъде направена съпоставка между планирано и реално изплатено, тъй като при изготвяне на ПИРО не е посочена индикативна стойност. Поради липсата на разпределение на индикативния бюджет не е възможно да се направи и директна съпоставка между планираните средства по източници на финансиране и реално изплатените суми. Подкрепено е развитието на спорта в общината. Осигурена е благоприятна среда развитие на човешките ресурси и е подобро социалното включване на уязвими групи. Повишена е енергийната ефективност в образователните институции. На **фигура 9** е представен приносът на приоритета към общото реално изпълнение на бюджета, а на **фигура 10** графично е показано съотношението между планирани в ПИРО средства и реално изразходвани за приоритета.

Фигура 9. Принос на Стратегическа цел IV към Фигура 10. Дял на реалното изпълнение на общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.

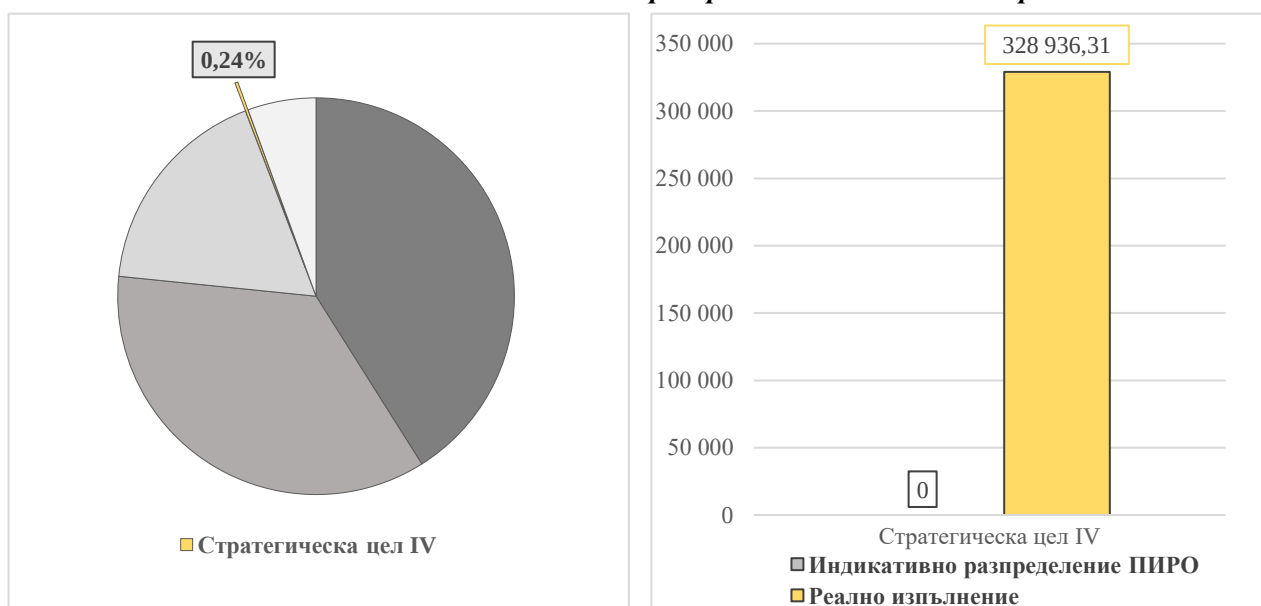


Източник: Община Пазарджик, ПИРО Пазарджик 2021-2027 г., ИСУН, собствени изчисления


Covid-19 мерки

При първоначалното изготвяне и приемане на ПИРО Пазарджик не са обособени стратегически цели, приоритети и мерки за справяне с кризата, която настъпи вследствие на разпространението на Covid-19. В периода 2021-2024 г. са реализирани 108 проекта, свързани с преодоляване на последствията от Covid-19 на обща проектна стойност **7 552 481,67лв.**, която е изплатена на 99,7%.

Фигура 11. Принос на мерките за преодоляване на последствията от Covid-19 към общото изпълнение на ПИРО за периода 2021-2024 г.

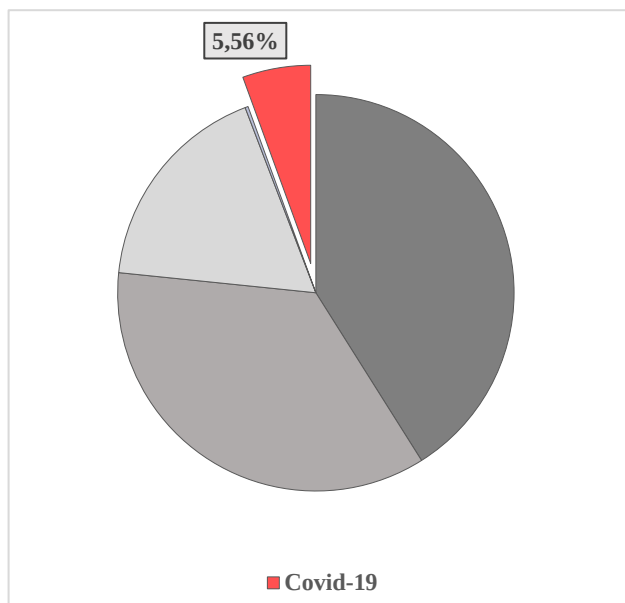

Фигура 12. Дял на реалното изпълнение на мерките за преодоляване на последствията от Covid-19 към индикативното разпределение в ПИРО за периода 2021-2024 г.

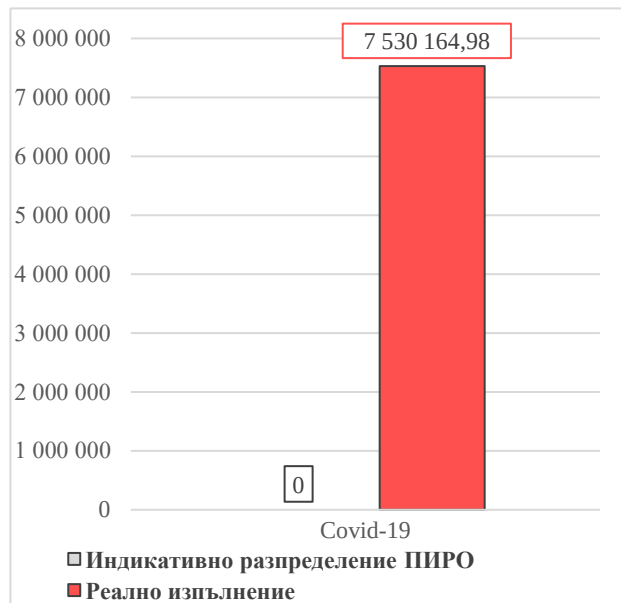

Източник: ИСУН, собствени изчисления

4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

Проследяването на напредъка по отношение постигането на целите за развитие в ПИРО е важен компонент в процеса на оценяване. По този начин може да се проследи до каква степен се изпълняват стратегическите цели, приоритетите и мерките в общината. Оценката се основава на базовите стойности и изменението, което е настъпило в разглеждания период. Отчита се каква е междинната стойност на индикаторите и се съотнася към целевата стойност, която да бъде постигната в края на програмния период. Количествено измеримите индикатори спомагат за оценката на ПИРО и дават по-ясен поглед над моментната ситуация в общината. Обособени са два вида индикатори – индикатори за резултат и индикатори за продукт, които са оценени по следната скала:

Процент изпълнение спрямо целевата стойност	Цвят
преизпълнен (>100%)	
изпълнен (между 80% и 100%)	
частично изпълнен (между 50% и 80%)	
не е изпълнен (<50%)	
отрицателно изпълнен (<0%)	
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани	

В рамките на Плана за интегрирано развитие на община Пазарджик (ПИРО) са определени общо **17 индикатора за резултат** и **61 индикатора за продукт**. Чрез тези показатели се проследява напредъкът и степента на постигане на основните цели и приоритети за развитие на общината. Оценката на изпълнението е извършена за периода от **01.01.2021 г. до 31.12.2024 г.** Данните, използвани за наблюдение на степента на постигане на целите и приоритетите, са събрани от официални източници на информация, както и чрез провеждане на целенасочени проучвания и консултации с представители на Община Пазарджик.

4.1. Оценка на общото въздействие при изпълнение на стратегическите цели

Проследяването на напредъка в изпълнението на стратегическите цели на ПИРО Пазарджик се осъществява чрез заложените индикатори за резултат. Тези индикатори представляват ключов инструмент за оценка на ефективността на прилаганите политики и мерки в рамките на плана.

В плана са определени 17 индикатора за резултат, които са разпределени към четирите стратегически цели на документа. Всеки от тях измерва степента на напредък по конкретни направления от общинската политика и позволява да се направи обективна оценка на постигнатите резултати. След извършения анализ и преглед на наличните данни могат да бъдат открити следните основни изводи:

Стратегическа цел I: Ускорено икономическо развитие на общината и диверсификация на икономическите дейности с прилагане на иновации и осигуряване на благоприятна бизнес среда

- Индикаторът *Жители, които имат достъп до нова или модернизирана зелена инфраструктура в градските райони* е изпълнен към средата на периода.
- Към средата на програмния период частично изпълнение има един индикатор, като е възможно до края на действието на ПИРО да бъде изпълнен.
- Останалите четири индикатора са неизпълнени, като един от тях няма стартирало изпълнение към 2024 г.

- Към настоящия етап от изпълнението на ПИРО 66,7% от заложените индикатори, свързани с първата стратегическа цел, са неизпълнени, 16,7% са частично изпълнени, а 16,7% се оценяват като изпълнени.

Стратегическа цел II: Изграждане и рехабилитация на ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие на града и селата, съхраняваща природните дадености с иновативна индустриална култура

- Към средата на периода е преизпълнен един индикатор - Жители, свързани към системата за пречистване на отпадъчни води.
- Три са изпълнените индикатора, като е възможно те да бъдат преизпълнени до края на програмния период.
- Четири са неизпълнените индикатора, като само един от тях има започнало изпълнение към 2024 г.
- От анализа на изпълнението на индикаторите към втората стратегическа цел се установява, че 50% от тях са неизпълнени, 37,5% са изпълнени, а 12,5% показват преизпълнение спрямо заложените целеви стойности.

Стратегическа цел II: Осигуряване на благоприятна среда за развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез ефективни мерки за насърчаване на образованието, масовия спорт и социалното включване

- Изпълнението на третата стратегическа цел се проследява посредством един основен индикатор – Годишен брой на децата, ползващи подкрепената образователна система и спортна инфраструктура. Към средата на отчетния период индикаторът все още не е изпълнен. Въпреки това се отчита наличие на потенциал за постигане на целевата стойност до 2027 г.

Стратегическа цел IV: Модерно и устойчиво самоуправление за ускоряване социално-икономическото развитие на общината чрез качествено обслужване на бизнеса, на неговите организации и на населението, подобряване на институционалната среда и административния капацитет

- Изпълнението на четвъртата стратегическа цел се проследява чрез два индикатора. Към средата на отчетния период и двата индикатора се оценяват като неизпълнени. Въпреки това, индикаторът Брой преминали обучения на служители от публичната администрация показва потенциал за постигане на целевите стойности до края на програмния период.

Таблица 10. Разпределение на индикаторите за резултат според техния напредък спрямо общото

Процент на изпълнение на индикаторите за резултат	Брой
преизпълнен (>100%)	1
изпълнен (между 80% и 100%)	4
частично изпълнен (между 50% и 80%)	1
не е изпълнен (<50%)	11
отрицателно изпълнен (<0%)	0
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани	0
Общо	17

В Таблица 11 са представени индикаторите за резултат, заложи в ПИРО и тяхното изпълнение към 31.12.2024 г.

Таблица 11. Индикатори за резултат, заложен в ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. и тяхното изпълнение

№	Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
Стратегическа цел I: Ускорено икономическо развитие на общината и диверсификация на икономическите дейности с прилагане на иновации и осигуряване на благоприятна бизнес среда							
1.	Намаляване емисиите от парникови газове годишно	%	ИСУН, Община Пазарджик, Информация на ниво проект	Н/П	5	15	33,3% (неизпълнен)
2.	Жители, които имат достъп до нова или модернизирана зелена инфраструктура в градските райони	брой	Община Пазарджик	Н/П	50 000	50 000	100% (изпълнен)
3.	Обществени сгради с подобрена енергийна класификация	брой	ИСУН, Община Пазарджик, Информация на ниво проект	Н/П	6	14	42,9% (неизпълнен)
4.	Домакинства с подобрени енергийни характеристики на своите жилища	брой	ИСУН, Община Пазарджик, Информация на ниво проект	Н/П	0	1 000	0% (неизпълнен)
5.	Понижаване на годишно крайно потребление на първична енергия (жилищни сгради, частни нежилищни, обществени нежилищни)	%	ИСУН, Община Пазарджик, Информация на ниво проект	Н/П	5	15	33,3% (неизпълнен)
6.	Количество разделно събрани отпадъци за рециклиране	Тона % от събраните	Община Пазарджик, РИОСВ	Н/П	75 000	150 000	50% (частично изпълнен)
Стратегическа цел II: Изграждане и рехабилитация на ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие на града и селата, съхраняваща природните дадености с иновативна индустриална култура							
1.	Жители, посещаващи обекти от спортната инфраструктура	брой	Община Пазарджик, НПО	Н/П	5 000	5 000	100% (изпълнен)
2.	Увеличен брой потребители, ползващи безплатни Wi-Fi зони на територията на гр. Пазарджик	брой	Община Пазарджик, мобилни оператори, НСИ	Н/П	600	2 000	30% (неизпълнен)
3.	Брой потребители, свързани със селищните системи за външно изкуствено осветление	брой	ИСУН, Община Пазарджик, Информация за проект	Н/П	68 194	80 000	85,2% (изпълнен)

Междинна оценка на изпълнението на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. за периода 2021-2024 г.

№	Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
4.	Брой потребители с достъп до модернизирана здравна инфраструктура	брой	ИСУН, Община Пазарджик, Информация за проект, здравни и лечебни заведения, МЗ	Н/П	50 000	50 000	100% (изпълнен)
5.	Потребители, свързани със система за видеонаблюдение	брой	Община Пазарджик, ОДМВР	Н/П	0	50 000	0% (неизпълнен)
6.	Жители, свързани към системата за пречистване на отпадъчни води	брой	Община Пазарджик, ОДМВР	Н/П	60 000	50 000	>100% (преизпълнен)
7.	Жители, свързани към подобрените системи за водоснабдяване	брой	Община Пазарджик, ОДМВР	Н/П	0	65 000	0% (неизпълнен)
8.	Намалени загуби на води	%	„ВиКУ“ Пазарджик, НСИ	Н/П	0	20	0% (неизпълнен)
Стратегическа цел III: Осигуряване на благоприятна среда за развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез ефективни мерки за насърчаване на образованието, масовия спорт и социалното включване							
1.	Годишен брой на децата, ползващи подкрепената образователна система и спортна инфраструктура	брой	Община Пазарджик, РИО - Пазарджик	Н/П	448	1 000	44,8% (неизпълнен)
Стратегическа цел IV: Модерно и устойчиво самоуправление за ускоряване социално-икономическото развитие на общината чрез качествено обслужване на бизнеса, на неговите организации и на населението, подобряване на институционалната среда и административния капацитет							
1.	Актуализирани стратегически документи в съответствие с приоритетите на ЕС, РБ, район за планиране и областта (след приемането на последните)	брой	Община Пазарджик	Н/П	0	7	0% (неизпълнен)
2.	Брой преминали обучения на служители от публичната администрация	брой	Община Пазарджик	Н/П	6	15	40% (неизпълнен)

Източник: ПИРО Пазарджик 2021-2027 г., Общинска администрация, ИСУН, собствени изчисления

4.2. Оценка на изпълнението на определени приоритети за развитие

Индикаторите за продукт, заложи в ПИРО Пазарджик, са систематизирани по приоритети и са тясно свързани с мерките, включени в рамките на всеки приоритет. Те служат за наблюдение и оценка на изпълнението на конкретни направления и дейности, насочени към устойчивото развитие на общината. В рамките на ПИРО Пазарджик са определени общо 61 индикатора за продукт, разпределени към четиринадесетте приоритета. За всеки от тях са заложи цели стойности, чието постигане се планира до края на 2027 г.

Стратегическа цел I: Ускорено икономическо развитие на общината и диверсификация на икономическите дейности с прилагане на иновации и осигуряване на благоприятна бизнес среда

Приоритет 1

- Два са индикаторите, които имат частично изпълнение към средата на периода. Възможно е те да бъдат изпълнени до 2027 г.
- Останалите четири индикатора са неизпълнени, като се забелязва, че само един от тях има стартирало изпълнение.
- Към 2024 г. се отчита, че 66,7% от индикаторите са неизпълнени, докато 33,3% са частично изпълнени.

Приоритет 2

- До средата на отчетния период един от индикаторите е преизпълнен, което показва по-високи от очакваните резултати. В тази връзка е възможна актуализация на заложената целева стойност в посока завишаване, с цел по-точно отразяване на постигнатия напредък.
- Към 2024 г. се установява, че един от индикаторите е изпълнен в пълна степен, докато друг показва частично изпълнение, което показва наличие на напредък, но и необходимост от допълнителни действия за постигане на целевите стойности до края на периода.
- Индикаторът *Въведени безотпадни технологии в производствени предприятия* е неизпълнен, а поради липса на информация не може да бъде оценен напредъкът на индикатора *Стимулиране на инвестиционната активност и промотирането на община Пазарджик като инвестиционна дестинация*.
- Към момента съотношението между преизпълнените, изпълнените, частично изпълнените, неизпълнените индикатори, както и тези, за които не може да бъде отчетен напредък, е равномерно.

Приоритет 3

- От анализа на изпълнението по съответния приоритет се установява, че седем от общо осем индикатора са неизпълнени, като при пет от тях към средата на периода не е стартирало изпълнение на предвидените дейности.
- За разлика от тях, индикаторът *Реализиране на проекти за изграждане на съпътстваща инфраструктура на археологически и природни обекти и превръщането им в туристически атракции, както и възможности за разширяване на легловата база* е преизпълнен, което показва значителен напредък и положителна динамика в изпълнението на мерките, свързани с развитието на туристическата инфраструктура.

Стратегическа цел II: Изграждане и рехабилитация на ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие на града и селата, съхраняваща природните дадености с иновативна индустриална култура

Приоритет 1

- Този приоритет е с най-голям брой заложили индикатори. Към средата на отчетния период по-голямата част от тях – седем на брой – остават неизпълнени.
- Други четири индикатора са изпълнени в периода 2021 – 2024 г. Въз основа на отчетените резултати се препоръчва преразглеждане и актуализация на техните целеви стойности, с цел по-точно отразяване на напредъка и стимулиране на по-висока ефективност в рамките на програмния период.
- Индикаторът *Брой контролирани замърсители на атмосферния въздух* има частично изпълнение, но е възможно целевите му стойности да бъдат постигнати до края на програмния период.
- Поради липса на обозначена мерна единица не може да бъде оценен напредъкът на индикатора *Осигурена превенция от наводнения и предотвратяване на свлачищни процеси, надграждане на Информационната система за превенция и управление на риска от наводнения, чрез проект: „Почистване на речни корита, отводнителни канали, дерета и други“*.
- Обобщените данни показват, че 53,9% от индикаторите са неизпълнени, 30,8% са изпълнени, а 7,7% са частично изпълнени.

Приоритет 2

- Към средата на периода шестте индикатора остават неизпълнени, а по два от тях няма започнати дейности.

Приоритет 3

- И двата индикатора са неизпълнени.
- Индикаторът *Изградена В и К мрежа и ПСОВ в населените места* има две целеви стойности и съответно две мерни единици. И двата са неизпълнени.

Приоритет 4

- Индикаторът *Въведена системи за интелигентно и интегрирано управление на транспорта* е неизпълнен.
- Индикаторът *Доизградена Регионална система за управление на отпадъците – разделно събиране и обработка на ТБО, намаляване на хранителните отпадъци и своевременно премахване на нерегламентирани сметища* е изцяло изпълнен.,
- Наблюдава се баланс между изпълнените и неизпълнените индикатори.

Приоритет 5

- Не може да бъде оценен напредък по нито един от индикаторите, тъй като липсва информация за тях. Въпреки това, може да се отбележи, че има изпълнение по индикатора *Разработване на Генерален план за организация на движението в гр. Пазарджик, както и План за устойчива градска мобилност. Въвеждане на системи за интелигентно управление на трафика, инфраструктура и оборудване на системи за паркиране; насърчаване на електрическата мобилност, вкл. чрез закупуване на нов и екологично чист подвижен състав за нуждите на градския и междуселищен транспорт и изграждане на*

инфраструктура – зарядни станции за електроавтомобили, тъй като има изготвен План за устойчива градска мобилност за гр. Пазарджик през 2023 г.

Стратегическа цел III: Осигуряване на благоприятна среда за развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез ефективни мерки за насърчаване на образованието, масовия спорт и социалното включване

Приоритет 1

- Нито един от четирите индикатора не е изпълнен към отчетния период. Само един индикатор има стартирало изпълнение - *Участие в национални и международни форуми чрез развитие на системите за присъствено и дистанционно обучение и информационно-комуникационните технологии.*

Приоритет 2

- Само един индикатор проследява изпълнението на приоритета - *Въведени мерки за енергийна ефективност на образователния сграден фонд по проекти.* Към средата на периода той е неизпълнен.

Приоритет 3

- За съответния приоритет е определен един индикатор, чрез който се проследява напредъкът. Към средата на програмния период целевата му стойност вече е постигната. Поради това е целесъобразно да се обмисли нейното повишаване с оглед постигане на по-висока ефективност през остатъка от периода.

Приоритет 4

- Индикаторът *Реновирани/изградени нови спортни съоръжения: бившия стадион „Любен Шкодров“, зали, зони на открито* е изцяло изпълнен. Повишаването на целевата му стойност би представлявало подходящ подход за повишаване на ефективността при прилагането на плана през остатъка от периода.
- Индикаторът *Изградени нови физкултурни салони в ОУ „Проф. И. Батаклиев“, НУ „В. Друмев“ и НУ „В. Левски“, всичките – в гр. Пазарджик* е неизпълнен. Въпреки това се очаква неговото реализиране в остатъка от периода, тъй като са предприети действия за доизграждането на останалите обекти.

Стратегическа цел IV: Модерно и устойчиво самоуправление за ускоряване социално-икономическото развитие на общината чрез качествено обслужване на бизнеса, на неговите организации и на населението, подобряване на институционалната среда и административния капацитет

Приоритет 1

- Двата избрани индикатора са неизпълнени към средата на периода.

Приоритет 2

- Четири от шестте индикатора за съответния приоритет са изпълнени към средата на периода. Възможно е целевата стойност да бъде повишена, за повишаване на изпълнението на плана.
- Индикаторите *Въвеждане на система за оценка на нуждите от обучения на общинските служители* и *Програми за „стажуване“ в различни ВУЗ-ове и обучителни центрове, вкл. и дистанционни* са неизпълнени.

- 66,7% от индикаторите, заложиени към приоритета са изпълнени, докато 33,3% са неизпълнени.

Таблица 12. Разпределение на индикаторите за продукт според техния напредък спрямо общото

Процент на изпълнение на Индикаторите за продукт	Брой
преизпълнен (>100%)	2
изпълнен (между 80% и 100%)	12
частично изпълнен (между 50% и 80%)	4
не е изпълнен (<50%)	38
отрицателно изпълнен (<0%)	0
не може да бъде оценено, защото стойностите липсват или са грешни, или компрометирани	5
Общо	61

В **Таблица 13** са представени индикаторите за продукт, заложиени в ПИРО и тяхното изпълнение към 31.12.2024 г.

Таблица 13. Индикатори за продукт, заложен в ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. и тяхното изпълнение

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
Стратегическа цел I: Ускорено икономическо развитие на общината и диверсификация на икономическите дейности с прилагане на иновации и осигуряване на благоприятна бизнес среда						
Приоритет 1: Растеж, надграждане и модернизация на икономиката при щадящо използване на природните ресурси, опазване и възстановяване на околната среда и адаптиране към измененията в климата						
1.1.	Изградено ново мостово съоръжение над река Марица за връзка на Южен обходен път част от Главен път I-8	бр.	Община Пазарджик, АПИ	0	1	0% (неизпълнен)
1.2.	Подкрепени предприятия, внедряващи иновативни технологични продукти с по-висока добавена стойност	бр.	ИСУН	3	7	42,9% (неизпълнен)
1.3.	Изградени локални платна на Главен път I-8 в участъка от гр. Пазарджик до с. Мало Конаре	км	ИСУН, Община Пазарджик, АПИ	2	4	50% (частично изпълнен)
1.4.	Изграждане на локални платна на Второкласен път II – 37 в участъка от гр. Пазарджик до разклона за магистрала „Тракия“	км	ИСУН, Община Пазарджик, АПИ	0	6	0% (неизпълнен)
1.5.	Изграждане на локални платна на Главен път I-8 в участъка от гр. Пазарджик до с. Звъничево	км	ИСУН, Община Пазарджик, АПИ	0	4	0% (неизпълнен)
1.6.	Осигурен обществен и частен електротранспорт за населението	бр. население	Община Пазарджик	10 000	15 000	66,7% (частично изпълнен)
Приоритет 2: Привличане на нови инвеститори, запазване и диверсификация на съществуващия бизнес за поетапно преминаване към кръгова икономика						
2.1.	Увеличена готова продукция чрез осигуряване на алтернативни суровини и рециклирани материали, както и повторна употреба на материали и реализиране целите за развитието на кръгова икономика	лв. готова продукция	НСИ	2 949 867	2 000 000	>100% (преизпълнен)
2.2.	Внедрени съвременни технологии за разделно събиране, предварително третиране за повишаване количествата на рециклираните отпадъци и стимулиране на повторна употреба	бр.	ИСУН, Община Пазарджик	1	1	100% (изпълнен)

Междинна оценка на изпълнението на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. за периода 2021-2024 г.

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
2.3.	Проведени кампании, вкл. и с други общини, за повишаване информираността на гражданите и бизнеса за предотвратяване образуването на отпадъци, както и рециклирането им на принципите на кръговата икономика	бр.	Община Пазарджик, НПО, училища	3	5	60% (частично изпълнен)
2.4.	Въведени безотпадни технологии в производствени предприятия	бр. предприятия	ИСУН	1	3	0% (неизпълнен)
2.5.	Стимулиране на инвестиционната активност и промотирането на община Пазарджик като инвестиционна дестинация	бр.	Община Пазарджик	НИ	5	Липсва информация.
Приоритет 3: Поддържане на конкурентноспособна местна икономика, гарантираща стабилна заетост и съвременни публични услуги						
3.1.	Предоставена специализирана информация за специфични възможности на конкретния бизнес, ориентиран предимно към МСП, дигитализация и автоматизация на част от работните процеси, нови технологии, обезпечавачи развитието на кръговата икономика	бр. информации	МСП, Община Пазарджик, НПО	0	4	0% (неизпълнен)
3.2.	Привлечени повече туристи, чрез реализирани проекти по Оперативните програми на ЕС с туристическа насоченост с други общини, членство на общината в туристически организации и сдружения за управление на туристическия район чрез проект за „Популяризиране на туристическите дестинации в общината и съседните общини.“	бр.	Община Пазарджик	0	1 000	0% (неизпълнен)
3.3.	Социализиран исторически обект – селищна могила край с. Юнаците	бр.	Община Пазарджик, МК, ИСУН	0	1	0% (неизпълнен)
3.4.	Реализиране на проекти за изграждане на съпътстваща инфраструктура на археологически и природни обекти и превръщането им в туристически атракции, както и възможности за разширяване на легловата база	бр.	Община Пазарджик	44	40	>100% (преизпълнен)
3.5.	Проведени специализирани обучения за фермерите относно европейските изисквания и стандарти в растениевъдството и животновъдството и условията на реализация на селскостопанската им продукция на пазарите в общността	бр. обучения	ОС „Земеделие и гори“, НС „Съвети в земеделието“	0	7	0% (неизпълнен)

Междинна оценка на изпълнението на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. за периода 2021-2024 г.

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
3.6.	Развито биологично земеделие, възстановено поливно земеделие	дка	Напоителни системи, ИСУН, ОС „Земеделие и гори“	40	90	44,4% (неизпълнен)
3.7.	Разширени площи за биологично земеделие и за трайни насаждения	дка	Община Пазарджик, ОС „Земеделие и гори“	30	90	33,3% (неизпълнен)
3.8.	Подкрепа на дейности и проекти, подобряващи средата за пазарно предлагане на земеделски и животински продукти произведени на територията на Община Пазарджик	бр.	Община Пазарджик	НИ	5	0% (неизпълнен)
Стратегическа цел II: Изграждане и рехабилитация на ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие на града и селата, съхраняваща природните дадености с иновативна индустриална култура						
Приоритет 1: Развитие на инфраструктурата като фактор за стабилизиране на икономическите, социалните и екологични процеси в населените места на общината						
1.1.–1.3.	Въведени интегрирани решения за климатична адаптация на градската среда чрез обновяване на озеленени площи за ограничен обществен достъп (жилищни райони в квартални пространства)	бр.	Община Пазарджик	0	3	0% (неизпълнен)
1.5.	Изграден в гробищен парк колумбарий	бр.	Община Пазарджик	1	1	100% (изпълнен)
1.6.	Изграден приют за безстопанствени кучета	бр.	Община Пазарджик	0	1	0% (неизпълнен)
1.7.	Изградена интегрирана инфраструктура за велосипеден транспорт в града	км	Община Пазарджик, ОДМВР	1	1	100% (изпълнен)
1.8.	Ремонтирани улични и тротоарни настилки в гр. Пазарджик	кв. м	ИСУН, Община Пазарджик	18 000	50 000	36% (неизпълнен)
1.9.	Ремонтирани улични и тротоарни настилки в другите населени места на общината	кв. м	ИСУН, Община Пазарджик	2 000	2 500	80% (изпълнен)

Междинна оценка на изпълнението на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. за периода 2021-2024 г.

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
1.12.	Изградени защитни стени и други съоръжения за борба с ерозията	бр.	ИСУН, Община Пазарджик	0	3	0% (неизпълнен)
1.13.	Осигурена превенция от наводнения и предотвратяване на свлачищни процеси, надграждане на Информационната система за превенция и управление на риска от наводнения, чрез проект: „Почистване на речни корита, отводнителни канали, дерета и други“		ИСУН, Община Пазарджик	0	3	Липсва мерна единица.
1.14.	Приета/актуализирана Програма за намаляване замърсяването на атмосферния въздух, изразяваща се предимно в подкрепа на домакинства, използващи инсталации за твърдо битово гориво, с алтернативни, насърчаващи топлинна енергия от ВЕИ, подобряване енергийните характеристики на сградите и ефективността на сградните инсталации	бр.	ИСУН, Община Пазарджик	1	1	100% (изпълнен)
1.15.	Подобрено качеството на атмосферния въздух на територията на община Пазарджик чрез подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи	%	Община Пазарджик, РИОСВ	0	20	0% (неизпълнен)
1.16.	Брой контролирани замърсители на атмосферния въздух	бр.	Община Пазарджик, РИОСВ	3	5	60% (частично изпълнен)
1.17.	Изградени шумозаглушителни стени и плътни зелени пояси около натоварени транспортни комуникации с проект: „Реализиране на мерки за намаляване на шума в гр. Пазарджик“	бр.	Община Пазарджик, РИОСВ	0	3	0% (неизпълнен)
1.18.	Подобрено природозащитното състояние на природните местообитания и видове, предмет на опазване по НАТУРА 2000, чрез реализация на проекти	бр.	Община Пазарджик, РИОСВ	0	1	0% (неизпълнен)
Приоритет 2: Транспорт и транспортна достъпност						
2.1.	Ремонтиран общински път с. Главиница – с. Алеко Константиново – с. Црънча /III-3706/	км	ИСУН, Община Пазарджик, МРРБ	2	9,73	20,6% (неизпълнен)
2.2.	Ремонтиран общински път с. Мокрище – с. Ляхово – с. Паталеница /III – 3706	км	ИСУН, Община Пазарджик, МРРБ	1	10,7	9,3% (неизпълнен)

Междинна оценка на изпълнението на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. за периода 2021-2024 г.

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
2.3.	Ремонтиран общински път /PAZ1106/ с. Величково – с. Юнаците - /III – 3704	км	ИСУН, Община Пазарджик, МРРБ	1	7,6	13,1% (неизпълнен)
2.4.	Ремонтиран общински път /PAZ1325, с. Три водици – гр. Пазарджик/ - с. Синитово; Граница общ. (Пазарджик – Стамболийски	км	ИСУН, Община Пазарджик, МРРБ	0,2	1,6	12,5% (неизпълнен)
2.5.	Ремонтиран общински път /PAZ 1129/, с. Ляхово – с. Паталеница	км	ИСУН, Община Пазарджик, МРРБ	0	5,0	0% (неизпълнен)
2.6.	Ремонт на общински път /I - 8/ г. Пазарджик – с. Огняново – с. Хаджиево - Граница общ. (Пазарджик –Стамболийски) - /PDV 1325/	км	ИСУН, Община Пазарджик, МРРБ	0	11,5	0% (неизпълнен)
Приоритет 3: Изграждане на нова и реконструкция на съществуващата В и К мрежа и ПСОВ за населените места						
3.1.	Доизградена В и К мрежа на гр. Пазарджик, вкл. и дъждовна канализация	км	Община Пазарджик, „ВиКУ“ ЕООД	0,5	50	1% (неизпълнен)
3.2.	Изградена В и К мрежа и ПСОВ в населените места	бр.	Община Пазарджик, „ВиКУ“ ЕООД	1 ПСОВ;	85 ПСОВ	1,2% (неизпълнен)
		км		7 км	150 км	4,7% (неизпълнен)
Приоритет 4: Повишаване на енергийната ефективност						
4.2.	Въведена системи за интелигентно и интегрирано управление на транспорта	бр.	ИСУН, Община Пазарджик	0	1	0% (неизпълнен)
4.3. – 4.5.	Доизградена Регионална система за управление на отпадъците – разделно събиране и обработка на ТБО, намаляване на хранителните отпадъци и своевременно премахване на нерегламентирани сметища	бр.	Община Пазарджик	1	1	100% (изпълнен)
Приоритет 5: Благоустрояване на селищната среда при щадящо използване на природните ресурси						
5.1.	Изграждане на система за видеонаблюдение на ключови места в населените места на територията на Община Пазарджик	бр.	Община Пазарджик	НИ	1	Липсва информация.

Междинна оценка на изпълнението на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. за периода 2021-2024 г.

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
5.2.	Разработване на Генерален план за организация на движението в гр. Пазарджик, както и План за устойчива градска мобилност. Въвеждане на системи за интелигентно управление на трафика, инфраструктура и оборудване на системи за паркиране; насърчаване на електрическата мобилност, вкл. чрез закупуване на нов и екологично чист подвижен състав за нуждите на градския и междуселищен транспорт и изграждане на инфраструктура – зарядни станции за електроавтомобили	Бр.	Община Пазарджик	НИ	5	Липсва информация.
5.3.	Довършване и надграждане на Регионалната система за управление на отпадъците – разделно събиране и обработка на ТБО. Разработка на Пилотна програма за намаляване на хранителните отпадъци. Своевременно премахване на нерегламентирани сметища на територията на общината	Бр.	Община Пазарджик	НИ	3	Липсва информация.
Стратегическа цел III: Осигуряване на благоприятна среда за развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез ефективни мерки за насърчаване на образованието, масовия спорт и социалното включване						
Приоритет 1: Развитие на социалната сфера чрез подкрепа за услуги за намаляване на безработицата, повишаване на заетостта и доходите						
1.1.	Проведени инициативи и обучения с акцент в ИТ технологиите с проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики	Бр.	ИСУН, Община Пазарджик	0	3	0% (неизпълнен)
1.2.	Проведени обучения на работното място и предоставени услуги за създаване и подкрепа на бизнес-инкубатори, подкрепа, вкл. финансова и взаимодействие с и между различни икономически структури и браншови организации (бр. обучения; бр. услуги)	Бр.	Община Пазарджик	0	2 бр. обучения; 4 бр. услуги	0% (неизпълнен)
1.3.	Участие в национални и международни форуми чрез развитие на системите за присъствено и дистанционно обучение и информационно-комуникационните технологии	бр.	Община Пазарджик, образователни структури	1	5	20% (неизпълнен)

Междинна оценка на изпълнението на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. за периода 2021-2024 г.

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
1.4.	Насърчителни програми за стимулиране на предприемаческата култура и организиране на тематични форуми с различни секторни производители и участие на БТПП, Занаятчийската камара и др. съсловни организации (бр. програми)	бр.	Община Пазарджик, БТПП, НПО	0	4	0% (неизпълнен)
Приоритет 2: Подобряване достъпа до образователните услуги и социална инфраструктура						
2.2. – 2.4.	Въведени мерки за енергийна ефективност на образователния сграден фонд по проекти	бр.	ИСУН, Община Пазарджик	1	3	33,3% (неизпълнен)
Приоритет 3: Интеграция на малцинствата и социално включване						
3.1.	Подобрено образователното ниво на всички деца и ученици, независимо от възрастовите групи и на преподавателския състав, осигурен равен достъп до образователните услуги с акцент на малцинствата и социално слабите граждани. (бр. деца от малцинствата и социално слабите граждани)	бр.	Община Пазарджик, РИО - Пазарджик	2	2	100% (изпълнен)
Приоритет 4: Създаване на условия за масов и професионален спорт чрез рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура						
4.1.	Реновирани/изградени нови спортни съоръжения: бившия стадион „Любен Шкодров“, зали, зони на открито	бр.	ИСУН, Община Пазарджик, МС	3	3	100% (изпълнен)
4.2.	Изградени нови физкултурни салони в ОУ „Проф. И. Батаклиев“, НУ „В. Друмев“ и НУ „В. Левски“, всичките – в гр. Пазарджик	бр.	Община Пазарджик, МС	1	3	33,3% (неизпълнен)
Стратегическа цел IV: Модерно и устойчиво самоуправление за ускоряване социално-икономическото развитие на общината чрез качествено обслужване на бизнеса, на неговите организации и на населението, подобряване на институционалната среда и административния капацитет						
Приоритет 1: Съответствие с плановите процеси на европейско, национално и регионално ниво						
1.2.	Въвеждане на единен софтуер /ГИС/ с пълен набор модули за градско планиране. , както и предоставяне на общодостъпна информация в цифров вид по отношение на градоустройство, комуникации и перспективи за развитие. Развитие на цифровата свързаност и създаване на т.н. „умна“ община	бр.	Община Пазарджик	0	2	0% (неизпълнен)

Междинна оценка на изпълнението на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. за периода 2021-2024 г.

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Междинна стойност (2024 г.)	Целева стойност (2027 г.)	Изпълнение
1.3.	Привлечени инвестиции	лв.	НСИ	1 626 780,4	20 000 000	8,1% (неизпълнен)
Приоритет 2: Обучения на общинската администрация и служители, пряко свързани с правомощията на местната власт за повишаване и непрекъсната актуализация на техните усилия и преквалификация в сферата на местното самоуправление						
2.1.	Оптимизирано административно обслужване при гарантиране на равен достъп до административните услуги, информация и осигуряване на европейски форми за достъп до административните услуги	бр. услуги	Община Пазарджик	20	20	100% (изпълнен)
2.2.	Осигурено административно обслужване по предварително разработени и обявени правила и качество на предоставяните услуги	бр. документи с правила	Община Пазарджик	5	5	100% (изпълнен)
2.3.	Население, ползващо подобреното административно обслужване в различните администрации и осигуряващо надеждна обратна връзка	бр.	Община Пазарджик, Областна управа	50 000	50 000	100% (изпълнен)
2.4.	Въвеждане на система за оценка на нуждите от обучения на общинските служители	бр.	Община Пазарджик	0	1	0% (неизпълнен)
2.6.	Проведени специализирани обучения на общинската администрация, свързани с новите ИТ технологии и Е-управление	бр. обучения	Община Пазарджик	3	3	100% (изпълнен)
2.7.	Програми за „стажуване“ в различни ВУЗ-ове и обучителни центрове, вкл. и дистанционни	бр.	Община Пазарджик, МТСП	0	3	0% (неизпълнен)

Източник: ПИРО Пазарджик 2021-2027 г., Общинска администрация, ИСУН, собствени изчисления

5. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

Индикативният и реално използваният финансов ресурс се използват при изготвяне на оценката на ефективността и ефикасността. По този начин може да бъдат направени обосновани изводи за изпълнението на плана до момента и да се дадат препоръки за обновяване на стратегическата част на ПИРО. За целите на проучването е събрана информация от различни източници – териториални звена, регионални дирекции, общинска администрация и информационна система за управление и наблюдение 2020 (ИСУН). В оценката се включват проекти, чието изпълнение има по-продължителен характер (започнали в миналия период и приключени в отчетния и такива, които са започнали в отчетния и ще приключат след него, като са отчетени само средствата, усвоени в периода 2021-2024 г.).

В Приложение №1 са представени всички проектни дейности, осъществени в периода 2021-2024 г. В таблицата са включени следните елементи:

- Стратегически цели и изпълнени/изпълняващи се проекти/дейности към тях;
- Индикативна стойност на проектите/дейностите и реално изплатени средства;
- Източник на финансиране и разпределение на финансовите средства;
- Период на изпълнение на проекта/инициативата.

Направени са изчисления на индикативните и реално изплатените суми по стратегически цели и е отчетено общото изпълнение на всички проекти/дейности, както и разчет на общата стойност по източниците на финансиране.

5.1. Анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси

Неразделна част от междинната оценка на ПИРО е анализът на изразходваните финансови ресурси. Той спомага при проверката на това колко оптимално се разходват наличните средства.

Най-високо изпълнение спрямо индикативното се наблюдава при Стратегическа цел III, където реализираните финансови средства са малко над 2 пъти повече от заложените в ПИРО за тази стратегическа цел. От друга страна, не може да бъде отчетена финансовата реализация на Стратегическа цел IV, тъй като не са предварително планирани средства за реализацията на проекти, допринасящи за постигане на целта.

В настоящата част от доклада са представени резултатите от анализа на изпълнението на стратегическите цели по години.

Стратегическа цел I

През 2021 г. са изплатени средства за реализацията на 83 проекта/дейности, в размер на **11 459 313,80 лв.** Финансирани са проекти като „Реализиране на предприемаческа идея“, „Подобряване на производствения капацитет“ и „Насърчаване на предприемачеството“. Част от проектите са свързани с осигуряването на подкрепа за земеделските производители – такива проекти са „Стартова помощ за създаване и развитие на стопанства на млад фермер“ и „Устойчиво развитие на малко земеделско стопанство в района на област Пазарджик“. Направени са инвестиции в Регионален исторически музей, гр. Пазарджик и в различни предприятия в общината. Доизплатени са проекти, които са стартирали преди влизането в действие на ПИРО.

През втората година са изплатени най-малко средства за стратегическата цел - **4 558 557,36 лв.** Финансирани са 47 проекта/дейности. Доизплатени са средства по проектите за устойчиво развитие на малките земеделски стопанства, както и за подобряване на производствения


капацитет. Реализирани са проекти за възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност, както и проекти свързани с осигуряването на стартова помощ за създаване и развитие на стопанството на млади фермери. Реализирани са и различни проекти, чрез които се подкрепя развитието на икономиката в община Пазарджик.

През 2023 г. е подкрепено изпълнението на 64 проекта/дейности, като изплатената сума за тях е в размер на **10 498 439,63 лв.** Започнато е изпълнението на проект „Изграждане на православен параклис „Св. Никола“, с. Мало Конаре“ и са финансирани проекти за развитие на туризма. Продължава изпълнението на проекти за развитие на земеделските стопанства и различни предприятия, изпълняващи дейността си на територията на общината. В хода са проекти като „Технологична модернизация в предприятието“ и „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

През последната година финансовата реализация на стратегическата цел е най-висока - **29 051 120,41 лв.**, като това са повече от половината средства усвоени за реализацията на стратегическата цел. Подкрепена е реализацията на 94 проекта/дейности. Продължава предоставянето на подкрепа за земеделските производители и предприятия. Започнал е проект „Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“. Финансирани са получили проекти като „Нови възможности за туризма на община Пазарджик“ и „Бизнесът на Пазарджик в дигиталния свят“.

В периода 2021-2024 г. са стартирали 93 проекта/дейности, които все още нямат финансиране, но тяхното изпълнение продължава и след 2024 г. **Фигура 13** показва разпределението на финансовото изпълнение на Стратегическа цел I (лява скала) по години и общата финансова реализация с натрупване (дясна скала).

Фигура 13. Процент на изпълнение и изплатени средства по Стратегическа цел I за периода 2021-2024 г.

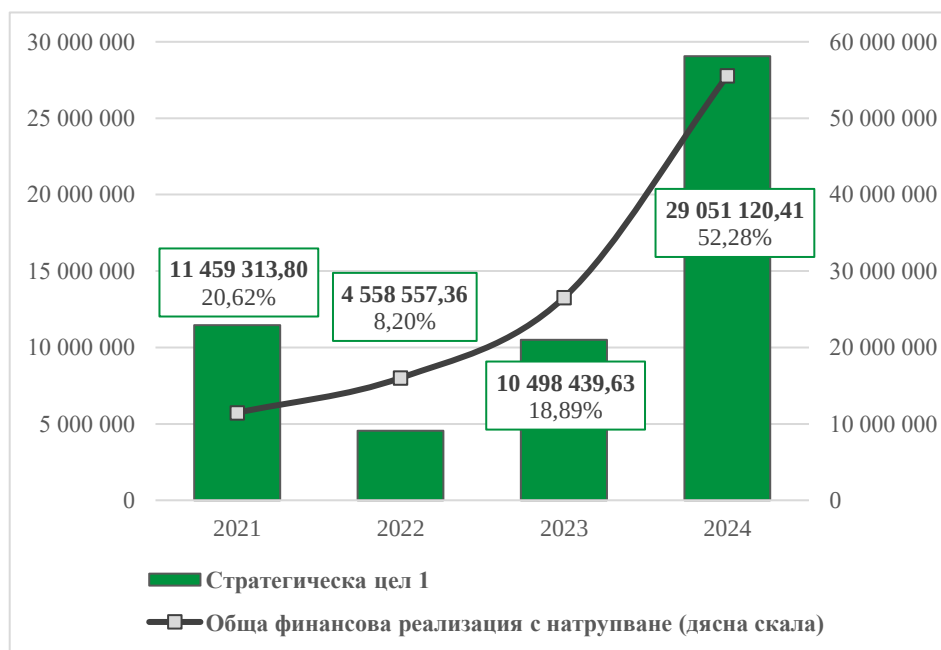

Източник: Община Пазарджик, ИСУН, собствени изчисления

Стратегическа цел II

През първата година е подкрепена реализацията на 147 проекта/дейности. Изплатените средства са в размер на **12 570 191 лв.** Направени са инвестиции във ВиК мрежата и в

транспортната мрежа в общината. Реализирани са проекти, свързани с управлението на отпадъци и отпадъчни води, като *„Рекултивация и закриване на старото депо, Пазарджик“*, *„Изграждане на депо за предварително третиране на битови отпадъци, Пазарджик“* и *„Разширение на ПСОВ (азот и фосфор), Пазарджик“*. Започнало е изпълнението на проект *„Рехабилитация и модернизация на системите за външно осветление на главни пътни артерии, общ. Пазарджик“* и са изплатени средства по двата проекта *„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик“*. Повишена е енергийна Финансирани са множество проекти, насочени към подобряване на материално техническата база в образователните институции, чрез инвестиции в оборудване и ремонтни дейности. През годината са ремонтирани и новоизградени множество детски съоръжения за игра.

През втората отчетна година са изплатени **9 188 485 лв.** и е подкрепена реализацията на 131 проекта/дейности. Продължава изпълнението на проекти, свързани с подобряване и развитието на инфраструктурата в общината. Извършени са ремонти на улици – ул. „Стефан Караджа“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Кочо Честименски“ и други. Продължава изграждането на система за видеонаблюдение на ключови места в общината. Благоустроени са публични пространства чрез закупуване на необходимия инвентар и изпълняване на съответните дейности. Подкрепени са институциите в образователната сфера.


Третата отчетна година се характеризира със 142 проекта/дейности, а изплатените средства за реализацията им е **9 028 781,81 лв.** Започнало е изпълнението на *„Паркоустройствен проект за обществена зелена площ „Градините на света“, част от Парк-остров „Свобода“, по плана на гр. Пазарджик“*. Продължава реализацията на проекти и дейности за ремонт на улици у ВиК мрежата. Финансират се проекти, свързани с подобряване на средата в училищата и е започнало изпълнението на проект за изграждане на детска градина в с. Главиница. През годината са изплатени средства за обновяване сградата на няколко читалища на територията на общината.

През последната отчетна година са инвестирани средства в размер на **17 346 837,32 лв.** Реализирани са дейности по най-голям брой проекти – 208. Финансирано е изпълнението на проект *„Доизграждане на канализационна и реконструкция на водопроводната мрежа - етап III на с. Ивайло, община Пазарджик“* и *„Реконструкция на мост-канал и дюкер под р. Луда Яна, община Пазарджик, област Пазарджик, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Тополница“*. Стартира изпълнението на проект *„Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик“*, финансиран от ОПОС. Подобрена е енергийната ефективност и е обезпечена материално-техническата база в училищата.

В периода 2021-2024 г. започва изпълнението на 12 проекта/дейности, за които към края на отчетния период не са изплатени средства, но периодът им на действие продължава и след 2024 г.

На **фигура 14** е визуализирано разпределението на финансовото изпълнение на Стратегическа цел II (лява скала) по години и общата финансова реализация с натрупване (дясна скала).

Фигура 14. Процент на изпълнение и изплатени средства по Стратегическа цел II за периода 2021-2024 г.

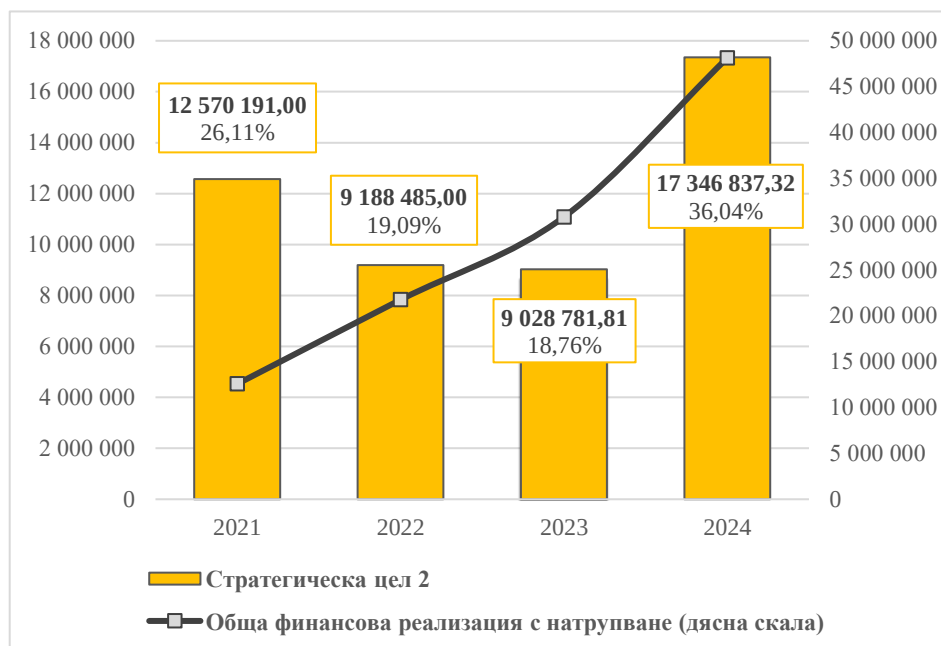

Източник: Община Пазарджик, ИСУН, собствени изчисления

Стратегическа цел III

Началната година на действие на ПИРО се характеризира с финансирани 58 проекта/дейности на стойност **5 830 263,03 лв.** С инвестициите се изпълняват проекти, свързани с развитието на социалната сфера и спорта в общината. Изпълнен е проект „Услуги в дома“ и е започнало финансирането на проекти „Патронажна грижа + в община Пазарджик“ и „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пазарджик“. Закупен е инвентар за спортните зали и са обособени зони със спортни съоръжения. Изплатени са средства за провеждането на различни програми за развитие и обучение.

През 2022 г. са подкрепени 49 проекта/дейности. Сумата изплатена от различни източници на финансиране е **5 021 719,09 лв.** Реализира се проект „Разкриване на социална услуга „Приют за пълнолетни лица в Община Пазарджик“ и се изплаща средства за проект „Разкриване на социална услуга „Център за работа с деца на улицата в Община Пазарджик“. Започва изпълнението на проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“. Продължава изпълнението на различни проекти и дейности, подобряващи социалната сфера. Закупени са спортни съоръжения и инвентар за спортните зали, стадиони и образователни институции в общината.

През третата отчетна година са реализирани 63 проекта/дейности, а изплатената сума за тях е **4 276 409,95 лв.** Повишена е енергийната ефективност в множество образователни институции, закупен е инвентар за звената, предоставящи социални услуги, както и за спортните зали и площадки. Стартира проект „Грижа в дома в община Пазарджик“ и „Топъл обяд в община Пазарджик“. Започва финансирането на проект „Изграждане физкултурен салон в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик“, който е част от Програмата за реализация на ПИРО Пазарджик.


Най-голям финансов ресурс е разходван през последната отчетна година, който е в размер на **8 684 194,13 лв.** Реализираните проекти/дейности са 85. Започва изпълнението на редица проекти, свързани с изграждане на училищна STEM среда и ВОКС на територията на училищата в община Пазарджик. Стартира изпълнението на проекти за изграждане на

физкултурни салони за нуждата на няколко училища от общинската училищна мрежа. Продължава реализацията на проекти за повишаване на енергийната ефективност. Придобит е инвентар за различни спортни зони. Изпълняват се проекти за активно приобщаване в пазара на труда и повишаване на заетостта.

В периода 2021-2024 г. са сключени договори за 25 проекта/дейности, които не са финансирани до края на 2024 г., но техният период на изпълнение продължава и след отчетния период.

На **фигура 15** е представено графично разпределението на реално изплатените средства по години (лява скала) и общата финансова реализация с натрупване (дясна скала) за Стратегическа цел III.

Фигура 15. Процент на изпълнение и изплатени средства по Стратегическа цел III за периода 2021-2024 г.

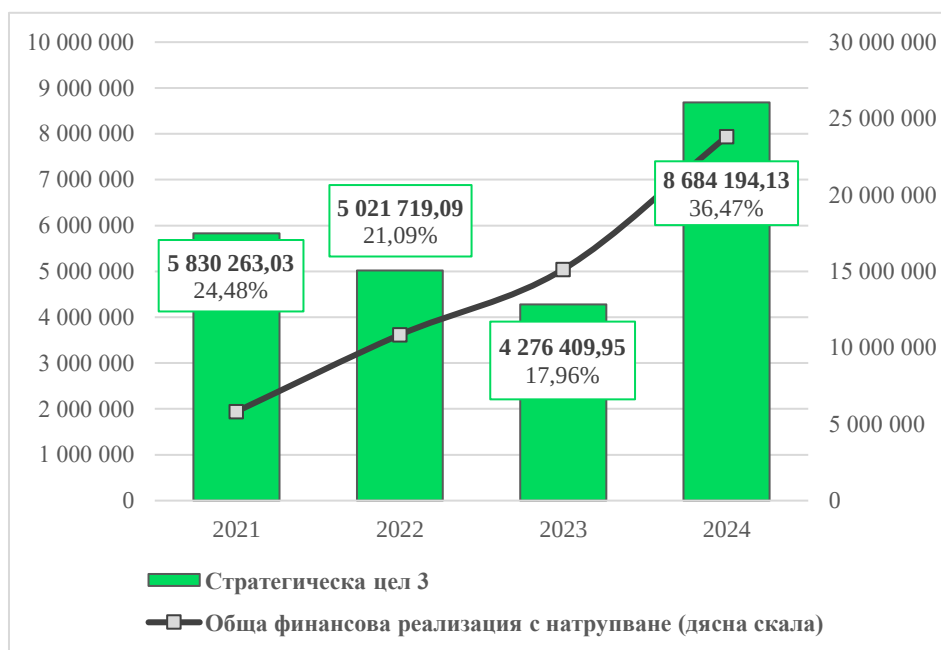

Източник: Община Пазарджик, ИСУН, собствени изчисления

Стратегическа цел IV

През първата година са реализирани дейности по 7 проекта/дейности. Разходван е финансов ресурс в размер на **126 984,65 лв.** Доизплатени са средства за разработването на Общ устройствен план и са закупени компютри за различни административни звена. Придобит е автомобил.


През 2022 г. са изплатени средства за изпълнението на 7 проекти/дейности на обща стойност **15 156 лв.** Закупени са компютърни конфигурации.

Третата година от действие на ПИРО се характеризира с реално финансово изпълнение в размер на **57 442,73 лв.** и са извършени дейности по 7 проекти/дейности. Започва изпълнението на проект „Повишаване капацитета и техническата обезпеченост на служителите на Община Пазарджик отговорни за управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции за програмен период 2021-2027 г.“. Отново са направени инвестиции в компютри.

През последната отчетна година са разходвани средства в размер на **129 352,93 лв.** и са извършени дейности по 9 проекта/дейности. Разработен е идеен проект с обследване за реконструкция фасадата на Община Пазарджик и са инвестирани средства в технически

устройства. **Фигура 16** показва реално изплатените средства по години (лява скала) и общата финансова реализация с натрупване (дясна скала) за Стратегическа цел IV.

Фигура 16. Процент на изпълнение и изплатени средства по Стратегическа цел IV за периода 2021-2024 г.

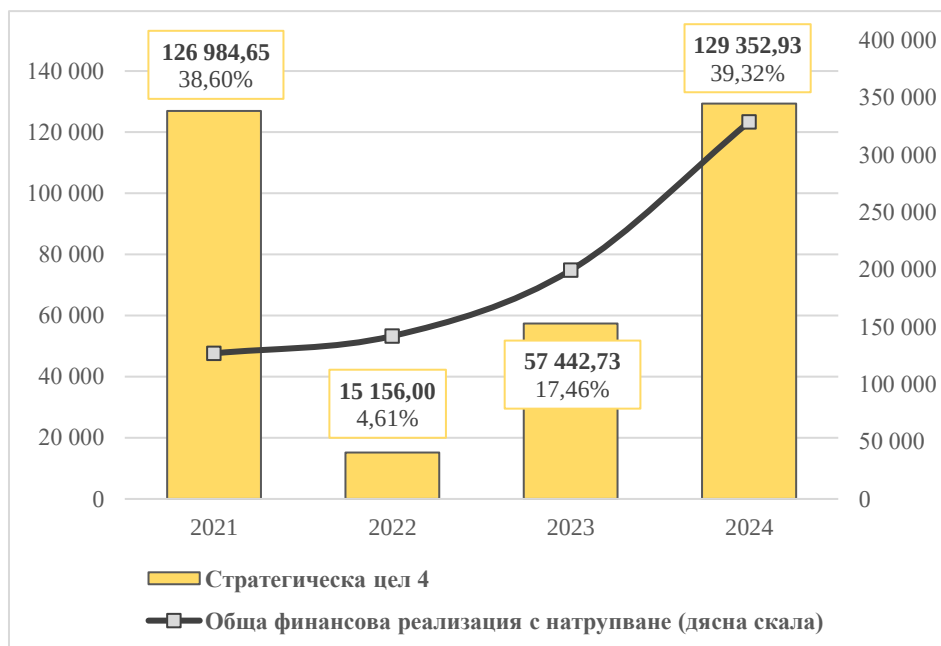

Източник: Община Пазарджик, ИСУН, собствени изчисления

През първата година от програмен период 2021-2027 г. са изплатени средства в размер на **36 066 917,46 лв.** или 26,6% от всички изплатени средства. Подкрепена е реализацията на 374 проекта/дейности (включително Covid-19 проекти). Най-голям принос имат инвестициите от европейските фондове.


През втората година от действие на ПИРО са усвоени **20 233 917,45 лв.** Делът им е 15% от всички усвоени средства. Финансирани са 263 проекта/дейности (включително Covid-19 проекти). Най-много са средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

През третата година от периода са изразходвани средства в размер на **23 861 074,12 лв.** Те представляват 17,6% от всички изхарчени средства. Реализирани са 276 проекта/дейности. Европейските фондове имат най-голям принос.

През четвъртата година от действие на стратегическия документ са изразходвани **55 211 504,79 лв.**, чийто дял спрямо всички изразходвани средства е 40,8%. Финансирана е реализацията на 396 проекта/дейности. Средствата са предимно от трансферите от европейските фондове.

В община Пазарджик са сключени договори за 130 проекта/дейности, които към момента на изготвяне на междинната оценка нямат получено финансиране, но техният период на реализация продължава и след 31.12.2024 г. **Фигура 17** показва разпределението на финансовото изпълнение на заложените стратегически цели по години за периода 2021-2024 г.

Фигура 17. Общо финансово изпълнение на заложените приоритети за периода 2021-2024 г.

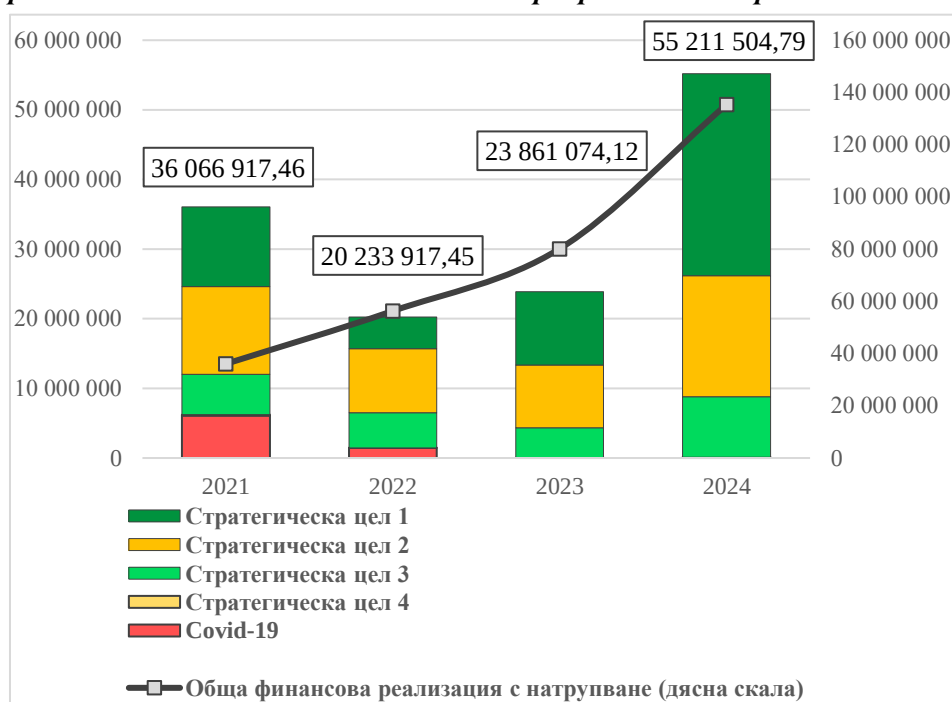


Източник: Община Пазарджик, ИСУН, собствени изчисления

5.2. Финансова ефективност и ефикасност по отношение на планираната програма за реализация на ПИРО

При изготвяне на ПИРО се определят компонентите на програмата за реализация. Част от тези компоненти е и индикативната финансова таблица. Тя носи информация за предвидените средства, които ще бъдат необходими за реализиране на проекти, които спадат към обособените стратегически цели и приоритети. Индикативната финансова таблица планира ресурсите както по стратегически цели и приоритети, така и по източници на финансиране. Общият заложен финансов ресурс за изпълнението на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. е **527 088 000 лв.**

Над 76,7% от планирания бюджет за реализация на ПИРО е предвиден за изпълнението на Стратегическа цел II. Значително по-нисък е индикативния бюджет за Стратегическа цел I – около 21,2% от планирания. За Стратегическа цел III са предвидени само 2,2% от индикативния бюджет, докато за Стратегическа цел IV не са планирани предварително средства. **Фигура 18** показва разпределението на индикативния бюджет между стратегическите цели.


Фигура 18. Индикативно финансово разпределение по приоритети в ПИРО Пазарджик за периода 2021-2027 г. (в лева)

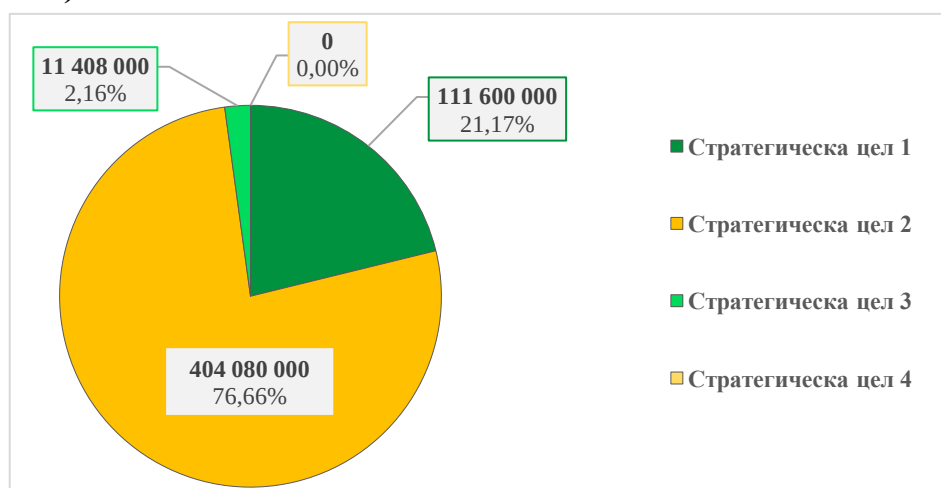

Източник: ПИРО Пазарджик 2021-2027 г.

Различна е степента на изпълнение на планирания бюджет до средата на програмния период. Около 41,1% от изплатените средства са за проекти, допринасящи за изпълнението на Стратегическа цел I. Малко по-нисък е дялът на изплатените средства за Стратегическа цел II – 35,6%. Финансовата реализация на Стратегическа цел III е 17,6%, а на Стратегическа цел IV – едва 0,2%. Инвестициите в проекти, свързани с Covid-19, са 5,6% от общата изплатена сума за реализацията на ПИРО Пазарджик. **Съотношението между индикативното в стратегическия документ и реално изпълненото в периода 2021 - 2024 г. е 25,7%. Фигура 19** представя реално изплатените средства по стратегически цели.

Фигура 19. Разпределение на реално изплатените средства по стратегически цели и Covid-19 в ПИРО Пазарджик за периода 2021-2024 г. (в лева)

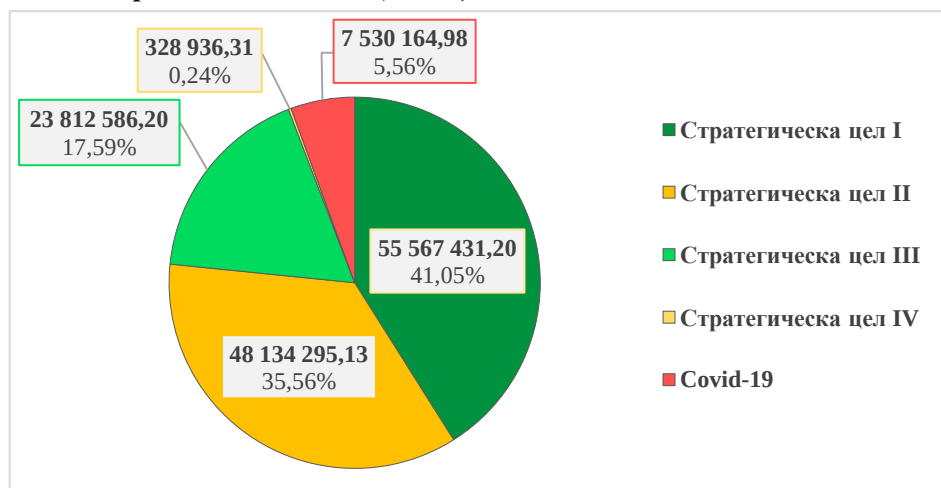

Източник: Община Пазарджик, ИСУН, собствени изчисления

Пет са основните източници на финансиране, от които произтичат финансовите потоци за изпълнение на проектите и дейностите, включени в Програмата за реализация. Средствата се осигуряват по линия на общинския и централния бюджет, европейските структурни и инвестиционни фондове, както и от частни и други финансиращи източници, като последните два са обединени съгласно актуалните изисквания за извършване на междинна оценка на ПИРО.

От аналитична гледна точка е целесъобразно да се извърши съпоставка между планираните индикативни средства и реално изразходваните такива, според източника на финансиране. Това позволява да се оцени доколко изпълнението на ПИРО се придържа към заложените финансови рамки и доколко те са били реалистично определени, така че при необходимост да бъдат направени корекции.

Съществен пропуск при изготвянето на ПИРО Пазарджик е липсата на финансово разпределение на бюджета по източници на финансиране. По този начин е невъзможно да се оцени напредъка и да се проследи в каква степен предварително заложения принос на всеки отделен източник отговаря на действителното изпълнение.

В рамките на междинната оценка е направен преглед на реално изплатените средства по източници на финансиране, с цел да се установи в каква степен всеки от тях допринася за изпълнението на проектите и дейностите, както и за постигането на целите, приоритетите и мерките, заложен в ПИРО.

Общински бюджет

Общинският бюджет е допринесъл за реализацията на 285 проекта/дейности, за които са изплатени **7 584 205 лв.** Най-много средства от общинския бюджет и най-много проекти са осъществени по Стратегическа цел II.

Фондове на ЕС

Европейските фондове подпомагат изпълнението на общо 552 проекта и дейности. За периода 2021–2024 г. усвоените средства възлизат на **66 776 161,97 лв.**, повече от всеки друг финансов източник. Най-значителен дял от финансирането е насочен към реализацията на Стратегическа цел I. Проектите и дейностите се финансират чрез програми като ПРСР, ОПРЧР, ПРЧР, ПХОМП, ОПМДР, ПОС, НПВУ и други. Очаква се през следващите години процентът на изпълнение да се увеличи, тъй като част от проектите, стартирали в периода 2021–2024 г., все още не са напълно изплатени, а други предстои да започнат след 31.12.2024 г.

Централен бюджет


С финансиране от централния бюджет е подкрепено изпълнението на 496 проекта/дейности. Средствата са в размер на **27 676 410 лв.** Най-висок е дялът на усвоените средства за Стратегическа цел II. През последната отчетна година са подписани споразумения за изпълнението на проекти, които ще бъдат финансирани в остатъка от програмния период.

Други източници, включително частни инвестиции

За изпълнението на ПИРО е предвидено разходване на средства от други източници, включително и частни инвестиции. Реално изплатените средства са в размер на **33 336 636,85 лв.** и е подкрепена реализацията на 192 проекта/дейности. Най-значителен обем от средствата е насочен към Стратегическа цел I, тъй като значителна част от проектите, финансирани чрез фондовете на Европейския съюз, разполагат с допълващо съфинансиране от страна на бенефициентите.

Фигура 20 представя съотношението на реалното разпределение на финансирането по източници.

Фигура 20. Реално разпределение по източници на финансиране за периода 2021-2024 г. (в лева)

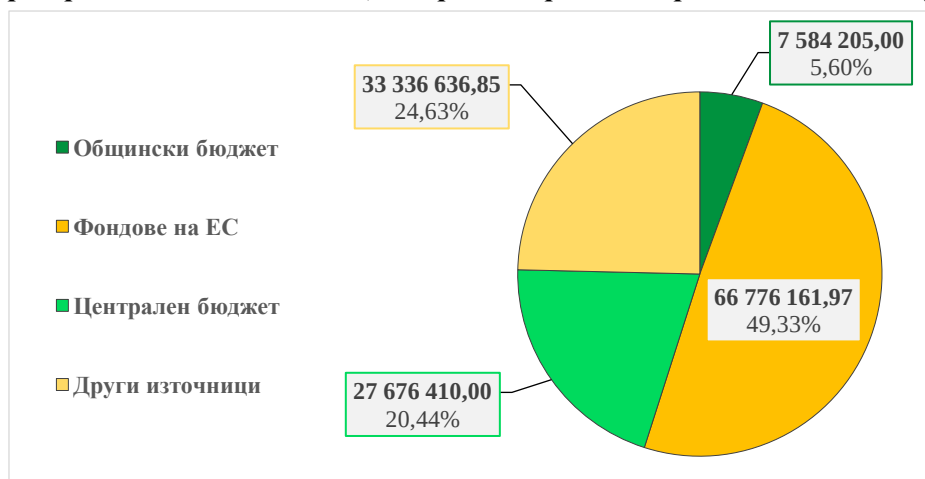

Източник: Община Пазарджик, ПИРО Пазарджик 2021-2027 г., ИСУН, собствени изчисления

6. ОЦЕНКА НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Планът за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на община Пазарджик е стратегически планов документ, който обхваща периода 2023-2030 г. Документът е приет на 27.07.2023 г. от Общински съвет Пазарджик. Планът за устойчива градска мобилност, като стратегически документ на град Пазарджик, е предназначен да подобри безопасността и сигурността на всички участници в движението. Основна цел на плана за устойчива градска мобилност е осигуряването на по-добра транспортна достъпност до град Пазарджик, укрепване на териториалната свързаност между града и съседните населени места и местата за туризъм и отдих, както и формиране на устойчиви транспортни връзки със съседни изявени полюси на развитието в региона.

Визията на Плана за устойчива градска мобилност на община Пазарджик се основава на анализ на настоящата ситуация и цели постигане на стратегическите цели на европейските и националните политики в областта на транспорта и мобилността. Тя е с дългосрочен характер и надхвърля рамките на самия план.

„Подобряване на качеството на живот на хората на територията на община Пазарджик, чрез постигане/подобряване на степента на екологосъобразна мобилност с осигурена достъпност, сигурност и безопасност на придвижване в чиста околна среда.“

Идентифицирани са три основни цели на ПУГМ Пазарджик, които да бъдат постигнати чрез прилагането на редица мерки, определени в стратегическия документ.

Постигане на устойчива транспортна свързаност и интегрираност

Постигане на екологосъобразна мобилност

Разработване и на внедряване на ИТС

Главните цели, определени в ПУГМ, се разделят по приоритети и мерки. Предвидените мерки са разпределени според основните направления на градската мобилност, като някои мерки засягат повече от едно направление/приоритет. Обособени са следните 9 направления:

Улична и пътна мрежа на град Пазарджик и между околните населени места	Екологичен, обществен, градски и междуселищен транспорт
Пешеходно движение	Велосипедно движение
Паркиране	Градска логистика
Интелигентни транспортни системи	Безопасна градска мобилност
Интегриран териториален подход	

Приоритетите, заложили в ПУГМ Пазарджик, са изградени въз основа на идентифицираната при анализа текуща ситуация по отношение на мобилността в общинския център. Предвидените мерки и инициативи кореспондират с ПИРО и доразвиват **Стратегическа цел II: „Изграждане и рехабилитация на ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие на града и селата, съхраняваща природните дадености с иновативна индустриална култура“**, Пети основен приоритет: „Благоустройство на селищната среда при щадящо използване на природните ресурси“, Мярка 5.2 „Разработване на Генерален план за организация на движението в гр. Пазарджик, както и План за устойчива градска мобилност. Въвеждане на системи за интелигентно управление на трафика, инфраструктура и

оборудване на системи за паркиране; насърчаване на електрическата мобилност, вкл. чрез закупуване на нов и екологично чист подвижен състав за нуждите на градския и междуселищен транспорт и изграждане на инфраструктура – зарядни станции за електроавтомобили“ на Плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) Пазарджик за периода 2021-2027 г. При определянето на приоритетите и последващите действия и инициативи, освен чрез анализа на настоящото състояние на градската мобилност и установените проблеми, както и резултатите от проведените анкети, са формулирани основните предизвикателства пред градската мобилност в Пазарджик, които градът трябва да преодолее. Обособени са пет приоритета, които са:



Приоритет 1: Подобряване на движението и достъпа до централната градска част и условията за паркиране



Приоритет 2: Подобряване на системата на обществения транспорт чрез внедряване на ниско емисионни превозни средства



Приоритет 3: Повишаване на пътната безопасност и условията за пешеходното придвижване в града



Приоритет 4: Развитие на алтернативни начини на придвижвания и изграждане на велоалеи



Приоритет 5: Внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на мобилността

В стратегическия документ е посочена необходимостта от извършване на периодични наблюдения и оценки, за да бъде отчетен напредъкът по изпълнението му. Осъществяването на текущото наблюдение ще подпомогне процеса на идентифициране на рискове и съответно да способства за вземане на адекватни мерки за тяхното преодоляване. Редовният преглед на ПУГМ е важен с цел поддържане на актуалността му и постигане на максимална ефективност. Възможно е извършването на актуализации на документа най-малко веднъж на пет години. Актуализирането следва да обхваща промени със съществено значение, които не противоречат на визията и общите цели на документа. Планът за устойчива градска мобилност 2023-2030 г. се обвързва с Плана за интегрирано развитие на община Пазарджик 2021-2027 г., и ето защо първата оценка на ПУГМ съвпада с момента на изготвяне на междинната оценка на ПИРО.

Системата за мониторинг и оценка на изпълнението на ПУГМ има за цел да осигури регулярно събиране, анализ и използване на информация, която подпомага управлението и вземането на решения. Чрез нея се гарантира ефективното и ефикасно прилагане на плана.

В ПУГМ Пазарджик са обособени индикатори, чрез които да се следи прогреса по изпълнението на заложените приоритети. Индикаторите имат съществена роля за оценка на напредъка при изпълнението на настоящата стратегия. В долната таблица са представени техните основни характеристики, позволяващи извършване на тяхното измерване за целите на оценка на постигнатия напредък в изпълнение на целите. Както бе отбелязано, напредъкът в изпълнението на ПУГМ ще се отчита на ниво реализация на отделна мярка/дейност/проект.

Индикаторите за изпълнение имат заложена целева стойност, която да бъде постигната до 2030 г. **Таблица 14** представя постигнатия напредък към 31.12.2024 г.

Таблица 14. Индикатори за наблюдение и оценка, заложен в ПУГМ Пазарджик 2023-2030 г. и тяхното изпълнение към 31.12.2024 г.

Направление	№	Приоритет	№	Мярка	№	Проект	Индикатори за изпълнение			
							Индикатор	Мярка	Целева стойност	Междинна стойност (2024 г.)
Улична и пътна мрежа на град Пазарджик и между околните населени места										
Улична и пътна мрежа на град Пазарджик и между околните населени места	1	Подобряване на движението и достъпа до централната градска част и условията за паркиране	1.1	Изграждане и/или обновяване и/или реконструкция на уличната мрежа и съоръженията към нея	1.1.1	Ремонти на обекти на пътна инфраструктура;	отремонтирани участъци	кв. м.	10 000	4 200
			1.2	Изграждане и/или обновяване на транспортните комуникации, техническата и телекомуникационна инфраструктура и подобряване достъпността и технологичната осигуреност на съществуващата индустриална зона	1.2.1	Изграждане на нови обходни пътища	изградени нови обходни пътища	бр.	3	0
					1.2.2	Изграждане на ново мостово съоръжение над река Марица за връзка на Южен обходен път част от Главен път I-8	изградено ново мостово съоръжение	бр.	1	0
					1.2.3	Изграждане на локални платна	изградени нови локални платна	бр.	6	0
			1.3	Обновяване на градската жизнена среда, модернизация на транспортната инфраструктура /автогари, спирки и депа на обществения транспорт	1.3	1. Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Болницата“, гр. Пазарджик“. 2. Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в нереновираната част от квартал „Марица“, гр. Пазарджик“. 3. Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Ябълките“, гр. Пазарджик. 4. Реновиране на съществуващи и изграждане на нови спортни съоръжения: бившия стадион „Любен Шкодров“, зали, зони на открито“. 5. Изграждане на нов гробищен парк с крематориум и колумбарий	обновени обекти от градската среда	бр.	10	1

Направление	№	Приоритет	№	Мярка	№	Проект	Индикатори за изпълнение			
							Индикатор	Мярка	Целева стойност	Междинна стойност (2024 г.)
Улична и пътна мрежа между град Пазарджик околните населени места	1	Подобряване на движението и достъпа до централната градска част и условията за паркиране	1.4	Изграждане на нови паркинги	1.4	1. Изграждане на многоетажен паркинг, УПИ IV кв.358 гр. Пазарджик /паркинът зад Музея/; 2. Изграждане на подземен паркинг УПИ I /Градски пазар/ кв.1254 по плана на гр. Пазарджик.	изградени нови паркинги	бр.	2	0
		Подобряване на системата на обществения транспорт чрез внедряване на ниско емисионни превозни средства	1.5	Подобряване на транспортната свързаност в ареалите на икономическа и социална активност около град Пазарджик	1.5	Подобряване на техническото състояние и експлоатационните качества на транспортната инфраструктура между град Пазарджик и околните населени места	ремонтирани общински пътища	бр.	6	0
Екологичен, обществен, градски и междуселищен транспорт	2	Подобряване на системата на обществения транспорт чрез внедряване на ниско емисионни превозни средства	1.6	Подобряване на достъпа до недвижими културни ценности и събития, места за рекреация и туризъм, туристически обекти	1.6	1. Изграждане на велоалея до „Парк-остров Свобода“. 2. Пускане на линия от туристически електрически автобус от Центъра на Пазарджик до туристически обекти и забележителности; 3. Направа на сертифицирани и обозначени велосипедни маршрути 4. Изграждане на споделени пешеходни и велоалеи по поречието на река Марица	изпълнение на проекти и инициативи	бр.	5	0
Екологичен, обществен, градски и междуселищен транспорт										
Екологичен, обществен, градски и междуселищен транспорт	2	Подобряване на системата на обществения транспорт чрез внедряване на ниско емисионни превозни средства	2.1	Интегриране на нулевоемисионни превозни средства на обществения транспорт в транспортната система на града	2.1.1	Модернизация на тролейбусния транспорт	закупени нови тролейбуси	бр.	10	0

Направление	№	Приоритет	№	Мярка	№	Проект	Индикатори за изпълнение			
							Индикатор	Мярка	Целева стойност	Междинна стойност (2024 г.)
Екологичен, обществен, градски и междуселищен транспорт	2	Подобряване на системата на общественя транспорт чрез внедряване на ниско емисионни превозни средства	2.1	Интегриране на нулевоемисионни превозни средства на общественя транспорт в транспортната система на града		Модернизация на тролейбусния транспорт	Рехабилитирани участъци от въздушната контактна мрежа и ретрофит / разширение на ТИС;	бр.	10	0
							изграждане на покривни фотоволтаични инсталации за производство на ел. енергия за захранване на ТИС.	бр.	2	0
				Интегриране на нулевоемисионни превозни средства на общественя транспорт в транспортната система на града	2.1.2	Поетапна подмяна на автопарка на масовия градски транспорт и междуселищните превози	закупуване на нови електробуси за градски и междуселищен транспорт	бр.	20	0
					2.1.2	Поетапна подмяна на автопарка на масовия градски транспорт и междуселищните превози	закупуване на бързи и бавни станции за зареждане на електробуси	бр.	24	0
			2.2	Разкриване на нови маршрутни линии на електротранспорта, вкл. изграждане на нови спирки	2.2	Разкриване на нови маршрутни линии на електротранспорта, вкл. изграждане на нови спирки	обновени спирки на ОГТ	бр.	10	10
							нови маршрутни линии	бр.	1	0

Направление	№	Приоритет	№	Мярка	№	Проект	Индикатори за изпълнение			
							Индикатор	Мярка	Целева стойност	Междинна стойност (2024 г.)
Екологичен, обществен, градски и междуселищен транспорт	2	Подобряване на системата на обществен транспорт чрез внедряване на ниско емисионни превозни средства	2.3	Преминаване към икономичен и щадящ околната среда немасов обществен транспорт	2.3.1	Подмяна на автопарка на фирми, извършващи ученически и служебни превози, вкл. автобуси/микробуси за „случаен превоз“ с електробуси или други екобуси, като такива на природен газ (CNG);	нови нулево/ниско емисионни автобуси	бр.	20	0
			2.4	Утвърждаване на обществен транспорт като ефективен, екологосъобразен и предпочитан транспорт в града	2.4.1	Въвеждане на мерки за даване на преференции за електротаксита, с оглед увеличаване на техния брой;	въведени в експлоатация електротаксита	бр.	5	0
					2.4.2	Провеждане на рекламна и мотивационна кампания сред жителите за ползите от преимущественото ползване на обществен транспорт;	проведени кампании	бр.	1	0
					2.4.3	Преговори с бизнеса и търговските обекти за лансиране на безплатни линии за техните клиенти и/или работници и за закупуване на карти за градски транспорт за служителите на преференциални цени.	закупени карти на преференциални цени	бр.	30	0
Пешеходно движение										
Пешеходно движение	3	Повишаване на пътната безопасност и условията за пешеходно придвижване в града	3.1	Създаване на зелени, достъпни и активни пешеходни зони и маршрут	3.1.1	Увеличаване на пешеходните пространства/зони в града.	пешеходните пространства/зони в града.	кв. м.	500	0
			3.2	Подобряване на безопасността на пешеходното движение	3.2.1	Въвеждане на транспортно-успокоената зона с ограничение на скоростта до 30 км/ч в цялата централна градска част	въведена „ЗОНА 30 км/ч“	бр.	1	0
					3.2.2	Подобряване на възможностите за безопасно пешеходно пресичане на нивото на улиците, повдигане и осветяване и сигнализиране на пешеходните пътеки	безопасни пешеходни пътеки	бр.	10	10

Направление	№	Приоритет	№	Мярка	№	Проект	Индикатори за изпълнение			
							Индикатор	Мярка	Целева стойност	Междинна стойност (2024 г.)
Пешеходно движение	3	Повишаване на пътната безопасност и условията за пешеходно придвижване в града	3.2	Пешеходно движение	3.2.3	Подобряване на настилките и поддръжката на улиците и тротоарите, премахване на препятствия пред пешеходните потоци;	подобрили настилки на улици и тротоари;	кв.м.	800	800
					3.2.4	Подобряване на маркировката и уличното осветление в пешеходните зони и публични пространства;	подобрена маркировка и улично осветление в пешеходните зони и публични пространства;	кв.м.	600	600
				Подобряване на безопасността на пешеходното движение	3.2.5	Подобряване на вертикалната сигнализация, осигуряваща безопасното придвижване на пешеходците; измерване и анализиране на пътничкопотока и отчитане на спецификата на отделните кръстовища при вземането на решения за поставяне на бутони за заявка за пешеходно пресичане, както и преосмисляне на локациите на вече действащите такива и др.	Подобрена вертикална сигнализация, осигуряваща безопасното придвижване на пешеходците	кв.м.	500	500
			3.3	Популяризиране и стимулиране на пешеходното движение	3.3.1	Провеждане на широка кампания, целяща популяризирането на мерките и ползите от използването на екологични и устойчиви методи на транспорт, се счита и за един от основните инструменти за популяризирането на ПУГМ след изготвянето и одобрението	проведена кампания	бр.	1	0
					3.3.2	Провеждане на информационни кампании за определени целеви групи	проведени информационни кампании	бр.	2	0

Направление	№	Приоритет	№	Мярка	№	Проект	Индикатори за изпълнение			
							Индикатор	Мярка	Целева стойност	Междинна стойност (2024 г.)
Пешеходно движение	3	Повишаване на пътната безопасност и условията за пешеходно придвижване в града	3.3	Популяризиране и стимулиране на пешеходното движение	3.3.3	Провеждане на инициативи за стимулиране на пешеходното и велосипедното движение, напр. „Пеша на училище“ за стимулиране на ходенето пеша на училище чрез създаване на достъпна и безопасна среда за пешеходно придвижване около училища, подобряване на достъпа от спирки на градския транспорт, основни подходи към училищата и т.н.	<i>проведени инициативи /подобрения</i>	<i>брой</i>	3	0
Велосипедно движение										
Велосипедно движение	4	Развитие на алтернативни начини на придвижвания и изграждане на велоалеи	4.1	Изграждане на интегрирана инфраструктура за велосипеден транспорт	4.1.1	в имота на демонтираната жп. линия Пазарджик – Ляхово - Варвара, като общо предвиждане в ОУПО Септември и ОУПО Пазарджик и отклонение от нея в посока Паталеница, Црънча	<i>изградени нови велосипедни алеи</i>	<i>бр.</i>	1	0
					4.1.2	в посока с. Добровница от дясната страна на общинския път;	<i>изградени нови велосипедни алеи</i>	<i>бр.</i>	1	0
					4.1.3	от гр. Пазарджик южно от републиканския път I-8, в посока гр. София до с. Мокрище по съществуващ черен път;	<i>изградени нови велосипедни алеи</i>	<i>бр.</i>	1	0
			4.2	Изграждане на довеждаща велосипедна мрежа в жилищните квартали	4.2.	изграждане на вътрешнокварталните велотрасета	<i>изградени велотрасета</i>	<i>бр.</i>	3	0
			4.3	Изграждане на рекреационни и спортни велосипедни трасета и маршрути	4.3.	Изграждане и/или маркиране на велосипедни маршрути и трасета, които формират специфична мрежа в градските паркове и околградския район. Като велосипеден маршрут за спорт, отдих и туризъм може да се маркира всяка паркова алея, която може да бъде споделена с пешеходци.	<i>изградени велотрасета и маршрути</i>	<i>бр.</i>	5	0

Направление	№	Приоритет	№	Мярка	№	Проект	Индикатори за изпълнение			
							Индикатор	Мярка	Целева стойност	Междинна стойност (2024 г.)
Велосипедно движение	4	Развитие на алтернативни начини на придвижвания и изграждане на велоалеи	4.4	Монтиране на съоръжения за паркиране на велосипеди	4.4.1	Монтиране на съоръжения за паркиране на велосипеди на обществени места	монтирани съоръжения за паркиране на велосипеди	бр.	20	2
				Монтиране на съоръжения за паркиране на велосипеди	4.4.2	Монтиране на съоръжения за паркиране на велосипеди на работни места	монтирани съоръжения за паркиране на велосипеди	бр.	20	-
			4.5	Подобряване на пътната безопасност за велосипедистите	4.5.1	Полагане на маркировка, маркиране на специализирани пътни знаци, сигнализация и др.;	положени маркировки/пътни знаци /сигнализация	бр.	30	30
					4.5.2	Подобрения на опасни кръстовища и пресичания - напр. създаване на стоп линия за велосипедисти, изнесена пред стоп линията на моторизирания трафик; добавяне на велосипедни пътеки до пешеходните пътеки; продължаване на настилка на велосипедни алеи през кръстовище, ако велоалеята е с предимство; създаване на междинни острови и изнесени тротоари при пресичане; стеснения на платното за движение и намаляване на радиуса на бордюрните криви;	подобрили кръстовища	бр.	10	0
					4.5.3	Обучение и образование за пътна безопасност и каране на велосипед или тротинетка в градски условия, включително в училище;	проведено обучение за пътна безопасност	бр.	3	0
					4.5.4	Провеждане на кампании за толерантност на пътя.	проведени кампании	бр.	2	0
					4.6.1	Разяснителни срещи относно здравословни навици за повече движение в града, както и развитието на култура за използване на колелото като средство за транспорт;	проведени разяснителни срещи	бр.	5	0
			4.6	Популяризиране и стимулиране на велосипедното движение						

Направление	№	Приоритет	№	Мярка	№	Проект	Индикатори за изпълнение			
							Индикатор	Мярка	Целева стойност	Междинна стойност (2024 г.)
Велосипедно движение	4	Развитие на алтернативни начини на придвижвания и изграждане на велоалеи	4.6	Популяризиране и стимулиране на велосипедното движение	4.6.2	Организиране на кампании с ученици и студенти за ходене на училище/университет с велосипед;	проведени кампании	бр.	6	0
					4.6.3	Кампании с работодатели за насърчаване използването на велосипеден транспорт от техните служители;	проведени кампании	бр.	5	0
Интелигентни транспортни системи	5	Внедряване на ИТС за управление на мобилността		Популяризиране и стимулиране на велосипедното движение	4.6.4	Създаване на мобилно приложение за споделяне на велосипедни маршрути, споделени велосипеди, велосипедни паркинги и друга информация, полезна за велосипедисти;	създадено мобилно приложение за велосипедисти	бр.	1	0
Паркиране										
Паркиране	1	Подобряване на движението и достъпа до централната градска част и условията за паркиране	5.1	Изграждане на нови паркинги	5.1.1	Изграждане на многоетажен паркинг /паркингът зад Музея/; Изграждане на подземен паркинг УПИ I /Градски пазар/ кв.1254 по плана на гр. Пазарджик.	изградени нови паркинги	бр.	2	0
			5.2	Управление на паркирането и Умен паркинг	5.2.1	Разработване на мобилно приложение за идентифициране на най- близкото свободно паркомясто в обсега, където се намираме.	мобилно приложение	бр.	1	0
	5	Внедряване на ИТС за управление на мобилността		Управление на паркирането и Умен паркинг	5.2.2	Въвеждане на Интегрирана електронна система за управление на паркирането (всички обособени паркинги и места за улично паркиране);	въведена Интегрирана електронна система за управление на паркирането	бр.	1	0
	1	Подобряване на движението и достъпа до централната градска част и условията за паркиране	5.2	Управление на паркирането и Умен паркинг	5.2.3	Ограничаване паркирането в зони с интензивен трафик;	ограничаване паркирането в зони с интензивен трафик	бр.	2	0

Направление	№	Приоритет	№	Мярка	№	Проект	Индикатори за изпълнение			
							Индикатор	Мярка	Целева стойност	Междинна стойност (2024 г.)
Градска логистика										
Градска логистика	1	Подобряване на движението и достъпа до централната градска част и условията за паркиране	6.1	Мерки за управление и контрол на логистиката на транспорта	6.1.1	Управление и контрол при зареждането на търговските обекти:	въведени контролни дейности	бр.	3	0
					6.1.2	Прилагане на инструменти за анализ на устойчивата градска мобилност; идентифициране на проблеми; качествени съвместни решения, включващи всички заинтересовани страни; оценка, поддръжка и подновяване на добрите практически решения;	приложени инструменти и решения	бр.	5	0
	5	Внедряване на ИТС за управление на мобилността			6.1.3	Въвеждане на Система за контрол на тежкотоварното движение	въведена система за контрол на тежкотоварното движение	бр.	1	0
Интелигентни транспортни системи										
Интелигентни транспортни системи	5	Внедряване на ИТС за управление на мобилността	7.1	Система за интелигентно управление на трафика	7.1.1	Дигитално управление и контрол на трафика чрез онлайн платформа	изградена онлайн платформа	бр.	1	0
					7.1.2	Въвеждане на система за видеонаблюдение на трафика	въведена система за видеонаблюдение	бр.	1	0
					7.1.3	Въвеждане на „умни кръстовища“	въведени умни кръстовища	бр.	3	0
			7.2	Въвеждане на система за електронно таксуване на пътниците и видеонаблюдение в градския транспорт	7.2	Въвеждане на система за електронно таксуване на пътниците и видеонаблюдение в градския транспорт	въведена система за електронно таксуване на пътниците и видеонаблюдение	бр.	1	0
			7.3	Разработване/ актуализиране на ГПОД	7.3	Разработване/ актуализиране на ГПОД /Генерален план за организация на движението/	изготвен ГПОД	бр.	1	0

Направление	№	Приоритет	№	Мярка	№	Проект	Индикатори за изпълнение			
							Индикатор	Мярка	Целева стойност	Междинна стойност (2024 г.)
Интелигентни транспортни системи	5	Внедряване на ИТС за управление на мобилността	7.4	Въвеждане на информационни електронни табла	7.4.1	Монтиране на електронни информационни табла, предоставящи информация за пътувания в реално време на спирките на МГОТ;	монтирани електронни табла	бр.	30	0
					7.4.2	Монтиране на електронни информационни табла за наличните и свободни места за паркиране в града на входните артерии, както и указващи табла в града.	монтирани електронни табла	бр.	8	0
			7.5	Въвеждане на сензори за мониторинг и контрол на качество на атмосферния въздух	7.5	Въвеждане на сензори за мониторинг и контрол на качество на атмосферния въздух	монтирани сензори	бр.	20	0
			7.6	Въвеждане на мобилно приложение за транспортните услуги за гражданите	7.6	Въвеждане на мобилно приложение за транспортните услуги за гражданите	въведено мобилно приложение	бр.	1	0
Безопасна градска мобилност										
Безопасна градска мобилност	3	Повишаване на пътната безопасност и условията за пешеходно придвижване в града	8.1	Изграждане на по-безопасна инфраструктура	8.1	Инфраструктурните мерки за безопасна градска мобилност, насочени към безопасността и сигурността на всички участници, в т.ч. уязвимите участници в движението	въведени инфраструктурн и мерки	бр.	5	0
Безопасна градска мобилност	5	Внедряване на ИТС за управление на мобилността	8.2	По-тясно сътрудничество в областта на пътната безопасност между органите за пътна безопасност и здравните служби	8.2	Въвеждане на системата e-call	въведена системата e-call	бр.	1	0

Направление	№	Приоритет	№	Мярка	№	Проект	Индикатори за изпълнение			
							Индикатор	Мярка	Целева стойност	Междинна стойност (2024 г.)
Безопасна градска мобилност	3	Повишаване на пътната безопасност и условията за пешеходно придвижване в града	8.3	Въвеждане на обучение по градска мобилност.	8.3	Подобряване на образованието и обучението на участниците в движението по пътищата	проведени обучения	бр.	3	0
Интегриран териториален подход										
Интегриран териториален подход	1	Подобряване на движението и достъпа до централната градска част и условията за паркиране	9.1	Формиране на интегрирани пакети от мерки за устойчива мобилност в части на града	9.1	Формиране на интегрирани пакети от мерки за устойчива мобилност в части на града	реализирани проекти	бр.	1	0
			9.2	Формиране на интегрирани пакети от мерки за устойчива мобилност в зоната на близките населени места на града	9.2	Формиране на интегрирани пакети от мерки за устойчива мобилност в зоната на близките населени места на град	реализирани проекти	бр.	1	0
	2	Подобряване на системата на общественя транспорт чрез внедряване на ниско емисионни превозни средства	9.3	Формиране на партньорства и интегрирани пакети от мерки за устойчива мобилност във функционални зони и ареали, включващи общини Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Велинград, Брацигово и др.	9.3	Закупуване на нови нулевоемисионни превозни средства; Изграждане на нови зарядни станции за нуждите на пилотния проект за общественя транспорт	закупени нови: 6 електробуса и 6 бавни зарядни станции и 1 бърза зарядна станция	бр.	13	0

Източник: ПУГМ Пазарджик 2023-2030 г. и Общинска администрация

7. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

ПИРО Пазарджик 2021-2027 г. е насочен за широката общественост и е ключов документ за регионалното и пространствено развитие. Той обвързва динамични елементи, които търпят изменение във времето и затова е важно осъществяването на периодични наблюдения, на базата на които да се направят изводи и да се дадат, при необходимост, препоръки за подобряването и изпълнението му през остатъка от програмния период.

7.1. Изводи

По отношение на стратегическата рамка:

- Визията на ПИРО е формулирана съгласно местните характеристики и отразява специфичния потенциал за развитие на общината.
- Стратегическата част е пряк израз на желаното развитие в социален, икономически и природен аспект.
- Част от приоритетите имат сходно съдържание, като се разгръщат в рамките на повече от една стратегическа цел. Това води до дублиране на действия и затруднява проследяването на ефективността на конкретните приоритети.
- В индикативната финансова таблица в ПИРО липсва разпределение на планирания бюджет по източници на финансиране.
- До момента не са изготвяни годишни доклади за изпълнението на ПИРО Пазарджик 2021-2027 г.

По отношение на целите, приоритетите, проектите/дейностите:

- Стратегическите цели, приоритети и мерки, определени в ПИРО Пазарджик, се изпълняват чрез реализацията на значителен брой проекти/дейности.
- Индикативна финансова таблица е изготвена на ниво стратегически цели и не е изцяло разгърната за отделните приоритети. Поради това, за да бъде оценен напредъкът по отношение на ефективността и ефикасността на използването на финансовите ресурси, междинната оценка е извършена на ниво стратегически цели, а не на ниво приоритети.
- За Стратегическа цел IV не е предвиден индикативен бюджет. По тази причина не може да бъде направена съпоставка между предварително планиран бюджет и реално изпълнен.
- Част от предварително заложените в Програмата за реализация на ПИРО проекти и дейности са успешно осъществени.
- Отчитат се различни степени на изпълнение на стратегическите цели, както и различен брой на изпълнените проекти. Най-високо техническо и финансово изпълнение има Стратегическа цел II, а най-ниско - Стратегическа цел IV.
- По отношение на годишната финансова реализация се забелязва, че най-много средства за всички четири стратегически цели са усвоени през последната отчетна година.
- Финансовото изпълнение на ПИРО се осъществява от различни източници, което показва, че чрез съчетаване на средствата от няколко финансови източници се постигат по-добри резултати. Средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове имат водещ принос за реализацията на проектите, докато участието на общинския бюджет е с най-малък относителен дял.
- За разглеждания период община Пазарджик демонстрира висока ефективност при усвояването и привличането на външни средства. За всеки 1 лев, вложен от общинския

бюджет, са привлечени допълнителни **16,85 лв.** от други източници, включително фондове на Европейския съюз, републиканския бюджет, както и от частни и други финансиращи организации. Този резултат показва способността на общината да мобилизира външни ресурси и да осигурява значителен финансов принос за изпълнението на местните политики и проекти.

- Общината осъществява целенасочена и ефикасна политика по управление на ресурсите си, като демонстрира висока успеваемост при защитата на проектни идеи в процеса на кандидатстване за финансиране.
- Значителна част от проектите все още са в процес на изпълнение, като тяхната реализация продължава и след 2024 г. Очаква се в следващите години успешното им завършване да допринесе съществено за повишаване на степента на изпълнение на ПИРО и за постигане на заложените стратегически цели.

По отношение на индикаторите:

- Преизпълнените индикатори са 3. От тях 1 е за резултат и 2 за продукт. Те представляват 3,9% от всички индикатори.
- Изпълнените индикатори са 4 за резултат и 12 за продукт. Техният дял е 20,5%.
- Частично изпълнение имат 5 индикатора - 1 за резултат и 4 за продукт. Те формират 6,4% от всички индикатори.
- Най-голям е броят на неизпълнените индикатори, които са 49. От тях 11 са за резултат, а останалите за продукт. Техният дял е 62,8%.
- За 5 индикатора за продукт не може да бъде направена оценка, тъй като стойностите липсват или са грешни, или компрометирани. Те представляват 6,4%.

7.2. Препоръки

На база синтезираната и изложена информация може да се очертаят следните препоръки за изпълнението на ПИРО през втората половина на програмния период:

- Препоръчително е в остатъка от програмния период да бъдат изготвени годишни доклади, които са надежден източник на информация. Те ще послужат и при изготвяне на последваща оценка, която ще бъде извършена след периода на действие на ПИРО.
- Препоръчва се да бъде оптимизирана стратегическата част на ПИРО. Забелязва се разгръщане на мерките и дейностите в рамките на повече от един приоритет (на места и в повече от една стратегическа цел). Необходимо е мерките да бъдат целенасочени и ясно дефинирани, за да се осигури по-прецизно и ефективно отчитане на приноса им към реализирането на стратегическите цели и приоритети на ПИРО.
- Възможно действие е актуализирането на част от индикаторите – на целевите стойности и на мерните единици. Някои индикатори са преизпълнени неколкостранно, а други нямат изпълнение към средата на периода. Системата от индикатори включва и такива, които се измерват в неподходящи мерни единици, което възпрепятства тяхното максимално обективно отчитане. Освен това, за част от индикаторите не може да бъде проследен напредък, поради спецификата на необходимата информация.
- Препоръчва се да бъдат извършени коригиращи действия по отношение на индикативната финансова таблица, в която да бъдат актуализирани индикативните стойности по стратегически цели и приоритети. Освен това, целесъобразно е да бъде направен разчет на средствата по източници на финансиране, тъй като към настоящия момент е

невъзможно да се оцени напредъкът, както и да се проследи в каква степен предварително заложения принос на всеки отделен източник отговаря на действителното изпълнение.

- Осъществяване на партньорства за реализация на проекти с близки и съседни общини е добър способ за постигането на по-добри резултати по изпълнението на ПИРО.
- Препоръчва се Общината да информира заинтересованите страни относно възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти, допринасящи за реализацията на заложената визия в плана, както и за постигането на стратегическите цели и приоритети за развитие. Това ще спомогне за постигане на по-добро и устойчиво местно развитие.
- Препоръчва се да бъдат предприети действия по реализацията на предварително заложените в ПИРО проектни идеи/дейности, които към средата на програмен период 2021-2027 г. нямат стартирало изпълнение.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 2021-2024 г.

Приложение №2. Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО.

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
Стратегическа цел I: Ускорено икономическо развитие на общината и диверсификация на икономическите дейности с прилагане на иновации и осигуряване на благоприятна бизнес среда		133 291 157,92	55 567 431,20		699 829,00	31 212 357,08	264 033,00	23 372 380,12	18 832,00						
1	Производствено хале в УПИ I, с. Ивайло	479 239,00	479 239,00	ОБ	479 239,00										
2-9	Инвестиции в Регионален исторически музей, гр. Пазарджик - 8 дейности	230 133,00	230 133,00	ОБ и ЦБ	16 100,00		214 033,00								
10	Изграждане на църква, с. Драгор	334 000,00	56 643,00	ОБ	56 643,00										
11	Навес към пристройка на църква, с. Ивайло	14 618,00	14 618,00	ОБ	14 618,00										
12-14	Православен кръст в селата Синитово, Главиница и Црънча - 3 дейности	16 500,00	16 500,00	ОБ	16 500,00										
15	Проект за консервация, реконструкция и преустройство на Генова къща, Регионален исторически музей	10 200,00	10 200,00	ОБ	10 200,00										
16	Изграждане на църковен храм, с. Сарая	259 943,00	77 383,00	ОБ	77 383,00										
17	Изграждане на православен параклис „Св. Никола“, с. Мало Конаре	10 000,00	10 000,00	ОБ	10 000,00										
18	Придобиване на дълготрайни активи за фойе пред зала „Археология“ в Регионален исторически музей, гр. Пазарджик	72 660,00	50 314,00	ОБ и ЦБ	314,00		50 000,00								
19-20	Закупуване на имот, град Пазарджик - 2 дейности	37 664,00	37 664,00	ОБ и ДИ	18 832,00				18 832,00						
21	Пристройка за филтърни системи към сграда 1 за производство на аквакултури в ПИ № 010015, УПИ V-15 за рибовъдно производство, местност „Граховлива дъмба“, землище с. Мирянци, общ. Пазарджик“	395 208,32	395 208,32	ОПМДР и ЧИ		197 604,16		197 604,16							
22-23	Модернизация на сграда за преработка на аквакултури и предприятие за преработка на продукти от аквакултури - 2 проекта	1 157 737,86	1 157 737,86	ОПМДР и ЧИ		578 868,93		578 868,93							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
24	Производство на продукти за лична хигиена и козметика, съдържащи природни антисептици и биологично активни вещества от растителен произход	226 636,54	94 286,44	ОПИК и ЧИ		75 428,00		18 858,44							
25-29	Реализиране на предприемаческата идея - 5 проекта	1 107 114,55	664 873,90	ОПИК и ЧИ		531 901,73		132 972,17							
30-38	Подобряване на производствения капацитет в предприятията - 9 проекта	6 211 403,04	4 767 972,96	ОПИК и ЧИ		3 222 477,20		1 545 495,76							
39	Създаване на високотехнологичен индустриален център	298 498,22	240 481,49	ОПИК и ЧИ		168 337,04		72 144,45							
40-65	Технологична модернизация в предприятието - 26 проекта	20 170 203,86	18 770 204,00	НПВУ и ЧИ		9 163 639,64		9 606 564,36							
66	Насърчаване на предприемачеството чрез реализиране на инвестиции в козметичната индустрия	233 976,00	166 632,90	ОПИК и ЧИ		133 307,29		33 325,61							
67-85	Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия - 19 проекта	348 841,00	266 146,66	НПВУ		266 146,66									
86	Мобилно приложение „Ап Кафе“ - една добра предприемаческа идея	240 700,00	79 050,61	ОПИК и ЧИ		63 241,27		15 809,34							
87	Закупуване на прикачен инвентар за земеделска техника, специализирано навигационно оборудване за автоматичен контрол и софтуер за обезпечаване на производствената дейност на земеделското стопанство	173 645,82	157 370,80	ПРСР и ЧИ		78 685,40		78 685,40							
88-109	Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност - 22 проекта	4 473 588,88	4 460 445,80	ОПИК и ЧИ		2 340 040,86		2 120 404,94							
110-125	Стартова помощ за създаване и развитие на стопанства на млади фермери - 16 проекта	782 320,00	562 292,50	ПРСР		562 292,50									
126	Инвестиции в земеделска техника и напояване	1 063 304,00	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
127	Преработка на орехи	63 915,57	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
128-132	Модернизирание на стопанството - 5 проекта	1 433 570,85	499 691,85	ПРСР и ЧИ		249 845,93		249 845,92							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
133-134	Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал - 2 проекта	517 637,94	516 617,94	ОПИК и ЧИ		361 632,56		154 985,38							
135	Дооборудване на сграда за преработка на аквакултури	399 903,47	399 903,47	ОПМДР и ЧИ		199 951,73		199 951,74							
136	Сграда за производство на фуражи за риба	392 524,89	392 524,89	ОПМДР и ЧИ		196 262,45		196 262,44							
137	Промяна по време на строителство - преустройство на етап 3 - филтърни системи към обект: „Сграда за производство на аквакултури“	387 280,14	387 280,14	ОПМДР и ЧИ		193 640,07		193 640,07							
138	Промяна по време на строителство - Модернизация на Сграда за производство на фураж /храна/ за риби с вложено СЖП категория 3 от риба	377 279,69	377 279,69	ОПМДР и ЧИ		188 639,84		188 639,85							
139	Промяна по време на строителство - преустройство на Етап 4 - Рециркулационни системи за интензивно отглеждане на Европейски сом зарибител и родители към обект: „Сграда за производство на аквакултури“	369 032,39	369 032,39	ОПМДР и ЧИ		184 516,19		184 516,20							
140	Проект за безвъзмездна финансова помощ	2 972,36	2 972,36	ОПМДР		2 972,36									
141	Технологична и екологична модернизация	699 400,00	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
142	Автокино Риболовец	58 440,00	58 440,00	ОПМДР		58 440,00									
143	Технологична модернизация в земеделското стопанство	167 050,00	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
144-148	Развитие на стопанството - 5 проекта	244 475,00	195 580,00	ПРСР		195 580,00									
149-150	Подкрепа за устойчив бизнес - 2 проекта	9 997,50	9 997,50	ОПРЧР		9 997,50									
151-158	Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии - 8 проекта	4 563 223,60	494 152,00	НПВУ и ЧИ		247 076,00		247 076,00							
159	Ускоряване прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа и постигане на по-висока степен на безопасна и здравословна работна среда	111 188,13	0,00	ПРЧР		0,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
160-178	Устойчиво развитие на малко земеделско стопанство в района на област Пазарджик - 19 проекта	560 803,00	498 729,00	ПРСР		498 729,00									
179	Проект по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ - 2,0754 ха сливи и череши в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик	48 895,00	48 895,00	ПРСР		48 895,00									
180-197	Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопани - 18 проекта	528 066,00	430 276,00	ПРСР		430 276,00									
198	Закупуване на земеделска техника и земеделско оборудване за отглеждане на ориз	658 053,00	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
199-208	Подкрепа за прехода към кръгова икономика - 10 проекта	10 057 693,35	1 494 500,00	НПВУ и ЧИ		628 000,00		866 500,00							
209	Закупуване на земеделска техника и автоматизирана механизация с цел екологична и технологична модернизация на стопанството	307 324,78	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
210	Изграждане и оборудване на риболовни комплекс от рециркуляционен тип за производство на личинки и зарибителен материал в землището на с. Сбор, община Пазарджик	1 638 243,08	0,00	ОПМДР и ЧИ		0,00		0,00							
211	Стартова помощ за устойчиво развитие на земеделско стопанство	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50									
212	Закупуване на земеделска техника и оборудване за напояване	1 728 995,86	1 728 995,86	ПРСР и ЧИ		864 497,93		864 497,93							
213-219	Внедряване на иновации в предприятията - 7 проекта	6 403 258,74	0,00	ПКИП и ЧИ		0,00		0,00							
220	Модернизация в земеделското стопанство	680 678,78	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
221	Технологична и екологична модернизация	166 050,00	0,00	НПВУ		0,00									
222	Внедряване на иновация в бизнес процесите	1 777 750,00	0,00	ПКИП и ЧИ		0,00		0,00							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
223-226	Подобряване на производствения капацитет с цел повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал - 4 проекта	4 243 107,46	2 391 871,05	ОПИК и ЧИ		1 639 384,92		752 486,13							
227	Внедряване в производство на иновативен процес за производство на рамка за програмируеми вакуумни нагревателни пещи за запояване и спояване с твърд припой	411 400,00	0,00	ПКИП и ЧИ		0,00		0,00							
228-229	Подпомагане развитието на стопанството на млади фермери - 2 проекта	97 790,00	73 342,50	ПРСР		73 342,50									
230	Развитие на риболовен и културно познавателен туризъм в РР на МИРГ - Пазарджик	55 470,00	55 470,00	ОПМДР		55 470,00									
231-235	Закупуване на земеделска техника - 5 проекта	1 215 882,61	417 400,00	ПРСР, НПВУ и ЧИ		208 700,00		208 700,00							
236-238	Адаптиране на работната среда - 3 проекта	511 046,42	0,00	ПРЧР		0,00									
239-240	Внедряване на иновативен продукт в предприятие - 2 проекта	1 536 666,00	0,00	ПКИП и ЧИ		0,00		0,00							
241	Повишаване конкурентоспособността на земеделско стопанство	715 500,00	715 500,00	ПРСР и ЧИ		357 750,00		357 750,00							
242	Модернизация на земеделското стопанство, посредством закупуването на нова земеделска техника	969 076,08	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
243-244	Закупуване на земеделска техника с цел екологична и технологична модернизация на стопанството - 2 проекта	443 700,00	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
245	Увеличаване на стопанството с 0,900 дка домати-оранжерийни. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на съоръжение - метална конструкция за оранжерия, полиетиленово покритие и трактор. Създаване на едно работно място.	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
246	Разработване на иновативни подходи за контрол на галови нематоди чрез соларизация на почвата и внасяне на микроорганизми, в съответствие с правилата на биологичното производство	763 933,71	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
247	Разработване на иновативни методи за контрол на основните неприятелни по оранжерийните култури чрез производство и интродуциране на биоагенти (полезни насекоми) за биологичен контрол върху тях	869 083,62	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
248	Инвестиции в разширяване и автоматизация на производствените процеси в предприятие	3 910 059,43	1 320 875,42	ПРСР и ЧИ		660 437,71		660 437,71							
249	Технологична модернизация и автоматизация на производството	586 738,00	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
250	Установяване на здравословна и безопасна, зелена и устойчива работна среда	63 177,37	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
251	Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващи животновъдни обекти	175 694,43	175 694,43	ПРСР и ЧИ		87 847,21		87 847,22							
252-253	Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствени нужди - 2 проекта	1 103 856,03	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
254-255	Развитие на земеделското стопанство - 2 проекта	97 790,00	73 342,50	ПРСР		73 342,50									
256	Въвеждане на нови технологии в земеделското стопанство	481 500,00	0,00	ПРСР		0,00									
257	Инвестиции в модернизирани и разширяване на земеделското стопанство	1 691 331,34	832 200,00	ПРСР и ЧИ		416 100,00		416 100,00							
258	Инвестиции в дигитализирана земеделска техника за отглеждане на зеленчуци и изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди	340 796,00	0,00	НПВУ		0,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
259	Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в ПИ с идент. 15271.107.11 в землището на с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик	1 955 652,10	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
260	Отглеждане на трайни насаждения и пчелни семейства в малкото стопанство	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00									
261	Технологична оптимизация и екологична модернизация	995 000,00	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
262	Инвестиции в технологична и екологична модернизация за подобряване на цялостната дейност в земеделското стопанство	416 400,00	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
263	Осигуряване на устойчиви условия на труд и подобряване на качеството на работните места	274 733,25	0,00	ПРСР		0,00									
264	Модернизация на преработвателното предприятие чрез закупуване на ново оборудване и изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия за собствено потребление	869 435,60	869 435,60	ПРСР и ЧИ		434 717,80		434 717,80							
265	Развитие на жизнеспособно и устойчиво земеделско стопанство	48 895,00	48 895,00	ПРСР		48 895,00									
266	Отглеждане на 20,986 дка череша и създаване на нови трайни насаждения - 6 дка сливи, отглеждани по биологичен начин	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50									
267	Закупуване на микробус за нуждите на земеделското стопанство от 28 дка зеленчуци, за увеличаването на стопанството с 4 дка домати - открито производство и 3 дка пипер - открито производство и създаване на едно работно място	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50									
268-269	Внедряване на продуктова иновация в предприятие - 2 проекта	2 737 000,00	0,00	ПКИП и ЧИ		0,00		0,00							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
270	Инвестиции в технологична и екологична модернизация в стопанството	360 890,44	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
271-275	Адаптирана работна среда - 5 проекта	928 516,43	0,00	ПРЧР		0,00									
276	Инвестиции в мерки за биосигурност в стопанството	586 495,52	586 495,42	ПРСР и ЧИ		293 247,71		293 247,71							
277	Модернизация на земеделското стопанство чрез инвестиции в иновации и околна среда	611 664,90	611 664,90	ПРСР и ЧИ		305 832,44		305 832,46							
278-281	Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии - 4 проекта	84 000,00	84 000,00	ОПИК		84 000,00									
282	Създаване на стопанство за отглеждане на оранжерийни култури	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00									
283	Dynamico	231 746,10	141 845,80	ОПИК и ЧИ		113 475,51		28 370,29							
284	Модернизация и разширяване на технологичния и продуктивния капацитет на млекопреработващо предприятие „Дядо Либен“ в гр. Копривщица и СМР на ПСОВ	2 646 569,35	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
285	Стартова помощ за развитието на стопанството	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00									
286	Внедряване на нови технологии и обновяване на наличните материални активи	266 759,12	266 759,12	ПРСР и ЧИ		133 379,56		133 379,56							
287	Предприятие за стерилизирани зеленчукови консерви – гр. Пазарджик	373 350,60	373 350,60	ПРСР и ЧИ		186 675,30		186 675,30							
288	Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 499,95 kwp за нуждите на предприятие за стерилизирани зеленчукови консерви, находящо се в гр. Пазарджик	497 625,17	497 625,17	ПРСР и ЧИ		248 812,58		248 812,59							
289	ВОМР на Местна инициативна рибарска група Пазарджик	3 911 660,00	472 209,01	ОПМДР		472 209,01									
290	Закупуване на модерна техника за ферма	321 841,69	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
291	Развитие на стопанството с овощни насаждения и цветя	29 337,00	19 558,00	ПРСР		19 558,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
292	Инвестиции в технологична и екологична модернизация в земеделското стопанство	676 699,66	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
293	По-добри условия на труд	329 798,79	0,00	ПРЧР		0,00									
294	Реализиране на пазара на предприемаческа идея: „Проектиране на сгради и съоръжения и консултации по архитектурни дейности“	250 000,00	249 113,77	ОПИК и ЧИ		199 291,02		49 822,75							
295	Инвестиции свързани с мерки за повишаване на биосигурността в съществуващ животновъден обект	279 647,64	279 647,64	ПРСР и ЧИ		139 823,82		139 823,82							
296	Закупуване на технологично оборудване за животновъдна сграда /Сграда №4/, изграждане на покривна фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/ до 200 kWp за собствени нужди и на биоскрubberна система за намаляване на емисиите от интензивно миришещи вещества, прах и амоняк	1 533 264,06	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
297	Технологична и екологична модернизация в свинеферма	996 164,53	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
298	Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма	249 930,00	141 290,18	ОПИК и ЧИ		113 033,10		28 257,08							
299	Проект „Летящ старт“	242 747,97	242 747,97	ОПИК и ЧИ		194 198,43		48 549,54							
300	Създаване на нова вишнева градина и подобряване механизацията в стопанството чрез закупуване на трактор	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50									
301	Реконструкция и модернизация на съществуващи оранжерийни блокове 15, 16, 17, 18 ситуирани в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик с цел подобряване на енергийната ефективност и оптимизиране на процесите по контрол на микроклимата. Изграждане на електронна система за почвено отопление на оранжерийни блокове - 3, 4 и 17 всеки по 30 дка.	1 881 070,36	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
302	Технологична и екологична модернизация на производствените процеси в овощна градина с орехови насаждения	323 430,00	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
303	Подмяна на хладилно оборудване в кланица за добив на червени меса с транжорна, изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала до 300 kwp за собствени нужди и закупуване на товарни автомобили	2 064 495,54	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
304	Закупуване на автоматизирана механизация с цел екологична и технологична модернизация на стопанството	345 380,01	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
305	Закупуване на земеделска техника и оборудване	477 932,00	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
306	Доставка на линии за автоматично напояване с роботизиран контрол на почвената влажност, водогреен котел на биомаса и специализирано ЛЕД осветление. Монтаж на автономна фотоволтаична централа за захранване на нуждите на стопанството от ел. енергия.	1 954 903,00	977 451,50	ПРСР и ЧИ		488 725,75		488 725,75							
307	Закупуване на земеделска техника за оранжерийно производство и център за управление на процесите в оранжерията	691 300,00	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
308	Внедряване на иновативен бизнес процес	951 900,00	0,00	ПКИП		0,00									
309	Внедряване на технологична и екологична модернизация в земеделското стопанство	404 856,82	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
310	Ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик	823 705,19	597 768,99	ФМ на ЕИП =>Културно предприемачество, наследство и сътрудничество		597 768,99									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
311	Сгради и съоръжения за производство за фураж за риба и аквакултури	365 383,04	365 383,04	ОПМДР и ЧИ		182 691,52		182 691,52							
312	Сгради и съоръжения за производство на фураж за риба и аквакултури етап 2	399 997,58	394 530,56	ОПМДР и ЧИ		197 265,28		197 265,28							
313	Инвестиции в иновативни технологии и ВЕИ	1 543 128,85	584 841,10	ПРСР и ЧИ		292 420,55		292 420,55							
314	Създаване на мобилна високотехнологична стоматологична медико-диагностична лаборатория	249 530,00	103 372,17	ОПИК		103 372,17									
315	Повишаване иновационната дейност чрез внедряване в серийно производство и пазарна реализация на полезен модел „Многофункционален фотьойл“	1 030 000,00	0,00	ПКИП и ЧИ		0,00		0,00							
316-317	Насърчаване на предприемачеството - 2 проекта	493 490,94	143 845,43	ОПИК и ЧИ		119 517,07		24 328,36							
318	Закупуване на земеделска техника и оборудване за стопанство с цел модернизирание	677 068,31	0,00	ПРСР и ЧИ		0,00		0,00							
319	Подпомагане за развитие на устойчиво земеделско стопанство	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00									
320	Развитие на стопанството на земеделски стопанин	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50									
321	Инвестиции в технологична и екологична модернизация, чрез закупуване внедряване на технологични решения за управление и контрол на процесите	775 873,82	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
322	Стартова помощ за развитието на земеделското стопанство	29 337,00	9 779,00	ПРСР		9 779,00									
323	Модернизация на отделните фази на производствените процеси при зеленчукопроизводство на земеделски производител	461 500,00	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
324	Модернизирание на условията за безопасен труд, с цел създаване на устойчива, здравословна и добре приспособена работна среда, която отчита рисковете за здравето на всички работници и служители.	221 826,43	0,00	ПРЧР		0,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
325	Реализиране на пазара на предприемаческа идея: тренажор за стрелба с лък по подвижни цели с използване на видео изображения	200 762,00	58 754,94	ОПИК и ЧИ		47 002,26		11 752,68							
326	Създаване на зеленчуково стопанство	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50									
327	Закупуване на нова земеделска техника и GPS необходими на земеделското стопанство	242 998,84	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							
328	Създаване и развитие на инженерно студио	238 685,25	238 685,25	ОПИК и ЧИ		190 948,32		47 736,93							
329	Отглеждане на зеленчукови култури - оранжерийно и открито производство от млад фермер	48 895,00	24 447,50	ПРСР		24 447,50									
330	Стартова помощ за развитието на малко земеделско стопанство специализирано в отглеждането на череши	29 337,00	29 337,00	ПРСР		29 337,00									
331	Бизнесът на Пазарджик в дигиталния свят	35 947,05	35 947,05	ОПМДР		35 947,05									
332	Нови възможности за туризма на община Пазарджик	30 864,26	30 864,26	ОПМДР		30 864,26									
333-335	Стартова помощ за създаване и развитие на стопанство на млади земеделски стопани - 3 проекта	146 685,00	73 342,50	ПРСР		73 342,50									
Стратегичека цел II: Изграждане и рехабилитация на ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие на града и селата, съхраняваща природните дадености с иновативна индустриална култура		148 742 651,82	48 134 295,13		4 625 849,00	16 910 118,13	16 793 659,00	0,00	9 804 669,00						
1	Ремонт на ограда в ОУ „Проф. И. Батаклиев“, гр. Пазарджик	72 193,00	29 637,00	ЦБ			29 637,00								
2	Проект за преустройство на СБАЛПФЗ, гр. Пазарджик	8 586,00	2 876,00	ОБ	2 876,00										
3	Ремонт и реконструкция на ул. „Г. Кендеров“ о.т. 3011, 3236, 3238, гр. Пазарджик	37 469,00	37 469,00	ЦБ			37 469,00								
4	Ремонт на тротоарни настилки ул. „Градинарска“, гр. Пазарджик	105 641,00	105 641,00	ОБ	105 641,00										
5	Ремонт на ВВМ ул. „Стоян Ангелов“, гр. Пазарджик	333 458,00	39 133,00	ОБ	39 133,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	>2024
6	Закупуване на климатична система за нуждите на Община Пазарджик	3 100,00	3 100,00	ОБ	3 100,00										
7-15	Закупуване на климатици за кметствата в община Пазарджик - 9 дейности	19 589,00	19 589,00	ОБ и ЦБ	18 590,00		999,00								
16	Закупуване на климатик за Общински съвет - Пазарджик	1 600,00	1 600,00	ОБ	1 600,00										
17	Ограда със стоманобетонени елементи в УПИ I, с. Ивайло	32 627,00	32 627,00	ОБ	32 627,00										
18-19	Разширение на видеосистема в ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Алеко Константиново - 2 дейности	899,00	899,00	ЦБ			899,00								
20	Придобиване на комбинирано детско съоръжение за ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Алеко Константиново	20 316,00	20 316,00	ЦБ			20 316,00								
21-25	Закупуване на инвентар за ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Алеко Константиново - 5 дейности	20 875,00	18 875,00	ЦБ			18 875,00								
26-27	Закупуване на компютри и лаптоп за ДГ „Радост“, гр. Пазарджик - 2 дейности	3 192,00	3 192,00	ЦБ			3 192,00								
28-31	Закупуване на технически устройства ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Пазарджик - 4 дейности	12 526,00	12 526,00	ЦБ			12 526,00								
32-33	Лаптопи и компютри за ОУ „Асен Златаров“, с. Черногорово - 2 дейности	5 668,00	4 868,00	ЦБ			4 868,00								
34-39	Закупуване на инвентар за ОУ „Константин Величков“, с. Паталеница - 6 дейности	29 062,00	29 062,00	ОБ, ФЕС и ЦБ	19 860,00	1 700,00	7 502,00								
40-45	Закупуване на технически устройства и обзавеждане за НУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черногорово - 6 дейности	15 340,00	15 340,00	ЦБ			15 340,00								
46-51	Закупуване на оборудване за ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик - 6 дейности	13 461,00	11 779,00	ЦБ			11 779,00								
52-71	Закупуване на технически устройства за ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик - 20 дейности	140 766,00	140 766,00	ФЕС и ЦБ		3 139,00	137 627,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
72-73	Закупуване на лаптоп и фотоапарат за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ивайло - 2 дейности	3 577,00	3 577,00	ЦБ			3 577,00								
74-75	Закупуване на лаптоп и интерактивен дисплей за ДГ „Пролет“, гр. Пазарджик - 2 дейности	7 559,00	7 559,00	ЦБ			7 559,00								
76-83	Закупуване на технически устройства за ДГ „Дъга“, гр. Пазарджик - 8 дейности	37 874,00	37 874,00	ЦБ			37 874,00								
84-88	Придобиване на технически устройства за нуждите на НУ „Васил Друмев“, гр. Пазарджик - 5 дейности	28 229,00	28 229,00	ЦБ			28 229,00								
89-92	Закупуване на инвентар за Спортно училище, гр. Пазарджик - 4 дейности	31 420,00	26 152,00	ЦБ			26 152,00								
93-100	Закупуване на технически устройства за НУ „Никола Фурнаджиев“, гр. Пазарджик - 8 дейности	43 523,00	43 523,00	ФЕС и ЦБ		13 965,00	29 558,00								
101-109	Закупуване на технически устройства за нуждите на ОУ „Христо Ботев“, гр. Пазарджик - 9 дейности	41 182,00	41 182,00	ФЕС и ЦБ		16 882,00	24 300,00								
110	Компютри за ОУ „Георги Бенковски“, с. Хаджиево	834,00	834,00	ЦБ			834,00								
111-121	Закупуване на технически устройства и инвентар за СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик - 11 дейности	57 231,00	45 493,00	ФЕС и ЦБ		12 213,00	33 280,00								
122-123	Преносим компютър и мултифункционална копирна система за ПГ „Иван С. Аксаков“, гр. Пазарджик - 2 дейности	10 518,00	10 518,00	ЦБ			10 518,00								
124	Детски съоръжения за игра, с. Главиница	14 276,00	14 276,00	ЦБ			14 276,00								
125	Придобиване на косачка, с. Главиница	1 200,00	1 200,00	ОБ	1 200,00										
126	Проект за изграждане на детска градина в с. Главиница	20 040,00	5 000,00	ОБ	5 000,00										
127	Изграждане на детска градина, с. Главиница – 1 етап	1 164 514,00	579 037,00	ОБ, ЦБ и ДИ	1 440,00		570 097,00		7 500,00						
128	Изграждане на детски кът в с. Главиница, община Пазарджик	45 778,00	45 778,00	ОПМДР		45 778,00									
129	Изграждане и монтиране на автобусна спирка, с. Главиница	23 712,00	23 712,00	ОБ	23 712,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
130	Обновяване на сградата на читалище „Пробуда-1930“ в с. Главиница, община Пазарджик	39 335,68	32 063,00	ОПМДР		32 063,00									
131-133	Придобиване на компютри и програмни продукти за ОУ „Христо Ботев“, с. Главиница - 3 дейности	3 252,00	2 252,00	ЦБ			2 252,00								
134	Детски съоръжения за игра за ОУ „Васил Левски“, с. Величково	14 136,00	14 136,00	ЦБ			14 136,00								
135	Канализация по улици „1-ва“ и „6-та“, с. Величково	121 464,00	121 464,00	ОБ	121 464,00										
136-137	Закупуване на компютър и лаптоп за ОУ „Васил Левски“, с. Величково - 2 дейности	3 153,00	2 153,00	ЦБ			2 153,00								
138-142	Закупуване на инвентар за ОУ „Христо Смирненски“, гр. Пазарджик - 5 дейности	79 891,00	79 891,00	ФЕС и ЦБ		13 965,00	65 926,00								
143-146	Закупуване на инвентар за ОУ „Проф. И. Батаклиев“, гр. Пазарджик - 4 дейности	13 189,00	13 189,00	ФЕС и ЦБ		2 997,00	10 192,00								
147	Детски съоръжения за игра, с. Братаница	14 084,00	14 084,00	ЦБ			14 084,00								
148	Благоустройство ул. „36“ и „37“, с. Братаница	45 848,00	10 848,00	ОБ	10 848,00										
149	Изграждане на ограда, с. Братаница	27 884,00	27 884,00	ОБ	27 884,00										
150	Изграждане на водопровод на ул. „8“ и ул. „38“, с. Братаница	26 453,00	26 453,00	ОБ	26 453,00										
151	Закупуване на интерактивна дъска за ОУ „Христо Ботев“, с. Братаница	1 400,00	1 400,00	ЦБ			1 400,00								
152-157	Закупуване на технически средства за ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая - 6 дейности	21 248,00	21 248,00	ЦБ			21 248,00								
158-160	Закупуване на технически устройства за НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик - 3 дейности	8 164,00	8 164,00	ЦБ			8 164,00								
161-168	Закупуване на технически устройства за ОУ „Климент Охридски“, гр. Пазарджик - 8 дейности	69 891,00	69 891,00	ЦБ			69 891,00								
169-173	Закупуване на технически устройства, СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик - 5 дейности	19 439,00	19 439,00	ФЕС и ЦБ		13 965,00	5 474,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
174-177	Закупуване на технически устройства за ОУ „Отец Паисий“, с. Огняново - 4 дейности	11 382,00	11 382,00	ФЕС и ЦБ		1 700,00	9 682,00								
178	Изграждане на санитарни възли и котелно в ОУ „Христо Ботев“, с. Юнаците - Етап I	146 846,00	85 456,00	ЦБ			85 456,00								
179	Придобиване на стоманен котел (отоплителна инсталация) за ДГ „Пролет“, гр. Пазарджик	12 579,00	7 779,00	ОБ	7 779,00										
180	Детско съоръжение за игра за ДГ „Юрий Гагарин“, гр. Пазарджик	2 220,00	2 220,00	ДИ					2 220,00						
181	Комбинирано детско съоръжение за ДГ „Дъга“, гр. Пазарджик	4 990,00	4 990,00	ДИ					4 990,00						
182	Детски съоръжения за игра, с. Мало Конаре	14 136,00	14 136,00	ЦБ			14 136,00								
183	Детски съоръжения за игра, с. Синитово	14 120,00	14 120,00	ЦБ			14 120,00								
184	Детски съоръжения за игра, с. Огняново	14 120,00	14 120,00	ЦБ			14 120,00								
185	Детски съоръжения за игра за ДГ „Детелина“, с. Паталеница	28 192,00	28 192,00	ЦБ			28 192,00								
186	Детски съоръжения за игра, с. Мокрище	14 084,00	14 084,00	ЦБ			14 084,00								
187	Детски съоръжения за игра, с. Сарая	14 276,00	14 276,00	ЦБ			14 276,00								
188	Детски съоръжения за игра за ОУ „Константин Величков“, с. Паталеница	14 136,00	14 136,00	ЦБ			14 136,00								
189-191	Закупуване на работи за преконструиране и обучение в програмирането, ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик - 3 дейности	179 245,00	179 245,00	ЦБ			179 245,00								
192	Детски съоръжения за игра за ДГ „Пролет“, гр. Пазарджик	16 168,00	16 168,00	ЦБ			16 168,00								
193	Комбинирано детско съоръжение за ДГ „Юрий Гагарин“, гр. Пазарджик	3 408,00	3 408,00	ЦБ			3 408,00								
194	Открита класна стая, НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик	5 000,00	4 124,00	ДИ					4 124,00						
195	Придобиване на пергола за ДГ „Юрий Гагарин“, гр. Пазарджик	1 853,00	1 853,00	ЦБ и ДИ			1 717,00		136,00						
196	Класна стая на открито, НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик	5 000,00	4 080,00	ЦБ и ДИ			1 580,00		2 500,00						

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
197	Детска къща със занимателни игри за ДГ „Юрий Гагарин“, гр. Пазарджик	1 906,00	1 906,00	ЦБ			1 906,00								
198	Изграждане на депо за предварително третиране на битови отпадъци, Пазарджик	3 551 118,00	2 334 097,00	ОПОС		2 334 097,00									
199-200	Закупуване на инвентар за БМ „Пазара“ Пазарджик - 2 дейности	25 100,00	25 100,00	ОБ	25 100,00										
201	Закупуване на моторна косачка за Парк-остров „Свобода“, гр. Пазарджик	10 000,00	10 000,00	ОБ	10 000,00										
202	Закупуване на трактор за Парк „Стадиона“, гр. Пазарджик	11 760,00	11 760,00	ОБ	11 760,00										
203-209	Изграждане на детски площадки и съоръжения, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик - 7 дейности	234 726,00	173 858,00	ОБ	173 858,00										
210-212	Закупуване на беседки, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик - 3 дейности	16 740,00	16 740,00	ОБ	16 740,00										
213	Компютърна система за управление на аспирация в ОПК, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик	1 459,00	1 459,00	ОБ	1 459,00										
214-215	Климатизи за спортни зали - „Иван Симеонов“ и „Васил Левски“, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик - 2 дейности	19 080,00	19 080,00	ОБ	19 080,00										
216-217	Закупуване на климатик и вентилатор, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик - 2 дейности	8 820,00	8 820,00	ОБ	8 820,00										
218	Придобиване на клетка в зоопарк, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик	12 610,00	12 610,00	ОБ	12 610,00										
219	Придобиване на метални съоръжения за видеонаблюдение за БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик	4 308,00	4 308,00	ОБ	4 308,00										
220-223	Технически устройства за БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик - 4 дейности	7 604,00	7 604,00	ОБ	7 604,00										
224-235	Закупуване на инвентар за БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик - 12 дейности	149 806,00	149 806,00	ОБ и ДИ	141 807,00				7 999,00						
236-237	Закупуване на стопански инвентар за Парк „Стадиона“, гр. Пазарджик - 2 дейности	3 060,00	3 060,00	ОБ	3 060,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
238	Кръгово кръстовище на ул. „Стамболийски“ и бул. „Христо Ботев“, гр. Пазарджик	309 249,00	3 600,00	ОБ	3 600,00										
239	Водопровод ул. „51 – ва“, с. Юнаците	4 907,00	4 907,00	ОБ	4 907,00										
240	Придобиване на сцена в парка, с. Ляхово	15 000,00	15 000,00	ОБ	15 000,00										
241	Пешеходни алеи в парк, плувен комплекс „Балона“	99 974,00	99 974,00	ОБ	99 974,00										
242	Изграждане на пешеходен мост над река Марица	1 380 152,00	12 160,00	ОБ	12 160,00										
243	Основен ремонт на обществена тоалетна, с. Добровница	20 775,00	20 775,00	ОБ	20 775,00										
244	Детски съоръжения за игра, с. Добровница	14 136,00	14 136,00	ЦБ			14 136,00								
245	Асфалтиране на ул. „28-ма“, с. Добровница	95 543,00	86 207,00	ОБ	86 207,00										
246	Ремонт на ул. „6-та“, с. Добровница	26 853,00	26 853,00	ОБ	26 853,00										
247	Кът за отдих на открито, с. Добровница	10 200,00	10 200,00	ДИ					10 200,00						
248	Изготвяне на идеен проект за преустройство, основен ремонт на съществуващо помещение към детска градина, с. Добровница	9 840,00	5 400,00	ОБ	5 400,00										
249	Канализационна помпена станция, с. Добровница	33 600,00	33 600,00	ОБ	33 600,00										
250	Попивни шахти за отводняване, с. Добровница	14 358,00	14 358,00	ОБ	14 358,00										
251	Изграждане на парк за активна почивка, с. Црънча	230 050,00	40 063,00	ДИ					40 063,00						
252	Изграждане на велоалея в парк „Писковец“, гр. Пазарджик	103 571,00	103 571,00	ОБ	103 571,00										
253	Фитнес площадка в МБАЛ ЕСКУЛАП гр. Пазарджик	14 760,00	14 760,00	ОБ	14 760,00										
254	Детска площадка за МБАЛ ЕСКУЛАП, гр. Пазарджик	21 240,00	21 240,00	ОБ	21 240,00										
255	Изграждане детски площадки, с. Црънча	25 300,00	6 000,00	ДИ					6 000,00						
256	Отводняване на ул. „Бузлуджа“, с. Огняново	3 951,00	3 951,00	ОБ	3 951,00										
257	Придобиване на детска площадка в Парк „Градска градина“, гр. Пазарджик	5 466,00	5 466,00	ОБ	5 466,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
258	Санитарен контейнер за Парк „Градска градина“, гр. Пазарджик	13 560,00	13 560,00	ОБ	13 560,00										
259-271	Закупуване на технически устройства за Регионална библиотека, гр. Пазарджик - 13 дейности	36 898,00	36 898,00	ОБ и ЦБ	2 838,00		34 060,00								
272	Придобиване на косачка - мулчер, с. Хаджиево	1 600,00	1 600,00	ОБ	1 600,00										
273	Придобиване на климатици за спортни зали – „Младост“, „Хебър“, „В. Левски“, гр. Пазарджик	19 192,00	19 192,00	ОБ	19 192,00										
274	Детски съоръжения за игра, плувен комплекс „Балона“, гр. Пазарджик	7 452,00	7 452,00	ОБ	7 452,00										
275	Административен софтуер OneBook за детски градини, Пазарджик	16 100,00	16 100,00	ЦБ			16 100,00								
276	Отчужден имот в гр. Пазарджик за улици, Пазарджик	24 301,00	24 301,00	ОБ	24 301,00										
277	Отчужден имот в гр. Пазарджик - м. „Атчаир“, Община Пазарджик	57 360,00	57 360,00	ОБ	57 360,00										
278	Ремонт на северна ограда на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пазарджик	100 000,00	69 408,00	ЦБ			69 408,00								
279	Ремонт ВиК системи и улична мрежа - ул. „Стефан Караджа“, Пазарджик	109 370,00	109 370,00	ЦБ			109 370,00								
280	Ремонт на ул. „Стефан Караджа“, Община Пазарджик	2 162 000,00	2 161 851,00	ОБ и ДИ	67 420,00				2 094 431,00						
281	Ремонт на ул. „Кочо Честименски“, Община Пазарджик	854 823,00	905 570,00	ДИ					905 570,00						
282	Ремонт на ул. „Иван Чунчев“ о.т. 332-336, Пазарджик	60 509,00	60 509,00	ОБ и ЦБ	28 303,00		32 206,00								
283	Ремонт на ул. „Цар Калоян“, Община Пазарджик	752 000,00	752 000,00	ЦБ			752 000,00								
284	Ремонт на ВиК системи и улична мрежа – ул. „Цар Калоян“, гр. Пазарджик	231 626,00	231 626,00	ОБ и ЦБ	6 869,00		224 757,00								
285	Ремонт на ВВМ ул. „Иван Чунчев“, Община Пазарджик	8 931,00	8 931,00	ОБ	8 931,00										
286	Ремонт на ВиК системи и улична мрежа - ул. „Кочо Честименски“, гр. Пазарджик	76 204,00	76 204,00	ЦБ			76 204,00								
287	ТП Паркоустройство на част от остров „Свобода“, община Пазарджик	16 800,00	16 800,00	ОБ	16 800,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
288	Рехабилитация и модернизация на системите за външно осветление на главни пътни артерии, общ. Пазарджик	839 798,00	839 798,00	ПВЕЕЕС		839 798,00									
289	Основен ремонт на покрив на НЧ „Пробуда-1926“, с. Сарая	59 000,00	55 808,00	ОБ	55 808,00										
290	ВиК инсталация в плувен комплекс „Балона“, гр. Пазарджик	57 926,00	57 926,00	ОБ	57 926,00										
291	Компютър за ДГ „Здравец“, гр. Пазарджик	1 694,00	1 694,00	ЦБ			1 694,00								
292-299	Закупуване на инвентар за ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пазарджик - 8 дейности	55 332,00	55 332,00	ФЕС и ЦБ		13 965,00	41 367,00								
300-304	Закупуване на технически устройства за ДГ „Калина Малина“, гр. Пазарджик - 5 дейности	29 495,00	29 495,00	ЦБ			29 495,00								
305	Пожароизвестителна техника за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре	10 273,00	13 606,00	ОБ	13 606,00										
306-308	Система за видеонаблюдение за ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Пазарджик - 3 дейности	3 957,00	3 957,00	ЦБ			3 957,00								
309-314	Закупуване на технически устройства за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре - 6 дейности	23 559,00	23 559,00	ЦБ			23 559,00								
315-317	Закупуване на инвентар за ДГ „Снежанка“, гр. Пазарджик - 3 дейности	24 493,00	24 493,00	ЦБ			24 493,00								
318	Придобиване на система за видеонаблюдение, изнесена група на ДГ „Калина Малина“, с. Юнаците	2 622,00	2 622,00	ЦБ			2 622,00								
319	Придобиване на система за видеонаблюдение за ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пазарджик	2 000,00	2 000,00	ЦБ			2 000,00								
320	Придобиване на система за видеонаблюдение за СУ „Димитър Гачев“, гр. Пазарджик	4 973,00	4 973,00	ЦБ			4 973,00								
321	Придобиване на система за видеонаблюдение за ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик	8 119,00	8 119,00	ЦБ			8 119,00								
322	Комбинирано детско съоръжение за ДГ „Върбица“, гр. Пазарджик	3 192,00	3 192,00	ЦБ			3 192,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
323-324	Стопански инвентар за ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик - 2 дейности	89 700,00	89 700,00	ЦБ			89 700,00								
325-331	Закупуване на кухненско оборудване за ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Пазарджик - 7 дейности	30 932,00	30 932,00	ЦБ			30 932,00								
332-334	Закупуване на кухненско оборудване за ДГ „Юрий Гагарин“, гр. Пазарджик - 3 дейности	20 582,00	20 582,00	ЦБ			20 582,00								
335-339	Закупуване на кухненско оборудване за ДГ „Пролет“, гр. Пазарджик - 5 дейности	12 331,00	8 174,00	ЦБ			8 174,00								
340	Класна стая на открито за ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая	5 296,00	5 296,00	ДИ					5 296,00						
341	Беседка на открито в ОУ „Христо Ботев“, с. Юнаците	5 850,00	5 850,00	ДИ					5 850,00						
342-345	Закупуване на климатици за социални услуги - 4 дейности	12 705,00	12 705,00	ОБ и ЦБ	8 556,00		4 149,00								
346	Придобиване на парен котел за ЦНСТ, Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик	12 426,00	12 426,00	ЦБ			12 426,00								
347	Закупуване на мотоерен хрсторез, парк Балона	3 240,00	3 240,00	ОБ	3 240,00										
348	Закупуване на моторна косачка, парк Балона	1 920,00	1 920,00	ОБ	1 920,00										
349	Верижен робот - ул. „Запрян Цоков“, Пазарджик	9 400,00	9 400,00	ФЕС		9 400,00									
350	Фотоволтоична инсталация ВЕИ, Община Пазарджик	89 136,00	89 136,00	ФЕС		89 136,00									
351	Закупуване на прътова кръстачка парк „Стадиона“, Пазарджик	2 027,00	2 027,00	ОБ	2 027,00										
352	Разширение на ПСОВ (азот и фосфор), Пазарджик	8 441 525,00	4 216 871,00	ОБ и ДИ	2 960,00				4 213 911,00						
353	Придобиване на входна арка, с. Паталеница	33 480,00	33 480,00	ОБ	33 480,00										
354	Изграждане на уличен водопровод и канализация, Приют за лица, Община Пазарджик	50 113,00	3 720,00	ОБ	3 720,00										
355	Регионално депо за неопасни отпадъци кл. I, Пазарджик	858 889,00	604 416,00	ОБ, ЦБ и ДИ	104 416,00		200 000,00		300 000,00						
356	Закупуване на климатик за Регионална библиотека, Пазарджик	2 592,00	2 592,00	ЦБ			2 592,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
357	Закупуване на компютърно записващо устройство за камери, Плувен комплекс „Балона“	1 236,00	1 236,00	ОБ	1 236,00										
358	Закупуване на котел за нуждите на Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик	7 270,00	7 270,00	ЦБ			7 270,00								
359-360	Закупуване на циркуляционна термо помпа и котел, Спортна зала „В. Левски“ - 2 дейности	55 674,00	55 674,00	ОБ	55 674,00										
361	Придобиване на климатик за СК „Балона“, Пазарджик	1 626,00	1 626,00	ОБ	1 626,00										
362	Придобиване на входна контролна система за Регионална библиотека, Пазарджик	12 790,00	12 790,00	ЦБ			12 790,00								
363	Придобиване на работна станция за обслужване на читатели, Регионална библиотека, Пазарджик	18 976,00	18 975,00	ЦБ			18 975,00								
364	Придобиване на система за видеонаблюдение за РИМ, Пазарджик	17 191,00	17 191,00	ЦБ			17 191,00								
365	Придобиване на детски съоръжение, Община Пазарджик	35 994,00	17 997,00	ОБ	17 997,00										
366	Придобиване на навес за НЧ „Просвета-1929“, с. Мало Конаре	5 583,00	5 583,00	ОБ	5 583,00										
367	Придобиване на софтуер за Регионална библиотека, Пазарджик	10 000,00	10 000,00	ЦБ			10 000,00								
368	Придобиване на софтуер библиографии за Регионална библиотека, Пазарджик	600,00	600,00	ЦБ			600,00								
369	Придобиване на поземлен имот №55155.508.761, ул. „Заводска“, гр. Пазарджик	144 400,00	144 400,00	ОБ	144 400,00										
370	Придобиване на поземлен имот №55155.12.99, Гробищен парк, Пазарджик	17 000,00	17 000,00	ОБ	17 000,00										
371	Основен ремонт на поливна система за ДГ „Калина Малина“, гр. Пазарджик	26 839,00	26 839,00	ЦБ			26 839,00								
372	Преустройство на част от сграда А на ДГ „Калина Малина“, гр. Пазарджик	98 490,00	98 490,00	ЦБ			98 490,00								
373	Ремонт на ВиК ул. „Стефан Караджа“, гр. Пазарджик	28 693,00	28 693,00	ОБ	28 693,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
374	Ремонт на ул. „Генерал Гурко“ от ул. „Васил Левски“ до ул. „Ованес Соваджиян“, Община Пазарджик	397 749,00	397 749,00	ЦБ			397 749,00								
375	Ремонт на ул. „Цар Калоян“ от бул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Константин Величков“, Община Пазарджик	391 899,00	391 899,00	ЦБ			391 899,00								
376	Ремонт на ул. „Никифор П. Константинов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Кочо Честименски“, Община Пазарджик	458 610,00	458 610,00	ЦБ			458 610,00								
377	Ремонт на ул. „Васил Левски“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Стефан Караджа“, Община Пазарджик	810 941,00	810 941,00	ЦБ			810 941,00								
378	ВиК по ул. „Никофор П. Константинов“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Кочо Честименски“, Община Пазарджик	131 425,00	128 245,00	ОБ и ЦБ	1 644,00		126 601,00								
379	Придобиване на метален навес, с. Сарая	2 988,00	2 988,00	ОБ	2 988,00										
380	Закупуване на модулни къщички за коледен базар, Община Пазарджик	23 040,00	23 040,00	ОБ	23 040,00										
381-384	Закупуване на технически устройства за ДГ „Слънчо“, гр. Пазарджик - 4 дейности	26 397,00	26 397,00	ЦБ			26 397,00								
385-387	Закупуване на инвентар за ДГ „Здравец“, гр. Пазарджик - 3 дейности	25 389,00	25 389,00	ЦБ			25 389,00								
388-391	Закупуване на технически устройства за ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Пазарджик - 4 дейности	30 509,00	30 509,00	ЦБ			30 509,00								
392	Закупуване на дигитален ЛЕД дисплей, Пазарджик	4 303,00	4 303,00	ФЕС		4 303,00									
393-398	Закупуване на технически устройства за ЕГ „Берголт Брехт“ - 6 дейности	27 618,00	27 618,00	ФЕС и ЦБ		13 161,00	14 457,00								
399-408	Закупуване на технически устройства за НУ „Отец Паисий“ - 10 дейности	39 825,00	39 825,00	ФЕС и ЦБ		12 981,00	26 844,00								
409-411	Закупуване на технически устройства за СУ „Петър Берон“, гр. Пазарджик - 3 дейности	15 315,00	15 315,00	ЦБ и ФЕС		13 965,00	1 350,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
412	Придобиване на система за видеонаблюдение за ДГ „Слънчо“, гр. Пазарджик	3 932,00	3 932,00	ЦБ			3 932,00								
413	Придобиване на система за видеонаблюдение в НУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черногорово	2 112,00	2 112,00	ЦБ			2 112,00								
414-415	Комбинирано съоръжение за игра за ДГ „Радост“, гр. Пазарджик - 2 дейности	5 634,00	5 634,00	ЦБ			5 634,00								
416	Холова гарнитура за НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик	2 169,00	2 169,00	ЦБ			2 169,00								
417	Закупуване на мека мебел за ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая	1 366,00	1 366,00	ЦБ			1 366,00								
418-423	Придобиване на инвентар за ДГ „Веселка“, с. Ивайло - 6 дейности	20 267,00	20 267,00	ЦБ			20 267,00								
424-426	Придобиване на кухненско оборудване за ДГ „Радост“, гр. Пазарджик - 3 дейности	8 404,00	8 404,00	ЦБ			8 404,00								
427	Комбинирано детско съоръжение за ДГ „Слънчо“, гр. Пазарджик	12 944,00	12 944,00	ЦБ			12 944,00								
428	Придобиване на беседка за ДГ „Веселка“, с. Ивайло	3 500,00	3 500,00	ЦБ и ДИ			2 050,00		1 450,00						
429	Комбинирано детско съоръжение ДГ „Веселка“, с. Ивайло	4 000,00	4 000,00	ЦБ и ДИ			1 700,00		2 300,00						
430-437	Закупуване на технически устройства за ОУ „Васил Левски“, с. Звъничево - 8 дейности	28 314,00	28 314,00	ЦБ			28 314,00								
438	Изграждане на детски кът в с. Звъничево	38 361,00	38 361,00	ОПМДР		38 361,00									
439	Придобиване на ограда на сметище, с. Звъничево	1 836,00	1 836,00	ОБ	1 836,00										
440	Ограда за гробищен парк, с. Звъничево	5 000,00	5 000,00	ОБ	5 000,00										
441	Навес тип барбекю за ОУ „Васил Левски“, с. Звъничево	16 605,00	16 605,00	ЦБ			16 605,00								
442	Изграждане на навес за сграда А на ДГ „Калина Малина“, гр. Пазарджик	7 046,00	7 046,00	ЦБ			7 046,00								
443-444	Придобиване на беседки за ДГ „Калина Малина“, гр. Пазарджик - 2 дейности	17 416,00	17 416,00	ЦБ			17 416,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	>2024
445-446	Придобиване на складови постройки за ДГ „Калина Малина“, гр. Пазарджик - 2 дейности	20 528,00	20 528,00	ЦБ			20 528,00								
447	Манекен за болнични грижи за нуждите на Медицински колеж	5 850,00	5 850,00	ОБ	5 850,00										
448-449	Придобиване на апаратура, мулажи и реброразширители, Пазарджик - 2 дейности	40 669,00	40 669,00	ЦБ			40 669,00								
450	Придобиване на манекени, мулажи, ларингоскопи за обучение, гр. Пазарджик	40 530,00	20 265,00	ЦБ			20 265,00								
451-453	Преносим компютър, гр. Пазарджик (здравеопазване) - 3 дейности	5 706,00	5 666,00	ОБ и ЦБ	3 161,00		2 505,00								
454	Закупуване на тракторна косачка, с. Ивайло	2 500,00	2 500,00	ОБ	2 500,00										
455	Товарен автомобил за БМ „СУОПКД“ - Пазара, Пазарджик	35 760,00	35 760,00	ОБ	35 760,00										
456	Поливна и отточна система в парк, БМ „СУОПКД“ – Пазара, Пазарджик	49 300,00	49 300,00	ОБ	49 300,00										
457-458	Модулна тоалетна за градски пазар, БМ „СУОПКД“ – Пазара, Пазарджик - 2 дейности	84 336,00	42 168,00	ОБ	42 168,00										
459	Поливна система на кръгово кръстовище, БМ „СУОПКД“ - Пазара, Пазарджик	5 809,00	5 809,00	ОБ	5 809,00										
460-465	Закупуване на инвентар за БМ „СУОПКД“ – Пазара, Пазарджик - 6 дейности	36 057,00	36 057,00	ОБ	36 057,00										
466	ВиК на улици „4-та“ и „10-та“, с. Драгор	20 348,00	20 348,00	ОБ	20 348,00										
467	Вертикална планировка на парк, с. Звъничево	46 099,00	40 892,00	ОБ	40 892,00										
468	Паркоустройствен проект за обществена зелена площ „Градините на света“, част от Парк-остров „Свобода“, по плана на гр. Пазарджик.	1 992 519,00	818 000,00	ОБ и ЦБ	18 000,00		800 000,00								
469	Изграждане на детски кът в с. Овчеполци, община Пазарджик	40 448,00	40 448,00	ОПМДР		40 448,00									
470	Ремонт на покрив в ОУ „Отец Паисий“, с. Гелеменово	305 543,00	152 772,00	ЦБ			152 772,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
471	Придобиване на Wi-Fi мрежа за ОУ „Отец Паисий“, с. Гелеменово	5 700,00	5 700,00	ЦБ			5 700,00								
472	Придобиване на беседки, с. Гелеменово	11 400,00	11 400,00	ОБ и ДИ	3 900,00				7 500,00						
473	Изграждане на детски кът в с. Гелеменово, община Пазарджик	45 647,00	45 647,00	ОПМДР		45 647,00									
474	Изграждане на детски кът в с. Мало Конаре, община Пазарджик	35 013,00	35 013,00	ОПМДР		35 013,00									
475	Изграждане на детски кът в с. Ивайло, община Пазарджик	35 133,00	35 133,00	ОПМДР		35 133,00									
476	Проект за вертикална планировка, парковоосветление, поливна система за „Градините на света“, Пазарджик	54 780,00	54 780,00	ОБ	54 780,00										
477	Закупуване на климатик за СОД „Маестро Георги Атанасов“, Пазарджик	1 800,00	1 800,00	ОБ	1 800,00										
478	Придобиване на поземлен имот ПИ 55155.508.456 Пазарджик, Община Пазарджик	43 470,00	43 470,00	ОБ	43 470,00										
479	Изграждане паметник на Св. Св. Константин и Елена, Община Пазарджик	147 057,00	95 000,00	ОБ	95 000,00										
480	Обществена сграда на ул. „Неофит Бозвели“ 29, Община Пазарджик	1 396 519,00	823 083,00	ЦБ			823 083,00								
481	Проект за консервация, реставрация и реконструкция на доходно здание на ул. „Пею Яворов“ 2, гр. Пазарджик	51 048,00	51 000,00	ЦБ			51 000,00								
482	Основен ремонт на покрив в НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик	358 341,00	358 341,00	ЦБ			358 341,00								
483	Реконструкция, основен ремонт корпус 1 и 2, пристройка на санитарни възли в ОУ „Христо Ботев“, с. Юнаците	888 613,00	888 613,00	ОБ и ЦБ	12 948,00		875 665,00								
484	Детски съоръжения за игра, с. Говедаре	14 136,00	14 136,00	ЦБ			14 136,00								
485	Разширяване водопровод, с. Говедаре	3 644,00	3 644,00	ОБ	3 644,00										
486	Придобиване на навес, с. Говедаре	12 388,00	12 388,00	ОБ	12 388,00										
487	Wi-Fi зона за ОУ „Отец Паисий“, с. Говедаре	9 960,00	9 960,00	ЦБ			9 960,00								
488	Основен ремонт на покрив на ОУ „Отец Паисий“, с. Говедаре	225 828,00	221 328,00	ЦБ			221 328,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
489	Основен ремонт на кухненски блок в сграда на ДГ „Зорница“, гр. Пазарджик	21 673,00	21 673,00	ЦБ			21 673,00								
490	Основен ремонт на ограда в ДГ „Зорница“, гр. Пазарджик	34 979,00	12 942,00	ЦБ			12 942,00								
491	Придобиване на поливна система за ДГ „Калина Малина“, гр. Пазарджик	35 881,00	35 881,00	ЦБ			35 881,00								
492	Преустройство на част от болнична сграда - СБАЛПФЗ, гр. Пазарджик	6 710,00	6 710,00	ДИ					6 710,00						
493	Основен ремонт на ул. „Одрин“, гр. Пазарджик	402 656,00	397 000,00	ЦБ			397 000,00								
494	Ремонт на ул. „Чавдар Войвода“, гр. Пазарджик	479 472,00	475 920,00	ОБ и ЦБ	240,00		475 680,00								
495	Ремонт на ул. „Отец Кирил“, гр. Пазарджик	158 334,00	154 800,00	ОБ и ЦБ	240,00		154 560,00								
496	Основен ремонт на улично осветление, гр. Пазарджик	1 467 498,00	1 462 218,00	ОБ и ДИ	1 389 107,00				73 111,00						
497	Основен ремонт на улица в кв. „Изток“, гр. Пазарджик	224 001,00	220 440,00	ОБ и ЦБ	240,00		220 200,00								
498	Основен ремонт на ул. „Болнична“ (преди сфетофар), гр. Пазарджик	136 701,00	134 538,00	ОБ и ЦБ	240,00		134 298,00								
499	Ремонт на ул. „Петър Бонев“ от №76 до №96, гр. Пазарджик	255 120,00	247 920,00	ЦБ			247 920,00								
500	Ремонт на ул. „Козлодуй“, гр. Пазарджик	365 716,00	356 597,00	ЦБ			356 597,00								
501	Ремонт на ул. „Цар Иван Асен II“, гр. Пазарджик	222 643,00	214 946,00	ЦБ			214 946,00								
502	Ремонт на ул. „Йордан Ненов“, гр. Пазарджик	176 376,00	171 576,00	ЦБ			171 576,00								
503	Ремонт ул. „Павел Бобеков“, гр. Пазарджик	312 501,00	308 850,00	ЦБ			308 850,00								
504-512	Проектиране на улици – ул. „Хаджи поп Тилев“, ул. „Верила“, ул. „Княз Борис I“, ул. „Георги Герасимов“, ул. „Стефан Захариев“, ул. „Никола Петрини“, ул. „Епископ Дионисий“, ул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Витоша“ – 9 дейности	50 000,00	50 000,00	ОБ	50 000,00										
513	Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на спортна зала „Хебър“, гр. Пазарджик	1 380 086,00	272 535,00	ОБ и ЦБ	88 876,00		183 659,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	>2024
514	Направа на обществена тоалетна, с. Мокрище	20 324,00	12 000,00	ЦБ			12 000,00								
515	Придобиване на система за видеонаблюдение, ОБС	1 654,00	1 654,00	ОБ	1 654,00										
516-517	Закупуване на климатици, гр. Пазарджик - 2 дейности	3 250,00	3 250,00	ОБ и ЦБ	2 000,00		1 250,00								
518	Придобиване на система за видеонаблюдение, с. Крали Марко	3 035,00	3 035,00	ОБ	3 035,00										
519	Закупуване на моторен трион, с. Мало Конаре	1 345,00	1 345,00	ОБ	1 345,00										
520	Закупуване на косачки, с. Сарая	1 300,00	1 300,00	ОБ	1 300,00										
521	Закупуване на автомобил, гр. Пазарджик	51 400,00	3 000,00	ЦБ			3 000,00								
522	Придобиване на алуминиева врата, гр. Пазарджик	1 000,00	1 000,00	ЦБ			1 000,00								
523	Закупуване на лаптоп за нуждите на ОУ „Стефан Захариев“, гр. Пазарджик	1 014,00	1 014,00	ЦБ			1 014,00								
524-526	Закупуване на инвентар за ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Мокрище - 3 дейности	15 710,00	15 710,00	ЦБ			15 710,00								
527-528	Закупуване на компютри за ДГ „Зорница“, гр. Пазарджик - 2 дейности	2 331,00	2 331,00	ЦБ			2 331,00								
529-530	Интерактивен дисплей и музикален дисплей за СУ „Димитър Гачев“, гр. Пазарджик - 2 дейности	13 415,00	13 415,00	ЦБ			13 415,00								
531	Закупуване на компютър за ДГ „Детство“, с. Мало Конаре	1 789,00	1 789,00	ЦБ			1 789,00								
532	Придобиване на Wi-Fi мрежа за ОУ „Кочо Честименски“, с. Пишигово	5 700,00	5 700,00	ЦБ			5 700,00								
533-534	Закупуване на лаптоп и секция за ДГ „Върбица“, гр. Пазарджик - 2 дейности	4 926,00	4 926,00	ЦБ			4 926,00								
535	Закупуване на лаптоп за ОДК, Пазарджик	1 927,00	1 927,00	ЦБ			1 927,00								
536	Придобиване на вентилационно оборудване за ДГ „Детелина“, с. Паталеница	2 520,00	2 520,00	ЦБ			2 520,00								
537	Придобиване на детска площадка за ДГ „Детство“, с. Мало Конаре	7 377,00	7 377,00	ЦБ			7 377,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	>2024
538	Закупуване на климатици, гр. Пазарджик	60 000,00	59 520,00	ЦБ			59 520,00								
539	Разширение на видеосистема за наблюдение на ДГ „Калина Малина“, гр. Пазарджик	6 115,00	6 115,00	ЦБ			6 115,00								
540	Придобиване на система за видеонаблюдение и сигнал за ДГ „Детство“, с. Мало Конаре	7 668,00	7 668,00	ЦБ			7 668,00								
541	Придобиване на пожароизвестителна система за нуждите на ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая	12 000,00	12 000,00	ЦБ			12 000,00								
542	Придобиване на работна маса с две мивки за ДГ „Зорница“, гр. Пазарджик	4 589,00	4 589,00	ЦБ			4 589,00								
543	Придобиване на беседка за ОУ „Васил Априлов“, с. Синитово	7 450,00	7 450,00	ЦБ			7 450,00								
544	Придобиване на беседки за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ивайло	7 200,00	7 200,00	ПУДООС					7 200,00						
545	Придобиване на автономна соларна система, Община Пазарджик	2 085,00	2 085,00	ФЕС		2 085,00									
546-548	Придобиване на площадки за ДГ „Веселка“, с. Ивайло - 3 дейности	88 015,00	88 015,00	ЦБ			88 015,00								
549	Придобиване на метална конструкция за съхранение на машини и съоръжения за ДГ „Калина Малина“, гр. Пазарджик	3 778,00	3 778,00	ЦБ			3 778,00								
550-551	Придобиване на беседка и пейка за НУ „Никола Фурнаджиев“, гр. Пазарджик - 2 дейности	6 585,00	6 585,00	ЦБ и ДИ			1 200,00		5 385,00						
552	Беседка за ОУ „Константин Величков“, с. Паталеница	6 900,00	6 900,00	ПУДООС					6 900,00						
553	Кутия за LED дисплей, Община Пазарджик	1 200,00	1 200,00	ФЕС		1 200,00									
554	Лаптопи, гр. Пазарджик	9 612,00	9 612,00	ФЕС		9 612,00									
555	Цветно многофункционално устройство, гр. Пазарджик	5 760,00	5 760,00	ФЕС		5 760,00									
556	Придобиване на система за паркиране, гр. Пазарджик	222 887,00	127 336,00	ОБ	127 336,00										
557	Придобиване на автовишка, гр. Пазарджик	74 400,00	74 400,00	ЦБ			74 400,00								
558	Рекултивация и закриване на старото депо, Пазарджик	4 870 710,00	1 125 567,00	ОБ и ДИ	88 292,00				1 037 275,00						

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	>2024
559	Детска площадка „Липа“, гр. Пазарджик	39 391,00	38 390,00	ЦБ			38 390,00								
560	Сцена пред кметството, с. Ивайло	23 199,00	23 199,00	ДИ					23 199,00						
561	Бетонова основа за детска площадка в парк „Стадиона“ (стадион „Беновски“), гр. Пазарджик	23 969,00	11 000,00	ОБ	11 000,00										
562	Вертикална планировка на парк, с. Паталеница	56 621,00	56 621,00	ДИ					56 621,00						
563	Изграждане на уличен водопровод, с. Мокрище	5 170,00	5 170,00	ОБ и ДИ	5 069,00				101,00						
564	Доставка и монтаж на соларни лампи в парк, с. Мокрище	6 942,00	6 942,00	ОБ	6 942,00										
565	Изготвяне на ПУП за изграждане на съединителен водопровод между селата Църнча и Дебращица	11 400,00	11 400,00	ОБ и ЦБ	1 400,00		10 000,00								
566	Хранителен водопровод, с. Църнча - Етап 1	79 487,00	79 448,00	ОБ и ЦБ	2 000,00		77 448,00								
567	Направа на ограда, с. Ивайло	9 285,00	9 285,00	ОБ	9 285,00										
568	Придобиване на метален павилион в ПИ 55155.508.7, гр. Пазарджик	25 070,00	25 070,00	ДИ					25 070,00						
569	Приобивна на навеси в парк, с. Хаджиево	3 894,00	3 894,00	ОБ	3 894,00										
570	Доставка и монтаж на метална ограда на ул. „Стоян Ангелов“, гр. Пазарджик	13 830,00	13 830,00	ОБ	13 830,00										
571	Закупуване на компютърна конфигурация за нуждите на СОД, Пазарджик	680,00	680,00	ОБ	680,00										
572	Тоалетни, кметство Сарая	6 500,00	6 500,00	ОБ	6 500,00										
573	Придобиване на система за видеонаблюдение, с. Пищигово	2 325,00	2 325,00	ОБ	2 325,00										
574	Закупуване на климатици за Регионален исторически музей, гр. Пазарджик	26 088,00	26 088,00	ЦБ			26 088,00								
575	Закупуване на климатици за Художествена галерия, Пазарджик	7 208,00	7 208,00	ЦБ			7 208,00								
576	Закупуване на климатик за нуждите на СОД, Пазарджик	1 300,00	1 300,00	ЦБ			1 300,00								
577	Изграждане, строителен надзор и авторски надзор на стена за урнополагане и вертикална планировка за гробищен парк, гр. Пазарджик	35 388,00	35 388,00	ОБ и ЦБ	388,00		35 000,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
578-580	Придобиване на инвентар за БМ „Паркинг и охрана“, Пазарджик - 3 дейности	14 830,00	14 830,00	ОБ	14 830,00										
581	Закупуване на автомобил за БМ „Паркинг и охрана“, Пазарджик	15 100,00	15 100,00	ОБ	15 100,00										
582-583	Придобиване на газоизвестителна система и автоматична паркинг бариера за СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик - 2 дейности	6 715,00	6 715,00	ЦБ			6 715,00								
584	Придобиване на система за видеонаблюдение, БМ „Паркинг и охрана“, Пазарджик	14 689,00	14 689,00	ОБ	14 689,00										
585	Закупуване на бояджийска система за пътна сигнализация, БМ „Паркинг и охрана“, Пазарджик	83 976,00	83 976,00	ОБ и ДИ	70 000,00				13 976,00						
586	Реконструкция на ГРК „Черногорово“ от км. 1+634 до км.4+878 от напоятелна система „Тополница“, община Пазарджик, област Пазарджик, „Напоятелни системи“ ЕАД - клон „Тополница“ (ОП 10)	7 970 251,69	3 752 843,81	ПРСР		3 752 843,81									
587	Реконструкция на мост-канал и дюкер под р. Луда Яна, община Пазарджик, област Пазарджик, „Напоятелни системи“ ЕАД - клон „Тополница“	2 263 633,49	999 799,92	ПРСР		999 799,92									
588	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап	3 693 119,17	2 177 461,00	ОПРР		2 177 461,00									
589	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – II етап	3 637 331,50	3 475 842,00	ОПРР		3 475 842,00									
590	Обновяване на сградата на читалище „Просвета-1947“ в с. Мирянци, община Пазарджик	39 854,65	38 111,00	ОПМДР		38 111,00									
591	Обновяване на сградата на читалище „Просвета-1929“ в с. Мало Конаре, община Пазарджик	39 925,45	39 609,00	ОПМДР		39 609,00									
592	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в спортна зала „Хебър“, гр. Пазарджик	1 751 532,18	0,00	НПВУ и ЧИ		0,00		0,00							

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
593	Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Пазарджик	157 138,33	0,00	ПОС		0,00									
594	Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на община Пазарджик и община Пещера	8 169 563,98	0,00	НПВУ		0,00									
595	Енергоефективна реконструкция и модернизация на системите за улично осветление в 12 населени места в Община Пазарджик	1 999 941,83	0,00	НПВУ		0,00									
596	Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Ангел Кънчев“ № 18, 20, 22, 24	1 749 343,86	0,00	НПВУ		0,00									
597	Доизграждане на канализационна и реконструкция на водопроводната мрежа - етап III на с. Ивайло, община Пазарджик	19 774 700,00	4 449 631,00	ЦБ и ДИ			3 708 026,00		741 605,00						
598	Изработване на работен/технически проект за основен ремонт на ул. „Георги Бенковски“ от ул. „Петър Бонев“ до ул. „Генерал Гурко“ в гр. Пазарджик	836 000,00	0,00	ЦБ			0,00								
599	Изработване на работен/технически проект за основен ремонт на ул. „Ивайловско шосе“ от ул. „Двадесет и девета“ в с. Ивайло (вход на с. Ивайло) до бул. „Георги Бенковски“ в гр. Пазарджик	406 500,00	0,00	ЦБ			0,00								
600	Изработване на работен/технически проект за основен ремонт на ул. „Пловдивска“ от ул. „Ген. Гурко“ до бул. „Стефан Стамболов“ в гр. Пазарджик	388 800,00	0,00	ЦБ			0,00								
601	Изработване на работен/технически проект за основен ремонт на бул. „България“ от ул. „Ген. Гурко“ до бул. „Стефан Стамболов“ в гр. Пазарджик	266 400,00	0,00	ЦБ			0,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	>2024
602	Изработване на работен/технически проект за основен ремонт на ул. „Генерал Гурко“ от ул. „Г. Бенковски“ до площад „Възраждане“ в гр. Пазарджик	226 000,00	0,00	ЦБ			0,00								
603	Изработване на работен/технически проект за основен ремонт на ул. „Димчо Дебелянов“ от ул. „Пловдивска“ до бул. „Стефан Стамболов“ в гр. Пазарджик	169 200,00	0,00	ЦБ			0,00								
604	Изработване на работен/технически проект за основен ремонт на ул. „Ал. Батенберг“ от ул. „Градинарска“ до бул. „България“ в гр. Пазарджик	122 400,00	0,00	ЦБ			0,00								
605	Инвестиции във водоснабдителната мрежата на община Пазарджик	130 883,00	130 883,00	ВиК					130 883,00						
606	Инвестиции в канализационната мрежата на община Пазарджик	54 593,00	54 593,00	ВиК					54 593,00						
607	Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик	48 699 163,01	2 724 019,40	ОПОС		2 724 019,40									
608	Проект за съединителен водопровод Църнча - Дебращица, с.Дебращица	23 500,00	23 500,00	ЦБ			23 500,00								
Стратегичека цел III: Осигуряване на благоприятна среда за развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез ефективни мерки за насърчаване на образованието, масовия спорт и социалното включване		50 352 072,65	23 812 586,20		2 059 052,00	11 065 471,47	10 547 307,00	116 870,73	23 885,00						
1	Игрище за хандбал в за СУ „Димитър Гачев“, гр. Пазарджик	10 082,00	10 082,00	ЦБ			10 082,00								
2	Сграда към стадион, с. Мирянци	59 995,00	59 995,00	ОБ	59 995,00										
3	Ремонт на спортен комплекс, Зона на Здравето	472 222,00	472 222,00	ОБ	472 222,00										
4	Придобиване на трибуни за стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	12 000,00	6 000,00	ОБ	6 000,00										
5	Ремонт на плувен комплекс „Балона“, гр. Пазарджик	1 236 100,00	1 236 100,00	ЦБ			1 236 100,00								
6	Изграждане на спортна зала в СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	1 296 123,00	843 003,00	ОБ и ЦБ	30 923,00		812 080,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
7	Закупуване на бойлер със серпентина за Средношколско общежитие	6 489,00	6 489,00	ОБ и ЦБ	6 000,00		489,00								
8-9	Закупуване на климатик за ОУ „Васил Априлов“, с. Синитово - 2 дейности	10 650,00	10 650,00	ЦБ			10 650,00								
10-12	Закупуване на климатици за СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик - 3 дейности	40 240,00	40 240,00	ЦБ			40 240,00								
13	Закупване на климатик за ДГ „Пролет“, гр. Пазарджик	2 400,00	2 400,00	ОБ	2 400,00										
14	Придобиване на спортна площадка за стрийт фитнес в Спортно Училище Пазарджик	5 160,00	5 160,00	ЦБ			5 160,00								
15-16	Закупуване на климатици за ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре - 2 дейности	3 500,00	3 500,00	ЦБ			3 500,00								
17-19	Закупуване на климатици за НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик - 3 дейности	9 520,00	9 520,00	ЦБ			9 520,00								
20	Закупуване на климатик за ОУ „Асен Златаров“, с. Черногорово	5 870,00	5 870,00	ЦБ			5 870,00								
21-25	Закупуване на спортни уреди за Спортно училище Пазарджик - 5 дейности	18 600,00	18 600,00	ЦБ			18 600,00								
26-30	Закупуване на компютри за Дом за стари хора - 5 дейности	14 342,00	12 117,00	ЦБ			12 117,00								
31	Закупуване на компютър за Център за временно настаняване	698,00	698,00	ЦБ			698,00								
32-36	Закупуване на инвентар за Дом за стари хора - 5 дейности	15 659,00	15 659,00	ОБ и ЦБ	1 652,00		14 007,00								
37	Придобиване на трибуни за съдии, плувен комплекс „Балона“, гр. Пазарджик	10 347,00	10 347,00	ОБ	10 347,00										
38-43	Закупуване на инвентар за стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик - 6 дейности	21 895,00	21 895,00	ОБ	21 895,00										
44	Закупуване на електрическа помпа със защитно табло за стадион, с. Црънча	2 225,00	2 225,00	ДИ					2 225,00						
45	Придобиване на автоматична напоителна система за стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	35 919,00	35 919,00	ОБ	35 919,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
46	Закупуване на помпа за плувен басейн, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик	1 499,00	1 498,00	ОБ	1 498,00										
47	Вертикална планировка, плувен басейн „Балона“, гр. Пазарджик	119 967,00	119 966,00	ОБ	119 966,00										
48	Аериране на спортен терен на стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	9 845,00	9 845,00	ОБ	9 845,00										
49	Фитнес площадка за стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	20 287,00	20 287,00	ОБ	20 287,00										
50	Придобиване на модул пейки за стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	26 376,00	26 376,00	ОБ	26 376,00										
51	Спортно игрище, с. Црънча	25 475,00	7 991,00	ДИ					7 991,00						
52	Придобиване на осветление за стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	19 713,00	19 713,00	ОБ	19 713,00										
53	Ремонт на спортна зала „Васил Левски“, гр. Пазарджик	365 570,00	365 570,00	ОБ и ЦБ	115 570,00		250 000,00								
54	Обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на спортна зала „Хебър“, гр. Пазарджик	15 000,00	12 000,00	ОБ	12 000,00										
55	Ремонт на плувен комплекс „Балона“ - Етап II, гр. Пазарджик	627 135,00	627 134,00	ОБ и ЦБ	98 065,00		529 069,00								
56-58	Закупуване на климатици за ДГ „Дъга“, гр. Пазарджик - 3 дейности	18 370,00	15 300,00	ЦБ			15 300,00								
59-60	Футболно и баскетболно игрище за ОУ „Константин Величков“, с. Паталеница - 2 дейности	64 496,00	64 496,00	ОБ	64 496,00										
61-65	Закупуване на климатици за ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая - 5 дейности	21 950,00	21 950,00	ЦБ			21 950,00								
66	Закупуване на климатик за СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик	1 430,00	1 430,00	ЦБ			1 430,00								
67-69	Закупуване на климатик за ОУ „Отец Паисий“, с. Говедаре - 3 дейности	8 000,00	8 000,00	ЦБ			8 000,00								
70	Придобиване на климатична система за ОУ „Кочо Честименски“, с. Пищигово	1 699,00	1 699,00	ЦБ			1 699,00								
71	Придобиване на климатична система за ДГ „Зорница“, гр. Пазарджик	10 995,00	10 995,00	ЦБ			10 995,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
72	Придобиване на инверторен климатик за ДГ „Валентина Терешкова“, гр. Пазарджик	4 920,00	4 920,00	ЦБ			4 920,00								
73-74	Придобиване на колони за волейбол и баскетболни модули за ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пазарджик - 2 дейности	8 249,00	8 249,00	ЦБ			8 249,00								
75	Закупуване на климатик за ДГ „Детство“, с. Мало Конаре	1 920,00	1 920,00	ЦБ			1 920,00								
76	Закупуване на климатици за ДГ „Детство“, с. Мало Конаре и с. Хаджиево	2 100,00	2 100,00	ЦБ			2 100,00								
77-80	Придобиване на компютри за Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик - 4 дейности	7 194,00	7 194,00	ОБ и ЦБ	1 000,00		6 194,00								
81-82	Придобиване на лаптоп и принтер за ЦПЛР, Пазарджик - 2 дейности	11 600,00	11 600,00	ЦБ			11 600,00								
83	Придобиване на зона за стрийт фитнес в парк, с. Черногорово	14 880,00	13 669,00	ДИ					13 669,00						
84-86	Закупуване на технически устройства за спортна зала „Васил Левски“, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик - 3 дейности	58 052,00	58 052,00	ОБ	58 052,00										
87	Закупуване на помпа за Общински плувен комплекс, гр. Пазарджик	3 392,00	3 392,00	ОБ	3 392,00										
88	Придобиване на електронно табло за баскетбол за спортна зала „Иван Симеонов“, гр. Пазарджик	7 500,00	7 500,00	ОБ	7 500,00										
89	Придобиване на мобилни баскетболни кошове за спортна зала „Иван Симеонов“, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик	39 600,00	39 600,00	ОБ	39 600,00										
90	Придобиване на трибуни за сектор „А“ на стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	718 512,00	718 370,00	ОБ и ЦБ	363 370,00		355 000,00								
91	Фасаден часовник спортен комплекс „Балона“, гр. Пазарджик	1 350,00	1 350,00	ОБ	1 350,00										
92-93	Робот за почистване на басейн в спортен комплекс „Балона“, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик - 2 дейности	26 120,00	26 120,00	ОБ	26 120,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
94	Стартови блокчета за спортен комплекс „Балона“, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик	33 600,00	33 600,00	ОБ	33 600,00										
95	Плувни коридори за спортен комплекс „Балона“, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик	24 600,00	24 600,00	ОБ	24 600,00										
96-97	Придобиване на маса за тенис на открито и футболни врати за минифутбол, ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик - 2 дейности	5 034,00	5 034,00	ЦБ			5 034,00								
98	Изграждане на помощни игрища с естествена трева на стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	152 485,00	21 072,00	ОБ	21 072,00										
99	Придобиване на спортна площадка, с. Мало Конаре	120 000,00	119 977,00	ЦБ			119 977,00								
100	Придобиване на парен котел за ДГ „Юрий Гагарин“, гр. Пазарджик	27 342,00	27 342,00	ЦБ			27 342,00								
101	Реконструкция на спортен комплекс в Зона на здравето, гр. Пазарджик	2 000 000,00	1 924 001,00	ЦБ			1 924 001,00								
102	Закупуване на циркулационна помпа парно за ОУ „Христо Смирненски“, гр. Пазарджик	11 894,00	11 894,00	ЦБ			11 894,00								
103	Закупуване на климатична система за ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Алеко Константиново	9 690,00	9 690,00	ЦБ			9 690,00								
104	Закупуване на климатик за ДГ „Детелина“, с. Паталеница	2 800,00	2 800,00	ЦБ			2 800,00								
105-106	Закупуване на климатици за ДГ „Детство“, с. Мало Конаре - 2 дейности	3 810,00	3 810,00	ЦБ			3 810,00								
107	Закупуване на климатик за ОУ „Христо Ботев“, с. Братаница	2 119,00	2 119,00	ЦБ			2 119,00								
108	Придобиване на спортна площадка, с. Звъничево	6 849,00	6 849,00	ОБ	6 849,00										
109	Изграждане на училищна STEM среда и ВОКС в ОУ „Васил Левски“, с. Звъничево	136 041,34	0,00	НПВУ		0,00									
110-112	Придобиване на климатик, ОУ „Васил Левски“, с. Звъничево - 3 дейности	4 999,00	4 999,00	ЦБ			4 999,00								
113	Закупуване на климатик за ДГ „Калина Малина“, гр. Пазарджик	4 840,00	4 840,00	ЦБ			4 840,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
114	Закупуване на акордеон за нуждите на Младежки дом, Пазарджик	2 000,00	2 000,00	ОБ	2 000,00										
115	Компютърна конфигурация за нуждите на Асистентска подкрепа, Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик	1 165,00	1 165,00	ЦБ			1 165,00								
116-117	Компютърна конфигурация за нуждите на ЦНСТ, Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик - 2 дейности	1 915,00	1 915,00	ЦБ			1 915,00								
118	Пристройка към пенсионерски клуб, с. Синитово	59 996,00	59 993,00	ОБ	59 993,00										
119	Придобиване на климатик за клуб на пенсионера, Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик	13 400,00	13 400,00	ОБ	13 400,00										
120	Придобиване на кислороден концентратор за Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик	1 290,00	1 290,00	ЦБ			1 290,00								
121	Придобиване на електрически лифтер, Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик	1 680,00	1 680,00	ЦБ			1 680,00								
122	Придобиване на климатици за клубове на пенсионера	2 800,00	2 800,00	ОБ	2 800,00										
123	Придобиване на самопочистващ модул, Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик	6 314,00	6 314,00	ЦБ			6 314,00								
124	Закупуване на вендинг машина, Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик	7 320,00	7 320,00	ОБ	7 320,00										
125	Придобиване на автомобил, Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик	19 800,00	19 800,00	ЦБ			19 800,00								
126-127	Придобиване на инвентар за Дом за стари хора, Дирекция „Социални дейности“, Пазарджик - 2 дейности	8 699,00	8 699,00	ЦБ			8 699,00								
128	Електрическо хранване за спортна зала „Иван Симеонов“, гр. Пазарджик	56 260,00	28 130,00	ОБ	28 130,00										
129-130	Придобиване на метална конструкция за табло и LED табло за стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик - 2 дейности	57 616,00	57 616,00	ОБ	57 616,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
131	Закупуване на помпа за помощни игрища за стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик	14 760,00	11 760,00	ОБ	11 760,00										
132	Закупуване на LED прожектори за нуждите на спортна зала „Васил Левски“, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик	10 152,00	10 152,00	ОБ	10 152,00										
133	Проект за външно кабелно захранване на стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	1 560,00	1 560,00	ОБ	1 560,00										
134	Система за осветление на стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик	1 674 100,00	1 303 248,00	ОБ и ЦБ	48,00		1 303 200,00								
135	Ефектно осветление в спортна зала „Васил Левски“, гр. Пазарджик	219 930,00	50 000,00	ОБ	50 000,00										
136	Закупуване на бойлер за спортен комплекс „Балона“, гр. Пазарджик, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик	7 074,00	7 074,00	ОБ	7 074,00										
137-145	Закупуване на спортни съоръжения за спортна зала „Васил Левски“, БМ „СПЖФНСИ“ - Жилфонд, Пазарджик - 9 дейности	30 840,00	30 840,00	ОБ	30 840,00										
146	Основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Асен Златаров“, с. Черногорово	45 999,00	3 759,00	ЦБ			3 759,00								
147	Основен ремонт на спортни площадки в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пазарджик	413 820,00	126 360,00	ЦБ			126 360,00								
148	Изграждане на физкултурен салон в НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик	866 469,00	715 993,00	ЦБ			715 993,00								
149	Изграждане на физкултурен салон в ОУ „Отец Паисий“, с. Говедаре	769 940,00	724 185,00	ЦБ			724 185,00								
150	Изграждане на физкултурен салон в НУ „Васил Друмев“, гр. Пазарджик	871 544,00	729 708,00	ЦБ			729 708,00								
151	Изграждане физкултурен салон в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик	1 536 316,00	802 591,00	ЦБ			802 591,00								
152	Закупуване на климатик, ДГ „Здравец“, гр. Пазарджик	4 800,00	4 800,00	ЦБ			4 800,00								

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	>2024
153	Придобиване на баскетболен кош за ОУ „Стефан Захариев“, гр. Пазарджик	2 988,00	2 988,00	ЦБ			2 988,00								
154-156	Придобиване на климатици за ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Пазарджик - 3 дейности	33 450,00	33 450,00	ЦБ			33 450,00								
157	Закупуване на климатик за ДГ „Радост“, гр. Пазарджик	2 440,00	2 440,00	ЦБ			2 440,00								
158-159	Придобиване на климатична система и климатик за ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик - 2 дейности	8 150,00	8 150,00	ЦБ			8 150,00								
160	Закупуване на климатик за ОУ „Отец Паисий“, с. Огняново	7 545,00	7 545,00	ЦБ			7 545,00								
161	Придобиване на устройство за изкачване на стълби за инвалиди за ОУ „Отец Паисий“, с. Огняново	5 400,00	5 400,00	ЦБ			5 400,00								
162	Закупуване на инверторен климатик за ДГ „Снежанка“, гр. Пазарджик	2 430,00	2 430,00	ЦБ			2 430,00								
163	Закупуване на климатик за ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик	1 099,00	1 099,00	ЦБ			1 099,00								
164	Придобиване на климатик за ДГ „Слънчо“, гр. Пазарджик	15 555,00	15 555,00	ЦБ			15 555,00								
165	Закупуване на климатик за НУ „Никола Фурнаджиев“, гр. Пазарджик	4 150,00	4 150,00	ЦБ			4 150,00								
166	Придобиване на климатик за устройства за СУ „Петър Берон“, гр. Пазарджик	4 972,00	4 972,00	ЦБ			4 972,00								
167	Закупуване на климатик за ОУ „Христо Смирненски“, гр. Пазарджик	1 700,00	1 700,00	ЦБ			1 700,00								
168	Закупуване на мрежа за НУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черногорово	2 040,00	1 200,00	ЦБ			1 200,00								
169	Придобиване на маса за тенис на открито за ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Алеко Константиново	1 656,00	1 656,00	ЦБ			1 656,00								
170	Изграждане на спортна площадка в НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик	183 171,00	183 171,00	ЦБ			183 171,00								
171	Изграждане на открито комбинирани детски площадки (хандбал, футбол, баскетбол, волейбол и лека атлетика), ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик	302 299,00	293 553,00	ЦБ			293 553,00								
172	Генератор за стадион „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	32 184,00	32 184,00	ОБ	32 184,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	>2024
173-174	Закупуване на тенис маса и бягаща пътека за ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик - 2 дейности	2 344,00	2 344,00	ЦБ			2 344,00								
175	Придобиване на пясъчник - малък басейн, Спортен комплекс „Балона“, гр. Пазарджик	18 930,00	18 930,00	ОБ	18 930,00										
176	Дървена беседка с пейки и маса, Спортен комплекс „Балона“, гр. Пазарджик	3 572,00	3 571,00	ОБ	3 571,00										
177	Устойчиво реализиране и предлагане на пазара на ICYou (Interactive Care for You) - интерактивна платформа за контрол и регулация на приема на медикаменти и режим от медицински специалисти и пациенти	171 028,00	171 028,00	ОПИК и ЧИ		136 822,40		34 205,60							
178	Реализиране на предприемаческа идея, чрез издаване и разпространение на интерактивна електронна книга „Безопасни на пътя“ (Road Safety) - помагало за допълващо самообучение на всички участници в движението - кандидат-водители и водители на ППС, пешеходци и особено деца, колхозници и лица с трайни увреждания, с цел повишаване на базова подготовка и уменията за справяне в критичните ситуации на пътя	240 547,69	212 759,69	ОПИК и ЧИ		170 206,78		42 552,91							
179	Популяризиране и подобряване на имиджа на територията на МИРГ Пазарджик в сферата на водните спортове	58 041,52	58 041,52	ОПМДР		58 041,52									
180-181	Устойчива заетост за хора в неравностойно положение - 2 проекта	766 700,00	0,00	ПРЧР		0,00									
182	Създаване и развитие на Център за социално развитие и рехабилитация	227 256,11	200 524,19	ОПИК и ЧИ		160 411,97		40 112,22							
183	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОКС) в ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик	359 273,40	0,00	НПВУ		0,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
184	Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в община Пазарджик	390 219,52	140 705,03	ПРЧР		140 705,03									
185	Активно приобщаване с обучения за ефективна заетост на целеви групи в риск за мобилни терапевти в резидентни услуги	130 358,64	19 702,87	ПРЧР		19 702,87									
186	Нови работни места и кариерно развитие за хора в неравностойно положение в сферата на търговията в гр. Пазарджик	227 719,80	0,00	ПРЧР		0,00									
187	Изграждане на училищна STEM среда в НУ „Георги Сава Раковски“, гр. Пазарджик	181 798,63	26 396,15	НПВУ		26 396,15									
188	Създаване на училищна STEM среда в НУ „Васил Друмев“, гр. Пазарджик	252 446,03	0,00	НПВУ		0,00									
189	Изграждане на училищна STEM среда в НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик	252 499,87	75 912,31	НПВУ		75 912,31									
190	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (БОКС) в НУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Черногорово	181 799,91	46 881,20	НПВУ		46 881,20									
191	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (БОКС) в НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик	252 446,75	62 242,32	НПВУ		62 242,32									
192	Проект „Услуги в дома“ (Процедура Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2)	508 172,48	90 403,15	ОПРЧР		90 403,15									
193	Разкриване на социална услуга „Център за работа с деца на улицата“ в Община Пазарджик	447 432,60	447 432,60	ОПРЧР		447 432,60									
194	Разкриване на социална услуга „Приют за пълнолетни лица“ в Община Пазарджик	153 891,40	153 891,40	ОПРЧР		153 891,40									
195	Патронажна грижа + в община Пазарджик	447 813,92	447 813,92	ОПРЧР		447 813,92									
196	Патронажна грижа + в община Пазарджик - Компонент 2	222 489,22	222 489,22	ОПРЧР		222 489,22									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
197	Ремонт и рехабилитация на Средношколско общежитие в гр. Пазарджик	3 538 656,97	42 792,00	НПВУ		42 792,00									
198	Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик	1 439 279,98	1 391 988,00	ОПРР		1 391 988,00									
199	Проект „Услуги в дома“ (Процедура - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4)	225 624,21	225 624,21	ОПРЧР		225 624,21									
200	Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пазарджик	317 655,25	317 655,25	ОПХ		317 655,25									
201	Топъл обяд в Община Пазарджик	706 282,94	354 450,62	ПХОМП		354 450,62									
202	Грижа в дома в община Пазарджик	1 572 805,36	1 572 805,36	ПРЧР		1 572 805,36									
203	Център за ранна интервенция - Пазарджик	387 000,00	152 352,28	ПРЧР		152 352,28									
204	Обновяване и модернизиране на материално-техническата база в Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич“, гр. Пазарджик	5 484 664,27	1 096 932,85	НПВУ		1 096 932,85									
205	Обновяване и модернизиране на материално-техническата база в Дом за стари хора – с. Главиница, община Пазарджик	2 119 241,85	423 848,37	НПВУ		423 848,37									
206	Проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик“	1 034 726,67	474 759,58	ОПРЧР		474 759,58									
207	Концепция за изграждане на училищна STEM среда и ВОКС в ОУ „Кочо Честименски“, гр. Пазарджик	181 633,02	51 660,97	НПВУ		51 660,97									
208	Изграждане на училищна STEM среда НУ „Никола Фурнаджиев“, гр. Пазарджик	180 984,90	33 918,17	НПВУ		33 918,17									
209	Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по промишлени технологии, гр. Пазарджик	181 314,77	0,00	НПВУ		0,00									
210	Създаване на STEM център ОУ „Стефан Захариев“, гр. Пазарджик	181 798,79	41 115,19	НПВУ		41 115,19									
211	Създаване на STEM център в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Пазарджик	252 441,42	0,00	НПВУ		0,00									
212	Създаване на STEM център ОУ „Асен Златаров“, с. Черногорово	181 798,79	44 781,49	НПВУ		44 781,49									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
213	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Васил Априлов“, с. Синитово	60 509,82	17 312,49	НПВУ		17 312,49									
214	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Васил Левски“, с. Величково	60 407,86	22 610,91	НПВУ		22 610,91									
215	Изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Георги Бенковски“, с. Хаджиево	60 598,14	0,00	НПВУ		0,00									
216	Концепция за изграждане на STEM среда в ОУ „Константин Величков“, с. Паталеница	181 738,57	45 364,72	НПВУ		45 364,72									
217	Концепция за изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ивайло	181 491,79	45 340,52	НПВУ		45 340,52									
218	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Климент Охридски“, с. Мокрище	60 599,82	59 945,21	НПВУ		59 945,21									
219	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пазарджик	252 498,16	90 682,04	НПВУ		90 682,04									
220	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Отец Паисий“, с. Говедаре	181 784,57	68 044,19	НПВУ		68 044,19									
221	Изграждане на училищна STEM среда в училище ОУ „Отец Паисий“, с. Огняново	181 764,73	159 036,03	НПВУ		159 036,03									
222	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Отец Паисий“, с. Гелеменово	181 798,05	32 224,88	НПВУ		32 224,88									
223	Изграждане на училищна STEM среда в училище в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик	363 600,00	0,00	НПВУ		0,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
224	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (БОСКС) в ОУ „Климент Охридски“, с. Алеко Константиново	181 800,00	46 887,50	НПВУ		46 887,50									
225	Изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Конаре	181 711,65	30 248,79	НПВУ		30 248,79									
226	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (БОСКС) в ОУ „Св. св. Кирил и Методи“, гр. Пазарджик	181 694,95	177 587,87	НПВУ		177 587,87									
227	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (БОСКС) в ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая	180 877,87	67 648,12	НПВУ		67 648,12									
228	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (БОСКС) в ОУ „Христо Ботев“, с. Главиница	60 599,94	0,00	НПВУ		0,00									
229	Изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Христо Ботев“, гр. Пазарджик	181 733,48	0,00	НПВУ		0,00									
230	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (БОСКС) в ОУ „Христо Ботев“, с. Юнаците	59 482,12	0,00	НПВУ		0,00									
231	Дейности за изпълнение на процедура BG-RRP-1.015-„Училищна STEM среда“ за изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Христо Ботев“ – с. Братаница, общ. Пазарджик, област Пазарджик, за създаване на STEM център „Технологични умения за иновации и творческо дизайн мислене“, който включва три високотехнологично оборудвани свързани класни стаи по направление 2 „Дизайн и 3D Прототипиране“	136 350,00	0,00	НПВУ		0,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
232	Изграждане на училищна STEM среда и ВОСКС в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик	363 128,57	0,00	НПВУ		0,00									
233	Изграждане на училищна STEM среда в Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Пазарджик	363 527,46	0,00	НПВУ		0,00									
234	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик	362 697,57	0,00	НПВУ		0,00									
235	Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик	3 172 899,15	169 436,23	НПВУ		169 436,23									
236	Училищна STEM среда в Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик	181 793,39	0,00	НПВУ		0,00									
237	Проект „Поощрителен пазар за образование на територията на област Пазарджик	529 508,96	529 508,96	ОПНОИР		529 508,96									
238	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство, гр. Пазарджик	180 752,77	80 532,28	НПВУ		80 532,28									
239	Създаване на училищна STEM среда в Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик	360 558,04	0,00	НПВУ		0,00									
240	Изграждане на училищна STEM среда в ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик	271 439,10	0,00	НПВУ		0,00									
241	Изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Пазарджик	252 500,00	0,00	НПВУ		0,00									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
242	Проект „Образование за културно многообразие“	396 901,59	396 901,59	ОПНОИР		396 901,59									
243	Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и обучение на образователни медиатори в 15 училища и детски градини	48 977,00	48 977,00	ОПНОИР		48 977,00									
244	Изграждане на училищна STEM среда в Спортно училище Пазарджик	252 498,45	168 266,84	НПВУ		168 266,84									
245	Изграждане на училищна STEM среда в направление „Математика и Информатика“ в СУ „Димитър Гачев“, гр. Пазарджик	252 500,00	0,00	НПВУ		0,00									
246	Изграждане на училищна STEM среда в СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик	363 503,65	0,00	НПВУ		0,00									
247	Изграждане на Училищна STEM среда в СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик	363 590,95	0,00	НПВУ		0,00									
248	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в СУ „Петър Берон“, гр. Пазарджик	363 578,53	0,00	НПВУ		0,00									
249	Проект „Специализирани услуги за деца от ромски общности в конфликт или контакт със закона“	252 436,63	248 394,92	Програма „Правосъдие“		248 394,92									
250	Проект „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда от училища в Ракитово, Септември, Разград, Лозница, Симеоновград, Хаджиево“	5 777,64	5 777,64	ОПНОИР		5 777,64									
251	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ЦСОП, гр. Пазарджик	181 647,66	70 705,56	НПВУ		70 705,56									

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
Стратегическа цел IV: Модерно и устойчиво самоуправление за ускоряване социално-икономическото развитие на общината чрез качествено обслужване на бизнеса, на неговите организации и на населението, подобряване на институционалната среда и административния капацитет		593 841,50	328 936,31		199 475,00	58 050,31	71 411,00	0,00	0,00						
1	Закупуване на компютър, Пазарджик	17 616,00	17 616,00	ОБ	17 616,00										
2	Закупуване на компютър, с. Говедаре	1 020,00	1 020,00	ОБ	1 020,00										
3	Компютърна конфигурация, ОИЦ Пазарджик	2 019,00	2 019,00	ФЕС		2 019,00									
4	Закупуване на банкнотоброячна машина, Община Пазарджик	1 380,00	1 380,00	ОБ	1 380,00										
5-6	Закупуване на автомобил - 2 дейности	19 310,00	19 310,00	ОБ	19 310,00										
7	Общ устройствен план на община Пазарджик	242 459,00	86 983,00	ОБ и ЦБ	38 491,00		48 492,00								
8	Закупуване на компютър, с. Цар Асен	780,00	780,00	ОБ	780,00										
9-11	Закупуване на компютърна конфигурация и принтери за Община Пазарджик - 3 дейности	14 934,00	14 934,00	ОБ	14 934,00										
12-13	Закупуване на лаптоп и компютър за МКБПМН - 2 дейности	2 183,00	2 183,00	ЦБ			2 183,00								
14	Закупуване на компютър за Дирекция „Местни данъци и такси“	750,00	750,00	ОБ	750,00										
15	Закупуване на компютърна система, Община Пазарджик (Трафик на хора)	858,00	858,00	ОБ	858,00										
16	Конфигуриране и инсталация на защитна стена, Община Пазарджик	35 766,00	35 766,00	ОБ	35 766,00										
17-19	Закупуване на технически устройства за ОА Пазарджик - 3 дейности	34 523,00	34 523,00	ОБ	34 523,00										
20	Идеен проект с обследване за реконструкция фасадата на Община Пазарджик, град Пазарджик	34 560,00	34 560,00	ОБ и ЦБ	13 824,00		20 736,00								
21	Закупуване на компютър и лаптоп, ОбС - Пазарджик	1 902,00	1 902,00	ОБ	1 902,00										
22	Закупуване на компютърна защитна стена, град Пазарджик	14 340,00	14 340,00	ОБ	14 340,00										
23	Закупуване на компютърна конфигурация, с. Крали Марко	829,00	829,00	ОБ	829,00										

Приложение 1. Реализирани проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Пазарджик за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2024 г.

№	Проект/инициатива	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени средства (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период на реализация					
					Общински бюджет	Фондове на ЕС	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2024<
24	Система за поточно видео излъчване за ОбС - Пазарджик	1 462,00	1 462,00	ОБ	1 462,00										
25	Подкрепа за Междинното звено и за управлението на Инвестиционната програма на ИПГВР на град Пазарджик	114 606,90	5 177,71	ОПРР		5 177,71									
26	Проект „Повишаване капацитета и техническата обезпеченост на служителите на Община Пазарджик отговорни за управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции за програмен период 2021-2027 г.“	50 853,60	50 853,60	ОПРР		50 853,60									
27	Закупуване на смартфон за нуждите на Община Пазарджик	1 690,00	1 690,00	ОБ	1 690,00										
Covid-19 проекти		7 552 481,67	7 530 164,98		0,00	7 530 164,98	0,00	0,00	0,00						
1-53	Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последиствия от пандемията COVID-19 - 53 проекта	2 650 000,00	2 650 000,00	ОПИК		2 650 000,00									
54-86	Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последиствия от пандемията COVID-19 - 33 проекта	4 719 445,37	4 697 128,68	ОПИК		4 697 128,68									
87-108	Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 - 22 проекта	183 036,30	183 036,30	ОПИК		183 036,30									
ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ:		340 532 205,56	135 373 413,82		7 584 205,00	66 776 161,97	27 676 410,00	23 489 250,85	9 847 386,00						

Приложение №2. Обобщена таблица за финансовото изпълнение на ПИРО

Стратегическа цел	Местно публично		Външно публично финансиране						ОБЩО
	Общински бюджет	Общ дял (%)	Централен бюджет	Общ дял (%)	Фондове на ЕС	Общ дял (%)	Други източници	Общ дял (%)	
Стратегическа цел I: Ускорено икономическо развитие на общината и диверсификация на икономическите дейности с прилагане на иновации и осигуряване на благоприятна бизнес среда	700	0,52%	264	0,20%	31 212	23,06%	23 391	17,28%	55 567
Стратегическа цел II: Изграждане и рехабилитация на ефективна техническа инфраструктура за постигане на устойчиво развитие на града и селата, съхраняваща природните дадености с иновативна индустриална култура	4 626	3,42%	16 794	12,41%	16 910	12,49%	9 805	7,24%	48 134
Стратегическа цел III: Осигуряване на благоприятна среда за развитие на човешките ресурси и подобряване качеството на живот чрез ефективни мерки за насърчаване на образованието, масовия спорт и социалното включване	2 059	1,52%	10 547	7,79%	11 065	8,17%	141	0,10%	23 813
Стратегическа цел IV: Модерно и устойчиво самоуправление за ускоряване социално-икономическото развитие на общината чрез качествено обслужване на бизнеса, на неговите организации и на населението, подобряване на институционалната среда и административния капацитет	199	0,15%	71	0,05%	58	0,04%	0	0,00%	329
Covid-19 мерки	0	-	0	-	7 530	5,56%	0	-	7 530
ОБЩО ЗА ПИРО ПАЗАРДЖИК 2021-2027:	7 584	5,60%	27 676	20,44%	66 776	49,33%	33 337	24,63%	135 373
